



ΔΡΑΣΗ Ε.2

Παρακολούθηση προόδου και αποτελεσμάτων
του προγράμματος

Τελική Αναφορά

Πρόγραμμα LIFE10 NAT/GR/000637

“ANDROSSPA - Διαχείριση της Ζώνης Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) της Άνδρου με σκοπό την επίτευξη ικανοποιητικής κατάστασης διατήρησης 4 ειδών πτηνών προτεραιότητας”



Ομάδα έργου

Όνομα	Ιδιότητα	
Jakob Fric	Φυσικός	NCC ΕΠΕ
Πολυξένη Γαλάνη	Βιολόγος	NCC ΕΠΕ
Τάσος Δημαλέξης	Δρ. Βιολογίας	NCC ΕΠΕ
Ισίδωρος Νικολάου	Μηχανικός	Δήμος Άνδρου
Victoria Saravia	Περιβαλλοντολόγος	Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία

Η παρούσα μελέτη συντάχθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE+ Φύση «Διαχείριση της Ζώνης Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) της Άνδρου με σκοπό την επίτευξη ικανοποιητικής κατάστασης διατήρησης 4 ειδών πτηνών προτεραιότητας» LIFE10 NAT/GR/000637 ANDROSSPA, χρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Πράσινο Ταμείο.

Προτεινόμενη βιβλιογραφική αναφορά: Fric J., Γαλάνη Π., Δημαλέξης Τ., Νικολάου Ι. & V. Saravia, 2017. Τελική Αναφορά παρακολούθησης προόδου και αποτελεσμάτων προγράμματος LIFE «Διαχείριση της Ζώνης Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) της Άνδρου με σκοπό την επίτευξη ικανοποιητικής κατάστασης διατήρησης 4 ειδών πτηνών προτεραιότητας, ANDROSSPA», LIFE10 NAT/GR/000637, Αθήνα, Φεβρουάριος 2017, σελ. 65.

Περιεχόμενα

Περίληψη	1
Summary	3
1 Εισαγωγή	4
2 Μεθοδολογία	5
3 Αποτελέσματα	8
4 Συζήτηση και συμπεράσματα	11
5 Παραρτήματα	12
5.1 Παράρτημα Ι: Κατάλογος δράσεων του προγράμματος	13
5.2 Παράρτημα ΙΙ: Πίνακας δεδομένων που χρησιμοποιήθηκε για την εκτίμηση της προόδου των δεικτών προόδου και προόδου υλοποίησης των δράσεων του προγράμματος.	14
5.3 Παράρτημα ΙΙΙ: Εξέλιξη δεικτών προόδου	20
5.4 Παράρτημα ΙV: Εξέλιξη δράσεων του προγράμματος	52

Περίληψη

Η παρούσα έκθεση αποτελεί την τελική αναφορά παρακολούθησης προόδου και αποτελεσμάτων του προγράμματος LIFE "Διαχείριση της Ζώνης Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) της Άνδρου με σκοπό την επίτευξη ικανοποιητικής κατάστασης διατήρησης 4 ειδών πτηνών προτεραιότητας", LIFE10 NAT/GR/000637, που υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της Ε.2 του προγράμματος.

Στο κεφάλαιο 1 της παρούσας έκθεσης περιγράφεται το γενικό πλαίσιο της παρακολούθησης του προγράμματος, στο κεφάλαιο 2 η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε, στο κεφάλαιο 3 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα και στο κεφάλαιο 4 γίνεται η συζήτηση περί των αποτελεσμάτων και τα συμπεράσματα που προκύπτουν από αυτά. Στα παραρτήματα παρουσιάζεται ο πίνακας δεδομένων που χρησιμοποιήθηκαν για την παρακολούθηση καθώς και τα διαγράμματα προόδου των δεικτών παρακολούθησης καθώς και της προόδου και των αποτελεσμάτων των επιμέρους δράσεων.

Η παρακολούθηση αφορούσε την τακτική (ανά τρίμηνο) καταγραφή και αξιολόγηση της προόδου και των αποτελεσμάτων των επιμέρους δράσεων του προγράμματος με στόχο την τακτική παρακολούθηση των πεπραγμένων, τη σύγκρισή τους με τους αρχικούς στόχους και χρονοδιάγραμμα με βάση τους οποίους πραγματοποιούνταν ο προγραμματισμός της υλοποίησης των δράσεων και δραστηριοτήτων του προγράμματος ώστε να επιτευχθούν βέλτιστα οι στόχοι του.

Η μεθοδολογία της παρακολούθησης συμπεριλάμβανε την σύγκριση των πεπραγμένων ανά τρίμηνο με (1) τους δείκτες προόδου, (2) τα αναμενόμενα αποτελέσματα των δράσεων, (3) το χρονοδιάγραμμα της υλοποίησης των δράσεων, (4) τα ορόσημα, (5) τα παραδοτέα και (6) τις ημερομηνίες παράδοσης των παραδοτέων που έχουν τεθεί με βάση την αρχική πρόταση και μετά τις τροποποιήσεις του προγράμματος. Η μεθοδολογία σχεδιάστηκε ώστε να αποτυπωθεί η πρόοδος και η επίτευξη στόχων με αριθμητικούς όρους είτε ως ποσοστό του στόχου είτε ως απόλυτα νούμερα.

Τα αποτελέσματα της παρακολούθησης αναδεικνύουν ότι σε 19, 6 και 2 δράσεις ο στόχος επιτεύχθηκε πριν, κατά και μετά το προβλεπόμενο τρίμηνο, αντίστοιχα. Σε 12 δράσεις το πρόγραμμα κατόρθωσε να φτάσει τους αρχικούς στόχους, σε 1 δράση οι στόχοι δεν έχουν επιτευχθεί πλήρως, ενώ σε 14 δράσεις το πρόγραμμα έχει υπερβεί τους αρχικούς στόχους.

Το συμπέρασμα των αποτελεσμάτων της παρακολούθησης είναι ότι το πρόγραμμα παρά τις τυχόν απρόβλεπτες δυσκολίες και προκλήσεις έχει υλοποιηθεί ικανοποιητικά και έχει πετύχει τους βασικούς στόχους του. Η σημαντική υπέρβαση των αρχικών στόχων καταγράφηκε στις δράσεις D.7 (Πρώθηση του προγράμματος σε ΜΜΕ και Δελτία Τύπου), C.6 (Διαχείριση των οικοτόπων που χρησιμοποιούν τα θαλασσοπούλια για αναζήτηση

τροφής), D.6 (Συναντήσεις φορέων για την προώθηση του προγράμματος), C.3 (Βελτίωση της διαθεσιμότητας των θέσεων φωλιάσματος), C.1 (Εξάλειψη αρουραίων), D.4 (Έκθεση προγράμματος στο Κέντρο Επισκεπτών Κορθίου) και D.9 (Παραγωγή πινακίδων του προγράμματος).

Summary

The present reports presents the final reports on the monitoring of the progress and results of the LIFE project “Management of the SPA site of Andros Island to achieve a Favourable Conservation Status for its priority species”, LIFE10 NAT/GR/000637, which was carried out in the framework of the action E.2.

The Chapter 1 presents the general framework of the project monitoring, the Chapter 2 describes the methodology used, the Chapter 4 presents the monitoring results and the Chapter 4 includes the discussion and conclusions of the monitoring results. Report's appendices present the data tables which were used for the project monitoring and the charts which present the progress of monitoring indicators and their respective actions.

The monitoring involved regular (per trimester) recording and evaluation of the progress and results of the project actions with the aim to regularly monitoring project achievements and their comparison with the project objectives. The operational planning of the project actions and activities were based on these data in order to optimally achieve project objectives.

The monitoring methodology involved comparison (per trimester) of (1) monitoring indicators, (2) actions' expected results, (3) actions' timetable, (4) milestones, (5) deliverables and (6) deliverable submission dates, based on the initial Grant Agreement and subsequent Grant Agreement Amendments. The methodology was developed in such a way as to express the progress and results numerically, either as a percentage of the set objectives or as absolute numbers.

The monitoring results indicate that 19, 6 and 2 actions achieved their objectives before, during and after foreseen trimester, respectively. 12 of the project actions fully achieved set objectives, 1 action did not fully achieve initial objectives, while 14 actions have exceeded the initial objectives.

In conclusion, despite unforeseeable difficulties and challenges, the project implementation was satisfactory and it achieved its main objectives. It significantly exceeded initial objectives in actions D.7 (Mass Media Information Dissemination and Press Releases), C.6 (Management of seabird foraging habitat), D.6 (Stakeholder Meetings for Dissemination of Information), C.3 (Improvement of nesting site availability), C.1 (Rat eradications), D.4 (Project Exhibition at the Korthi Municipal Visitor Centre) και D.9 (Production of notice boards).

1 Εισαγωγή


Το πρόγραμμα LIFE "ANDROSSPA - Διαχείριση της Ζώνης Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) της Άνδρου με σκοπό την επίτευξη ικανοποιητικής κατάστασης διατήρησης 4 ειδών πτηνών προτεραιότητας", με κωδικό LIFE10 NAT/GR/000637. Συμπεριλάμβανε 27 δράσεις από τις οποίες 3 ήταν προκατασκευαστικές, 1 αφορούσε τη μίσθωση γης, 10 ήταν διαχειριστικές, 10 ήταν δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης και 4 αφορούσαν το συντονισμό, την παρακολούθηση και τη δικτύωση του προγράμματος καθώς και το σχεδιασμό των δράσεων μετά τη λήξη του προγράμματος. Η κάθε δράση είχε το δικό της χρονοδιάγραμμα και τα αναμενόμενα αποτελέσματα, ενώ οι περισσότερες δράσεις είχαν επίσης παραδοτέα και ορόσημα. Επιπρόσθετα, με την αρχική πρόταση ορίστηκαν για τις περισσότερες δράσεις οι δείκτες παρακολούθησης ώστε να υπάρχουν συγκεκριμένα κριτήρια παρακολούθησης της προόδου και των αποτελεσμάτων των δράσεων.

Ο στόχος της παρακολούθησης της προόδου και των αποτελεσμάτων ήταν η σύγκριση των πεπραγμένων του προγράμματος με τους παραπάνω δείκτες ώστε με τον τακτικό προγραμματισμό και την προσαρμογή της υλοποίησης των δράσεων να επιτευχθούν βέλτιστα οι στόχοι του προγράμματος.


2 Μεθοδολογία

Ο κατάλογος των δεικτών παρακολούθησης, όπως έχει καθοριστεί με την αρχική πρόταση του προγράμματος, αποτελούσε την βάση αναφοράς της παρακολούθησης της προόδου και των αποτελεσμάτων του προγράμματος. Ο κατάλογος αυτός εμπλουτίστηκε με τα αναμενόμενα αποτελέσματα των δράσεων, το χρονοδιάγραμμα της υλοποίησης των δράσεων, τα ορόσημα, τα παραδοτέα και τις ημερομηνίες παράδοσης των παραδοτέων. Προσδιορίστηκαν ο στόχος και το αναμενόμενο τρίμηνο ολοκλήρωσης για όσους δείκτες παρακολούθησης υπήρχε η σχετική πληροφορία στην πρόταση του προγράμματος. Τα δεδομένα προόδου ή αποτελεσμάτων καταχωρούνταν ως απόλυτοι αριθμοί (π.χ. αριθμός αποικιών συγκεκριμένου είδους) ή ποσοστά (το ποσοστό υλοποίησης συγκεκριμένου παραδοτέου), ενώ η πρόοδος ανά τρίμηνο υπολογίζεται με βάση το στόχο του δείκτη προόδου (π.χ. ποσοστό των αποικιών που μελετήθηκαν επί του συνόλου των αποικιών που αναμενόταν με βάση την πρόταση να μελετηθούν). Για τον κάθε δείκτη η ποσοστιαία πρόοδος αποτυπώθηκε σε γράφημα ανά τρίμηνο όπως στα παρακάτω παραδείγματα. Το Γράφημα 1 παρουσιάζει την πρόοδο του δείκτη αριθμού των συμπλεγμάτων νησίδων όπου υλοποιήθηκε η εξάλειψη αρουραίων. Ο αρχικός στόχος ήταν 2 συμπλέγματα νησίδων που αναμενόταν να επιτευχθεί μέχρι το 3^ο τρίμηνο του 2014. Ο στόχος αυτός επιτεύχθηκε ένα χρόνο νωρίτερα ενώ μέχρι το τέλος του προγράμματος η εξάλειψη αρουραίων πραγματοποιήθηκε σε 4 συμπλέγματα συνεπώς το τελικό αποτέλεσμα του συγκεκριμένου δείκτη προόδου είναι 200%. Παρομοίως το ποσοστό του τοπικού πληθυσμού του Αιγαίογλαρου που θα επηρεαστεί από την εξάλειψη αρουραίων ήταν 100% και αναμενόταν να επιτευχθεί το 3^ο τρίμηνο του 2014. Ο στόχος αυτός επιτεύχθηκε το 1^ο τρίμηνο του 2015 (Γράφημα 2).

Γράφημα 1: Πρόοδος δείκτη δράσης εξάλειψης αρουραίων «C.1 Σύνολο συμπλεγμάτων νησίδων».

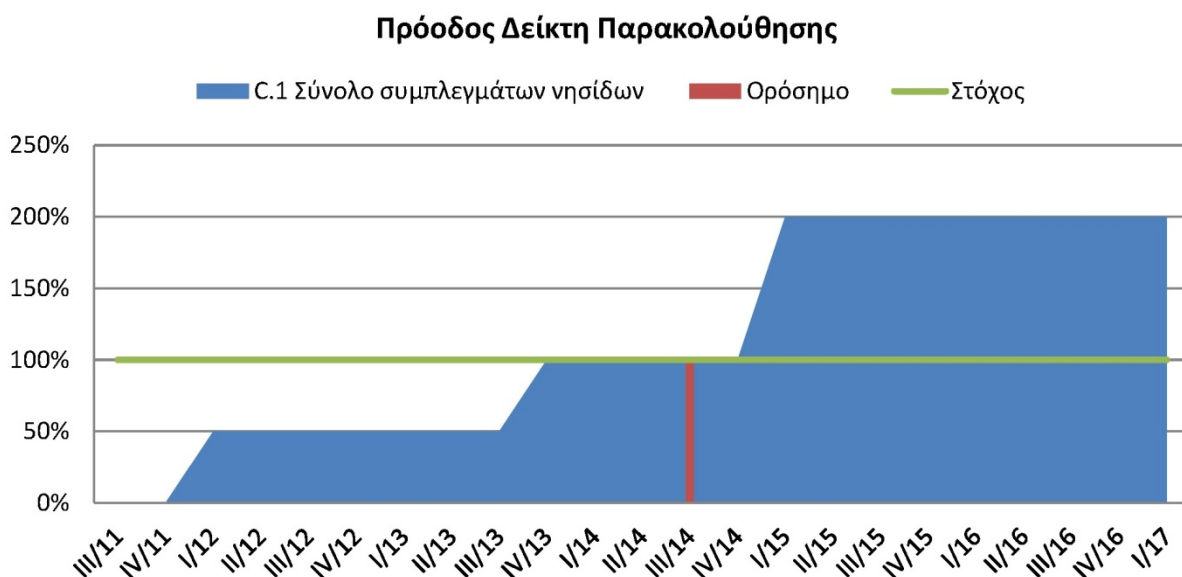


Γράφημα 2: Πρόοδος δείκτη δράσης εξάλειψης αρουραίων «C.1 Ποσοστό συνολικού πληθυσμού Αιγαιόγλαρου».

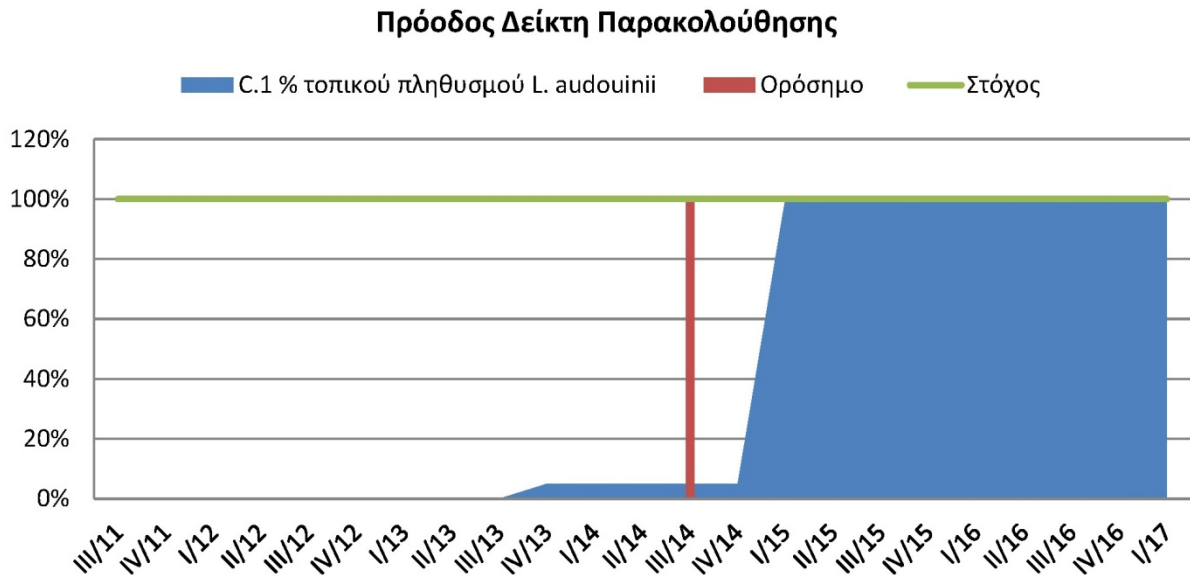

Για την εκτίμηση της προόδου κάθε δράσης του προγράμματος υπολογίστηκε ο μέσος όρος της ποσοστιαίας προόδου ανά τρίμηνο όλων των δεικτών προόδου που αφορούν τη συγκεκριμένη δράση. Για παράδειγμα για τη δράση C.1 «Εξάλειψη αρουραίων» ορίστηκαν 6 δείκτες προόδου με βάση του οποίους υπολογίστηκε η πρόοδος υλοποίησης της δράσης καθώς και επίτευξη του στόχου της (Γράφημα 3). Η συγκεκριμένη δράση ολοκληρώθηκε εμπρόθεσμα και πέτυχε το 176% του στόχου της.

Γράφημα 3: Πρόοδος υλοποίησης δράσης «C.1 Εξάλειψη αρουραίων».

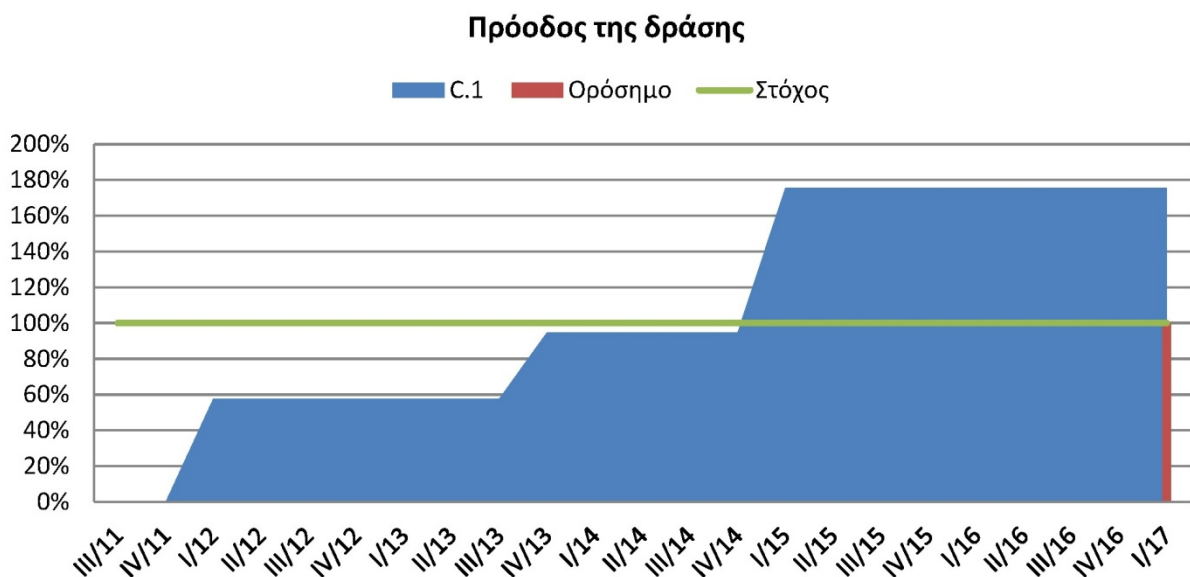

Στα παραρτήματα της παρούσας έκθεσης παρουσιάζονται τα δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν για την εκτίμηση προόδου των δράσεων του προγράμματος:


Παράρτημα Ι: Κατάλογος δράσεων του προγράμματος

Παράρτημα ΙΙ: Πίνακας δεδομένων που χρησιμοποιήθηκε για την εκτίμηση της προόδου των δεικτών προόδου και προόδου υλοποίησης των δράσεων του προγράμματος.

3 Αποτελέσματα

Η πρόοδος του προγράμματος εκτιμήθηκε για 91 δείκτες προόδου και για όλες 27 δράσεις τους προγράμματος. Τα αποτελέσματα για την εξέλιξη των δεικτών προόδου και των δράσεων παρουσιάζονται στα παραρτήματα III και IV, αντίστοιχα.

Με βάση τους 91 δείκτες προόδου οι προκαθορισμένοι αρχικοί στόχοι του προγράμματος επιτεύχθηκαν σε ποσοστό 100% σε 65 δείκτες (71% των δεικτών), σε 25 δείκτες (28% των δεικτών) το πρόγραμμα έχει υπερβεί τους αρχικούς στόχους, ενώ σε 1 δείκτη (1% των δεικτών) ο στόχος δεν επιτεύχθηκε πλήρως.

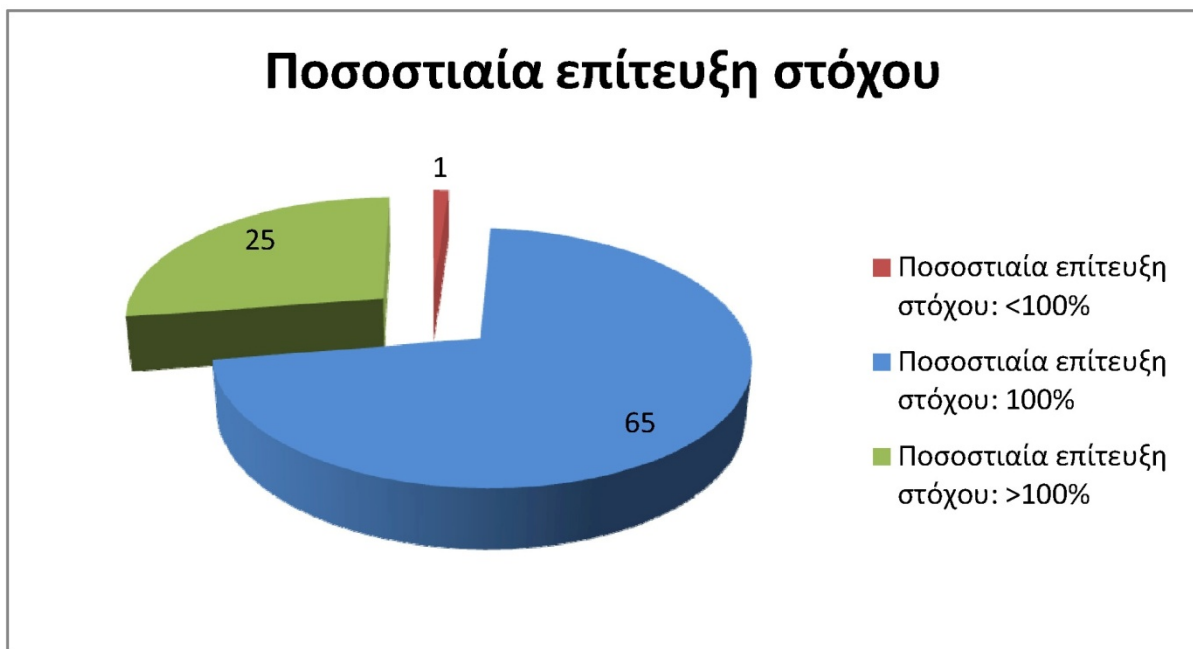


Γράφημα 4: Ποσοστιαία επίτευξη στόχων των δεικτών παρακολούθησης του προγράμματος.

Οι 61 εκ των 91 δεικτών επίσης είχαν προκαθορισμένο ορόσημο επίτευξης των στόχων. Σε 16 (26% των δεικτών) και 22 (36% των δεικτών) εκ των δεικτών αυτών οι στόχοι επιτεύχθηκαν κατά το προβλεπόμενο τρίμηνο και νωρίτερα, αντίστοιχα, ενώ σε 23 (38% των δεικτών) δείκτες οι στόχοι επιτεύχθηκαν με τουλάχιστον ένα τρίμηνο καθυστέρηση.



Γράφημα 5: Χρονική επίτευξη στόχων των δεικτών παρακολούθησης του προγράμματος.

Με την εξαίρεση μιας δράσης (της δράσης D.8), το πρόγραμμα έχει ολοκληρώσει πλήρως (100%) τους στόχους 12 δράσεων (44% των δράσεων), ενώ σε 14 δράσεις (52% των δράσεων) έχει υπερβεί τους αρχικούς στόχους. Οι σημαντικότερες υπερβάσεις των αρχικών στόχων έχουν καταγραφεί στις δράσεις D.7 (240% του αρχικού στόχου), C.6 (238% του αρχικού στόχου), D.6 (225% του αρχικού στόχου), C.3 (191% του αρχικού στόχου), C.1 (178% του αρχικού στόχου), D.4 (165% του αρχικού στόχου) και D.9 (160% του αρχικού στόχου).

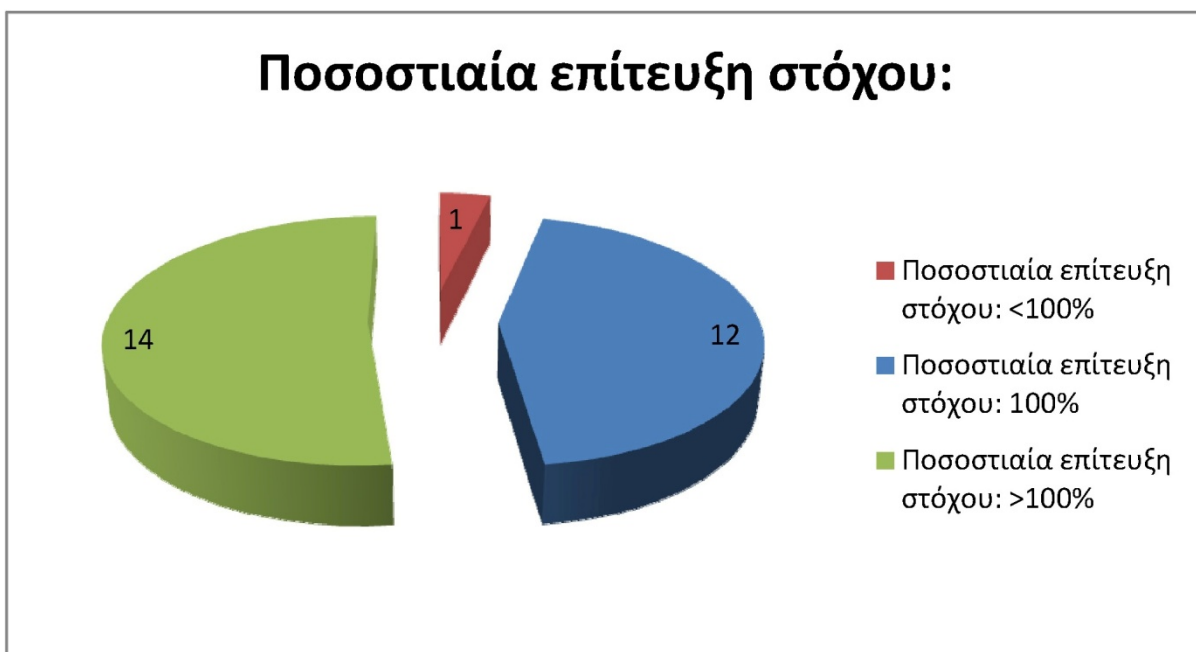

Γράφημα 6: Ποσοστιαία επίτευξη στόχων των δράσεων του προγράμματος.

Ως προς το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των δράσεων, μόνο δυο δράσεις ολοκληρώθηκαν με την καθυστέρηση ενός ή περισσότερων τριμήνων, οι στόχοι 6 δράσεων (22% των δράσεων) επιτεύχθηκαν κατά το προβλεπόμενο τρίμηνο, ενώ 19 δράσεις (70% των δράσεων) ολοκληρώθηκαν πριν το αρχικά προβλεπόμενο τρίμηνο.



Γράφημα 7: Χρονική επίτευξη στόχων των δράσεων του προγράμματος.

4 Συζήτηση και συμπεράσματα

Οι ομάδα του προγράμματος σε συνεργασία με την ομάδα LIFE της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και την Εξωτερική ομάδα παρακολούθησης σε συνδυασμό με την 18-μηνη παράταση της λήξης του προγράμματος κατόρθωσε να πετύχει όλους τους βασικούς στόχους που έχουν τεθεί αρχικά. Επιπρόσθετα, σε περισσότερες από μισές δράσεις το πρόγραμμα έχει υπερβεί τους αρχικούς στόχους του.

Η μη επίτευξη του πλήρους στόχου της δράσης D.8 οφείλεται στο υπερφιλόδοξο στόχο 400 συμμετεχόντων του Τελικού Συνεδρίου του προγράμματος. Ο τελικός αριθμός των 50 συμμετεχόντων κάλυψε όλες τις σημαντικότερες κοινωνικές ομάδες ενδιαφέροντος και με τον τρόπο αυτό επιτεύχθηκε ο στόχος της δράσης.

Οι υπερβάσεις των αρχικών στόχων στην δράσεις οφείλονται σε:

Δράση D.7: σημαντικά αυξημένο αριθμό των άρθρων και δελτίων τύπου σε μέσα μαζικής ενημέρωσης,

Δράση C.6: σημαντικά αυξημένη έκταση των ενδιαιτημάτων τροφοληψίας θαλασσοπουλιών που επωφελήθηκαν από τα αγκυροβόλια και το αυξημένο ποσοστό των σκαφών που χρησιμοποίησαν τα αγκυροβόλια

Δράση D.6: σημαντικά αυξημένος αριθμός των συμμετεχόντων και των συναντήσεων με τις κοινωνικές ομάδες ενδιαφέροντος (stakeholders) του προγράμματος,

Δράση C.3: σημαντικά αυξημένος αριθμός των θάμνων που φυτευτήκαν, των τεχνητών φωλιών που κατασκευάστηκαν και ζευγαριών Μαυροπετρίτη και Θαλασσοκόρακα που επωφελήθηκαν από αυτά

Δράση C.1: σημαντικά αυξημένος αριθμός των νησίδων και συμπλεγμάτων νησίδων όπου υλοποιήθηκαν οι εξαλείψεις αρουραίων καθώς και των αριθμό των αποικιών και των ποσοστών των τοπικών πληθυσμών του Μαυροπετρίτη και Θαλασσοκόρακα που επωφελήθηκαν από αυτές

Δράση D.4: σημαντικά αυξημένος αριθμός των επισκεπτών του κέντρου ενημέρωσης του προγράμματος ανά έτος, ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια του προγράμματος

Δράση D.9: αυξημένος αριθμός των πινακίδων του προγράμματος.

5 Παραρτήματα

Παράρτημα Ι: Κατάλογος δράσεων του προγράμματος

Παράρτημα ΙΙ: Πίνακας δεδομένων που χρησιμοποιήθηκε για την εκτίμηση της προόδου των δεικτών προόδου και προόδου υλοποίησης των δράσεων του προγράμματος.

Παράρτημα ΙΙΙ: Εξέλιξη δεικτών προόδου

Παράρτημα ΙV: Εξέλιξη δράσεων του προγράμματος

5.1 Παράρτημα Ι: Κατάλογος δράσεων του προγράμματος

Δράση
A. Προπαρασκευαστικές δράσεις, εκπόνηση διαχειριστικών σχεδίων και/ή σχεδίων δράσης
A.1 Εκπόνηση του Διαχειριστικού Σχεδίου για την ΖΕΠ
A.2 Λειτουργία και τεχνικός σχεδιασμός των διαχειριστικών δράσεων
A.3 Μελέτη Σκοπιμότητας του Διαχειριστικού Σχεδίου για τη ΖΕΠ
B. Αγορά/ μίσθωση γης και/ή δικαιώματα χρήσης γης
B.1 Εκμίσθωση γεωργικής έκτασης
C. Διαχειριστικές δράσεις :
C.1 Εξάλειψη αρουραίων
C.2 Έλεγχος των πληθυσμών γλάρων
C.3 Βελτίωση της διαθεσιμότητας των θέσεων φωλιάσματος
C.4 Αποκατάσταση τεχνικών παραδοσιακής γεωργίας, βελτίωση των πληθυσμών πέρδικας και περιστερών
C.5 Αποκατάσταση των παράκτιων υγροτόπων
C.6 Διαχείριση των οικοτόπων που χρησιμοποιούν τα θαλασσοπούλια για αναζήτηση τροφής
C.7 Σύσταση και Λειτουργία της Τοπικής Ομάδας Προστασίας Άγριας Ζωής και Πρώτων Βοηθειών
C.8 Λειτουργία του Διαχειριστικού Σχήματος ΖΕΠ
C.9 Έναρξη λειτουργίας του συστήματος εποπτείας –περιπολίας της ΖΕΠ
D. Δράσεις ενημέρωσης –ευαισθητοποίησης κοινού και διάχυσης αποτελεσμάτων
D.1 Παραγωγή ενημερωτικού υλικού (φυλλάδια, αφίσες, κλπ)
D.2 Παραγωγή ντοκιμαντέρ του προγράμματος
D.3 Ιστοσελίδα προγράμματος
D.4 Έκθεση προγράμματος στο Κέντρο Επισκεπτών Κορθίου
D.5 Περιβαλλοντική Εκπαίδευση
D.6 Συναντήσεις φορέων για την προώθηση του προγράμματος
D.7 Προώθηση του προγράμματος σε ΜΜΕ και Δελτία Τύπου
D.8 Τελική διάσκεψη του προγράμματος LIFE+ Φύση
D.9 Παραγωγή πινακίδων του προγράμματος
D.10 Παραγωγή εκλαϊκευμένης αναφοράς του προγράμματος
E. Συνολικός συντονισμός–παρακολούθηση έργου
E.1 Συνολικός συντονισμός του προγράμματος
E.2 Παρακολούθηση του προγράμματος
E.3 Δικτύωση του προγράμματος
E.4 Σχεδιασμός για μετά το πρόγραμμα (After –Life conservation plan)

5.2 Παράρτημα II: Πίνακας δεδομένων που χρησιμοποιήθηκε για την εκτίμηση της προόδου των δεικτών προόδου και προόδου υλοποίησης των δράσεων του προγράμματος.

Δράση & Δείκτης Προόδου	Στόχος	Ορόσημο	III 11	IV 11	I 12	II 12	III 12	IV 12	I 13	II 13	III 13	IV 13	I 14	II 14	III 14	IV 14	I 15	II 15	III 15	IV 15	I 16	II 16	III 16	IV 16	I 17
A.1 Αρ. υπό μελέτη αποικιών	100%	IV/12	7%	7%	7%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
A.1 Αρ. ατόμων που παρακολουθούνται με την τηλεμετρία	100%	IV/12	0%	0%	0%	0%	40%	40%	40%	40%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
A.1 Αρ. ημερών οπτικών παρατηρήσεων	100%	IV/12	5%	5%	70%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
A.1 Απόσταση καταγραφών στην θάλασσα	100%	IV/12	10%	10%	10%	85%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
A.1 % κάλυψης απαιτούμενων του προγράμματος από τα αποτελέσματα των μελετών	100%	IV/12	5%	5%	5%	90%	95%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
A.1 Σχέδιο Διαχείρισης ΖΕΠ	100%	I/13	0%	10%	20%	50%	75%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	100%
A.1 Σχέδια Δράσης Ειδών του προγράμματος και FRVs	100%	I/13	5%	15%	30%	60%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	100%
A.1 Σχέδιο Παρακολούθησης ΖΕΠ	100%	I/13	0%	0%	0%	10%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
A.1 Σχέδιο Φύλαξης ΖΕΠ	100%	I/13	5%	15%	50%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
A.1 Σχέδιο επικοινωνίας ΖΕΠ	100%	I/13	0%	10%	20%	80%	80%	90%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
A.1 Γεωβάση της ΖΕΠ	100%	IV/12	0%	5%	20%	30%	40%	50%	80%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
A.2 Ορνιθολόγικες μελέτες προαπαιτούμενες για την σύνταξη επιχειρησιακών σχεδίων δράσεων προγράμματος	100%	I/12	5%	25%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
A.2 Επιχειρησιακό Σχέδιο C1	100%	I/12	5%	15%	80%	80%	80%	90%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Δράση & Δείκτης Προόδου	Στόχος	Ορόσημο	III 11	IV 11	I 12	II 12	III 12	IV 12	I 13	II 13	III 13	IV 13	I 14	II 14	III 14	IV 14	I 15	II 15	III 15	IV 15	I 16	II 16	III 16	IV 16	I 17
A.2 Επιχειρησιακό Σχέδιο C2	100%	I/12	0%	15%	30%	50%	70%	70%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
A.2 Επιχειρησιακό Σχέδιο C3	100%	I/12	0%	10%	25%	40%	50%	80%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
A.2 Επιχειρησιακό Σχέδιο C4	100%	I/12	0%	5%	15%	20%	30%	50%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
A.2 Επιχειρησιακό Σχέδιο C5	100%	I/12	0%	10%	20%	40%	80%	90%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
A.2 Επιχειρησιακό Σχέδιο C6	100%	I/12	0%	5%	20%	50%	60%	80%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
A.3 Μελέτη Σκοπιμότητας	100%	I/13	0%	0%	0%	20%	40%	50%	70%	95%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
B.1 Εννοκίαση γης	10		0	0	0	0	6.7 8	6.7 8	6.7 8	6.7 8	10. 97	10. 97	10. 97	10. 97	10. 97	10. 97	10. 97	10. 97	10. 97	10. 97	10. 97	10. 97	10. 97	10. 97	10. 97
C.1 Σύνολο συμπλεγμάτων νησίδων	2	III/14	0	0	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4
C.1 Συνολική έκταση νησίδων [ha]	88.36	III/14	0	0	1.1 7	1.1 7	1.1 7	1.1 7	1.1 7	1.1 7	1.1 7	8.4 2	8.4 2	8.4 2	8.4 2	8.4 2	88. 36	88. 36	88. 36	88. 36	88. 36	88. 36	88. 36	88. 36	88. 36
C.1 Αρ. αποικιών	5	III/14	0	0	1	1	1	1	1	1	1	4	4	4	4	4	8	8	8	8	8	8	8	8	8
C.1 % τοπικού πληθυσμού F. eleoporaε που επωφελείται	20%	III/14	0%	0%	55%	55%	55%	55%	55%	55%	55%	65%	65%	65%	65%	65%	65%	65%	65%	65%	65%	65%	65%	65%	65%
C.1 % τοπικού πληθυσμού L. audouinii	100%	III/14	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	5%	5%	5%	5%	5%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
C.1 % τοπικού πληθυσμού P. Aristotelis που επωφελείται	10%	II/15	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	5%	5%	5%	5%	5%	18%	18%	18%	18%	18%	18%	18%	18%	18%
C.2 Αρ. αποικιών L. michahellis υπό διαχείριση	3	II/15	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3
C.2 % τοπικού πληθυσμού L. audouinii που επωφελείται	100%	II/15	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	30%	30%	30%	30%	50%	50%	50%	50%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
C.2 % τοπικού πληθυσμού P. aristotelis που επωφελείται	0%		0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	7%	7%	7%	7%	15%	15%	15%	15%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
C.2 Νέες αποικίες L. audouinii	0%		0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

Δράση & Δείκτης Προόδου	Στόχος	Ορόσημο	III 11	IV 11	I 12	II 12	III 12	IV 12	I 13	II 13	III 13	IV 13	I 14	II 14	III 14	IV 14	I 15	II 15	III 15	IV 15	I 16	II 16	III 16	IV 16	I 17
C.3 Αρ. τεχνητών φωλιών	200	III/16	0	0	0	0	5	10	10	21	21	50	50	90	90	90	110	207	207	207	222	222	222	222	222
C.3 Αρ. ζευγαριών F. eleonora που επωφελούνται	50	III/16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84	84	100	120	120	120	150	160	160	160	160	160	160	160
C.3 Αρ. φυτεμένων θάμνων	100	III/16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100	100	173	173	173	173	173	173	173	173	173
C.3 Αρ. ζευγαριών που επωφελούνται	100	III/16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84	84	100	120	120	120	160	160	160	160	160	160	160	160
C.4 Συνολική έκταση καλλιέργειας χωραφιών	10	III/15	0	0	0	0	6.7 8	6.7 8	6.7 8	6.7 8	10. 97	10. 97	10. 97	10. 97	10. 97	10. 97	10. 97	10. 97	10. 97	10. 97	10. 97	10. 97	10. 97	10. 97	10. 97
C.4 Αρ. τεχνητών λιμνών	10	III/15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	6	10	10	10	10	10	10	10	10	10
C.4 Αρ. περιστερώνων	3	III/15	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3
C.4 Βοτανικός κήπος	1	III/15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1
C.4 Αρ. ζευγαριών αετών που επωφελούνται		III/15	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
C.4 % τοπικού πληθυσμού F. eleonora που επωφελείται		III/15	0	0	0	16%	16%	16%	16%	16%	16%	16%	16%	16%	16%	16%	16%	16%	16%	16%	16%	16%	16%	16%	16%
C.5 Συνολική έκταση υγροτόπων που αποκαταστάθηκαν (ha)	5	III/16	0	0	0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	1	1	1	1	1	1	1	1	2	5	5	5	5	5	5
C.5 Αρ. υγροτόπων ΖΕΠ Άνδρου που αποκαταστάθηκαν	3		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	4	4	4	4	4
C.5 Αρ. τεχνητών λιμνών	5		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	5	5	5	5	5
C.5 % του τοπικού πληθυσμού γερακιών που επωφελήθηκαν	80%		0	0	0	26. 30%	26. 30%	26. 30%	26. 30%	26. 30%	42. 60%	42. 60%	42. 60%	42. 60%	42. 60%	42. 60%	42. 60%	42. 60%	56. 00%	85. 50%	85. 50%	85. 50%	85. 50%	85. 50%	85. 50%
C.6 Αρ. αγκυροβολιών	20	III/15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	10	15	15	15	15	20	20	20	20	20
C.6 Αρ. των περιοχών τροφοληψίας θαλασσοπουλιών	3		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3
C.6 Έκταση ενδιαιτημάτων που επωφεληθήκαν (ha)	20		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	15	40	40	40	100	100	100	100	100	100	100
C.6 % σκαφών που χρησιμοποιούν αγκυροβόλια	20%		0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	50%	25%	50%	50%	25%	25%	50%	50%	30%	35%	50%	50%

Δράση & Δείκτης Προόδου	Στόχος	Ορόσημο	III 11	IV 11	I 12	II 12	III 12	IV 12	I 13	II 13	III 13	IV 13	I 14	II 14	III 14	IV 14	I 15	II 15	III 15	IV 15	I 16	II 16	III 16	IV 16	I 17
C.7 Σταθμός πρώτων βοηθειών για την άγρια ζωή	1	III/12	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
C.7 Δημιουργία τοπικής εθελοντικής ομάδας	1	IV/12	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
C.7 Αρ. μελών τοπικής εθελοντικής ομάδας	10		0	0	0	9	9	9	9	9	28	28	28	28	28	28	16	16	16	16	16	16	16	16	16
C.7 Αρ. αναφορών	5		0	0	0	0	0	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	5	5
C.8 Δημιουργία Σχήματος Διαχείρισης ΖΕΠ	1	III/14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
C.8 Λειτουργία Σχήματος Διαχείρισης ΖΕΠ	1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1
C.8 Αρ. συναντήσεων			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	4	5	5	5	6
C.9 Αρ. επισκέψεων πεδίου	416		0	0	0	1	6	7	21	51	75	105	147	202	260	306	362	417	465	470	475	485	489	494	496
C.9 Αρ. συμπληρωμένων πρωτοκόλλων φύλαξης		I/17	0	0	0	0	0	0	13	39	59	77	108	145	197	243	299	353	397	402	407	417	421	426	428
C.9 Αρ. αναφορών φύλαξης	416		0	0	0	1	6	7	21	51	75	105	147	202	260	306	362	417	465	470	475	485	489	494	496
C.9 % κάλυψης ΖΕΠ από την φύλαξη			0	0	0	0	0	0	25	50	75	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
D.1 Αρ. φυλλαδίων	10000	II/12	0	0	100 0	200 0	200 0	200 0	200 0	400 0	500 0	500 0	500 0	150 00	150 00	150 00	150 00	150 00	150 00	230 00	230 00	236 00	236 00	236 00	236 00
D.1 Λεύκωμα	2000	II/15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 0	200 0	200 0	200 0	200 0	200 0	200 0	200 0
D.1 Πόστερ	0		0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
D.1 Επιτοίχιο ημερολόγιο	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
D.2 Ντοκιμαντέρ προγράμματος 25 min	2000	II/15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 0	200 0	200 0	200 0	200 0	200 0	200 0	200 0
D.2 Μικρά βιντεοκλίπ προγράμματος 10 min	2000	II/15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 0	200 0	200 0	200 0	200 0	200 0	200 0	200 0
D.3 Ιστοσελίδα προγράμματος	1	IV/11	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
D.3 Αρ. επισκεπτών ιστοσελίδας					218	687	113 3	135 9	157 5	195 7	233 1	256 5	297 5	338 5	423 0	473 0	533 7	619 3	695 2	727 7	774 0	841 8	896 5	932 5	957 3


Δράση & Δείκτης Προόδου	Στόχος	Ορόσημο	III 11	IV 11	I 12	II 12	III 12	IV 12	I 13	II 13	III 13	IV 13	I 14	II 14	III 14	IV 14	I 15	II 15	III 15	IV 15	I 16	II 16	III 16	IV 16	I 17
D.4 Έκθεση του προγράμματος	1	II/12	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
D.4 Αρ. επισκεπτών / έτος	2000		0	0	0	0	0	800	800	800	800	118 0	118 0	118 0	118 0	135 0	135 0	135 0	135 0	460 0	460 0	460 0	460 0	305 0	200
D.5 Πακέτο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης	150	I/14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150
D.5 Αρ. μαθητών που συμμετέχουν	3000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350	450	750	105 0	135 0	145 0	175 0	205 0	235 0	245 0	275 0	305 0
D.6 Αρ. των συναντήσεων	12		0	0	2	3	5	5	7	9	9	9	12	13	13	15	15	17	18	19	20	20	20	21	21
D.6 Αρ. αναφορών συναντήσεων με ενδιαφερόμενες τοπικές κοινωνικές ομάδες		I/17		0	1	2	3	3	4	5	5	5	6	6	6	7	7	8	8	9	9	9	9	9	9
D.6 Αρ. συμμετεχόντων	250		0	0	80	120	190	190	300	400	400	400	650	680	680	800	800	840	840	880	920	920	920	100 0	100 0
D.7 Αρ. των συνεντεύξεων			0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
D.7 Αρ. άρθρων σε μέσα μαζικής ενημέρωσης	5		0	0	0	3	3	3	3	4	6	7	10	11	12	12	12	13	20	21	21	21	21	21	21
D.7 Αρ. δελτίων τύπου	15		0	0	0	1	2	2	2	4	4	4	5	8	12	12	13	15	17	18	21	23	26	28	30
D.8 Οργάνωση Συνεδρίου Κλεισίματος του προγράμματος	1	III/16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1
D.8 Αρ. συμμετεχόντων του συνεδρίου	400		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	50	50
D.8 Αναφορά συνεδρίου	1	I/17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
D.9 Πινακίδες του προγράμματος	10	III/12	0	0	0	0	0	0	1	2	4	4	6	8	11	11	13	13	13	13	14	14	15	16	16
D.10 Εκλαϊκευμένη αναφορά του προγράμματος	1	III/16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
E.1 Ενδιάμεση αναφορά προγράμματος	1	II/13	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
E.1 1η αναφορά προόδου προγράμματος	1	II/14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
E.1 2η αναφορά προόδου προγράμματος	1	IV/15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1

Δράση & Δείκτης Προόδου	Στόχος	Ορόσημο	III 11	IV 11	I 12	II 12	III 12	IV 12	I 13	II 13	III 13	IV 13	I 14	II 14	III 14	IV 14	I 15	II 15	III 15	IV 15	I 16	II 16	III 16	IV 16	I 17
E.1 Επικοινωνία με την Ε.Ε. & εξωτερική ομάδα παρακολούθησης			0	3	4	5	6	7	8	10	11	13	14	16	18	21	22	23	24	26	28	29	30	31	33
E.1 Συντονιστική ομάδα προγράμματος (Steering Committee)	1	IV/11	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
E.2 Αρ. των αναφορών προόδου			0	0	0	3	3	3	3	5	5	5	5	5	8	8	8	8	8	11	11	11	11	11	14
E.3 Αρ. προγραμμάτων/οργανισμών που έγινε επικοινωνία			0	0	0	2	2	2	3	4	4	4	4	4	4	4	5	6	6	6	6	6	6	6	6
E.4 After-LIFE Conservation Plan	1	I/17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1


5.3 Παράρτημα ΙΙΙ: Εξέλιξη δεικτών προόδου

Πρόοδος προς τους στόχους των δεικτών παρακολούθησης


Πρόοδος Δείκτη Παρακολούθησης

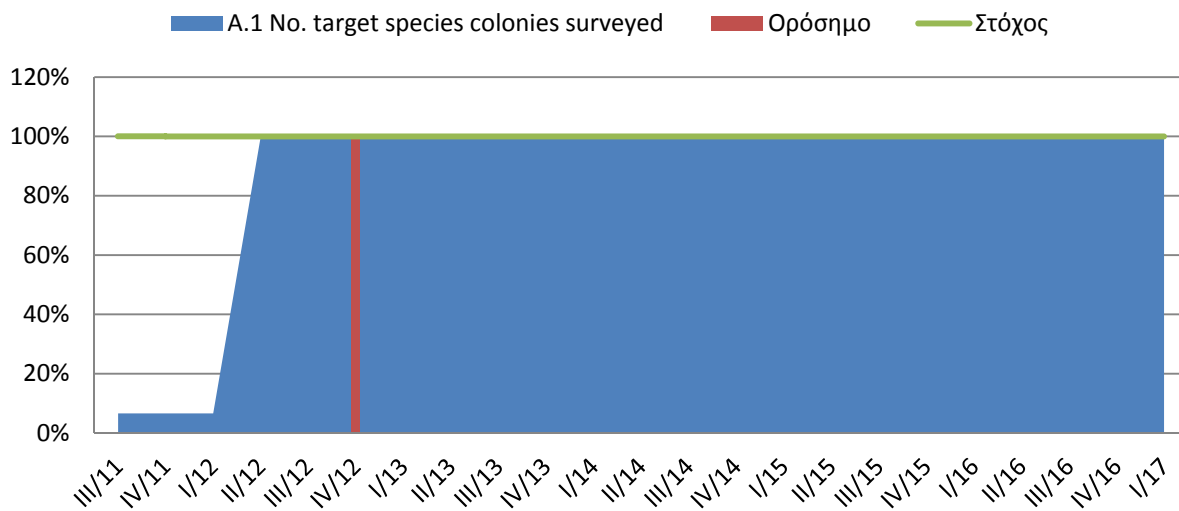


Πρόοδος Δείκτη Παρακολούθησης

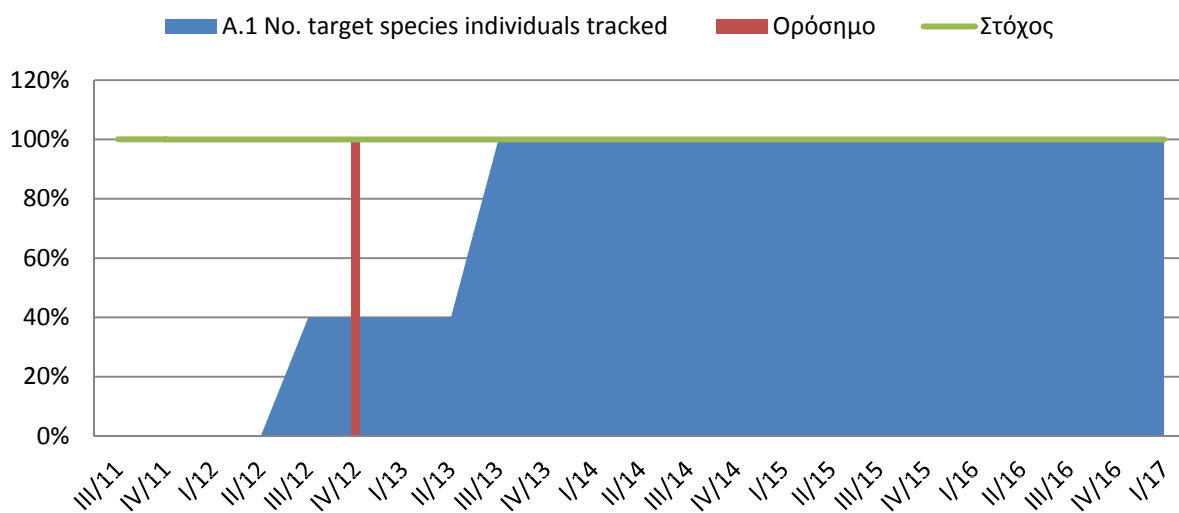


Πρόοδος Δείκτη Παρακολούθησης

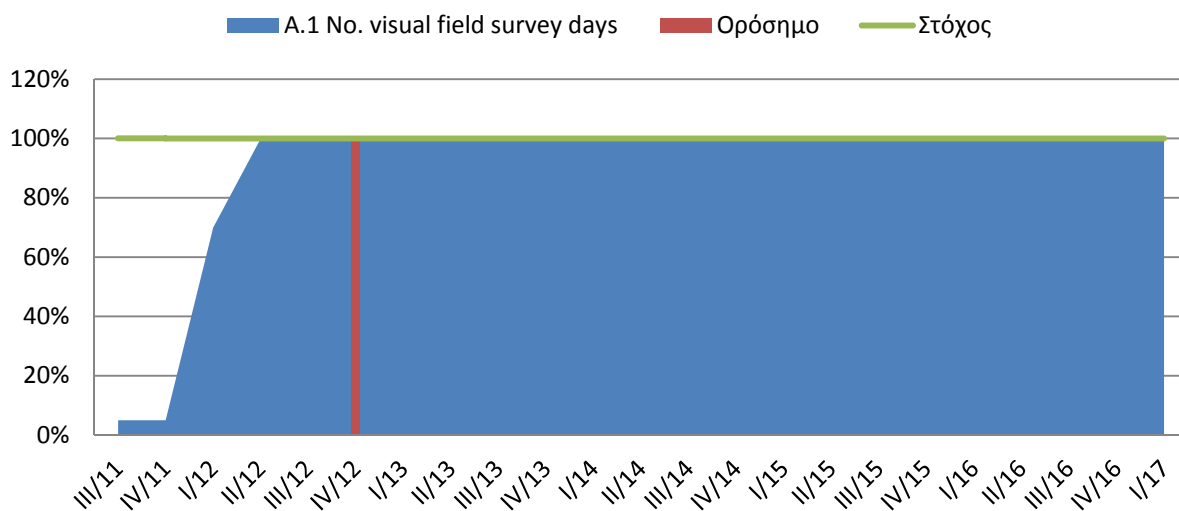


Πρόοδος Δείκτη Παρακολούθησης

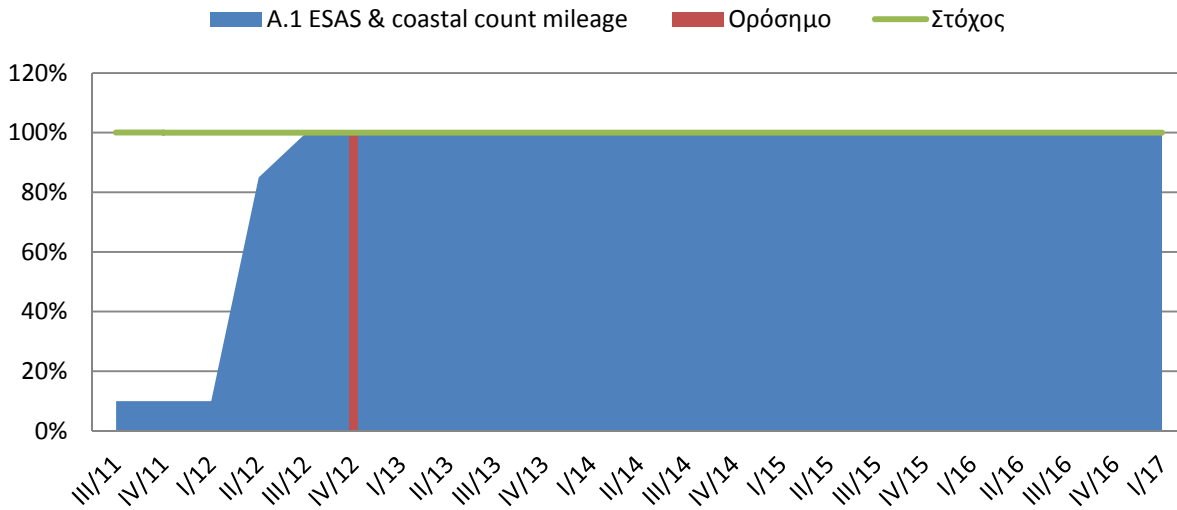


Πρόοδος Δείκτη Παρακολούθησης

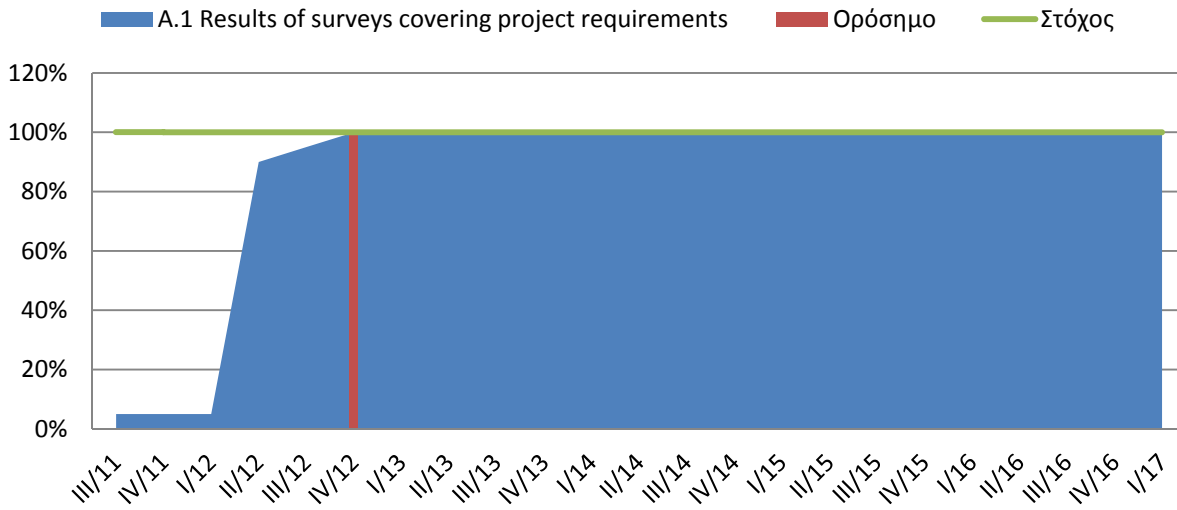


Πρόοδος Δείκτη Παρακολούθησης

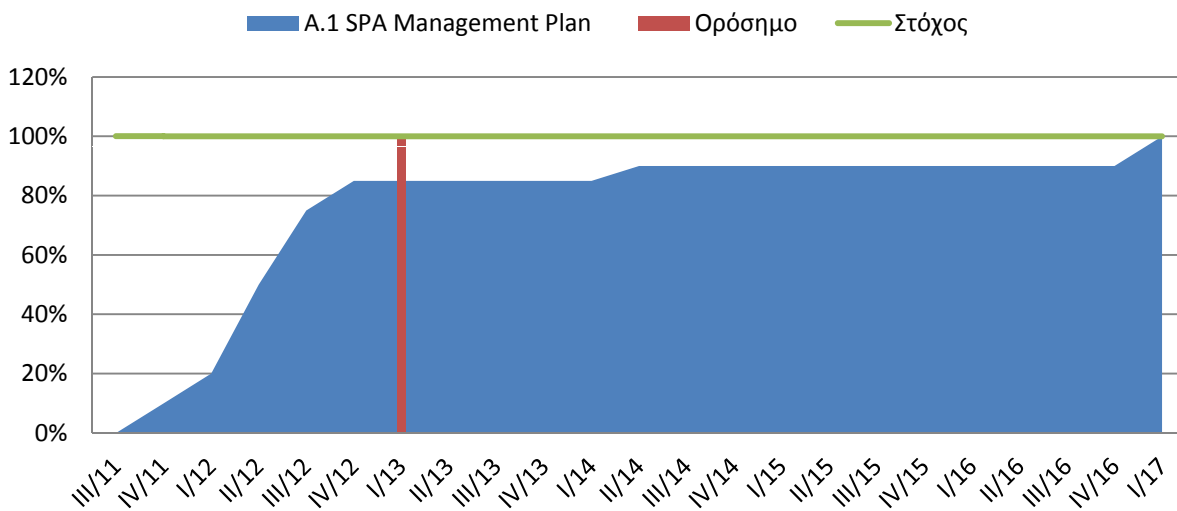


Πρόοδος Δείκτη Παρακολούθησης

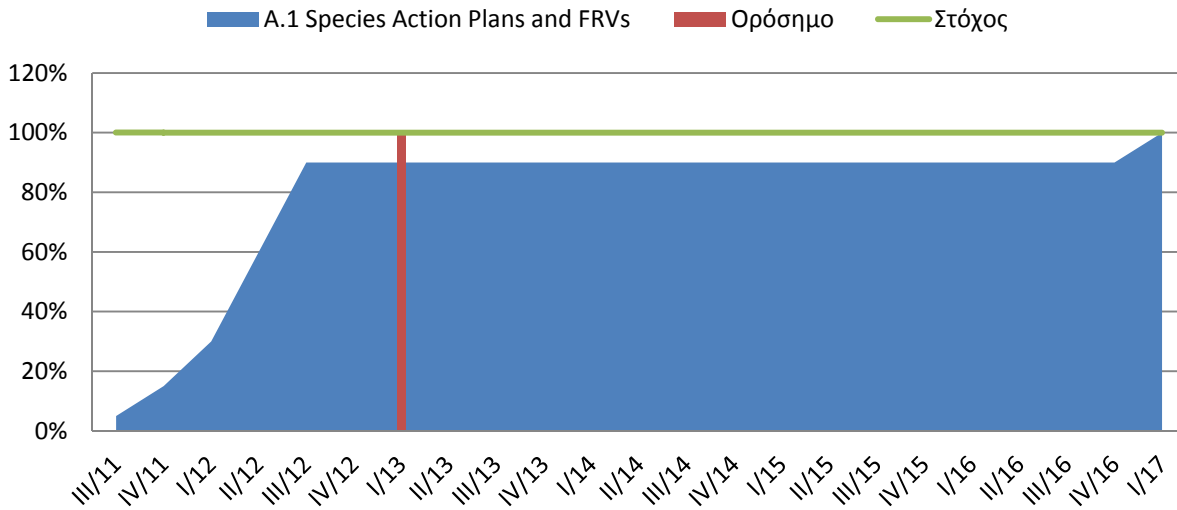


Πρόοδος Δείκτη Παρακολούθησης

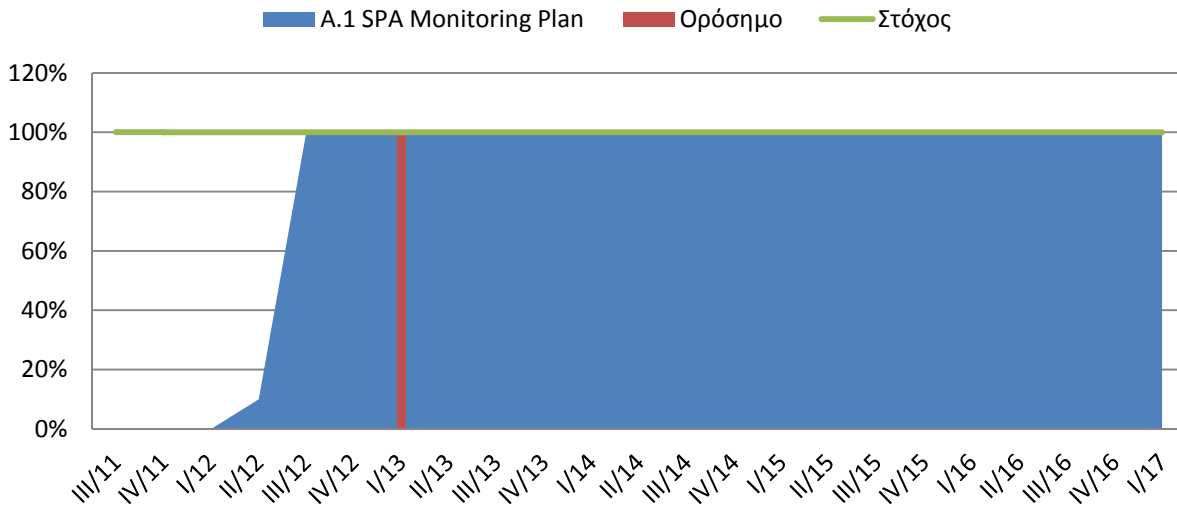


Πρόοδος Δείκτη Παρακολούθησης

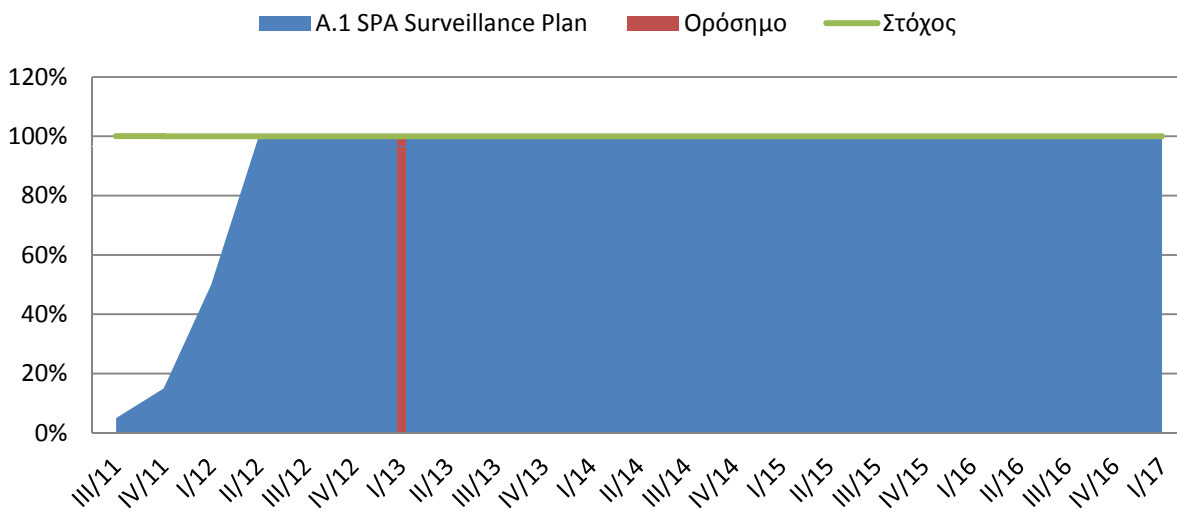


Πρόοδος Δείκτη Παρακολούθησης

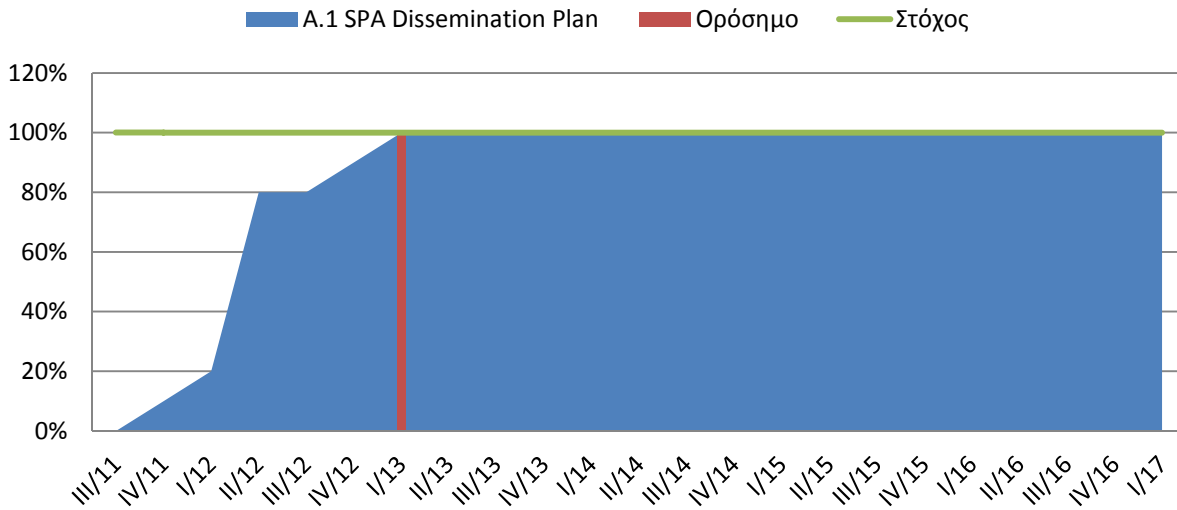


Πρόοδος Δείκτη Παρακολούθησης

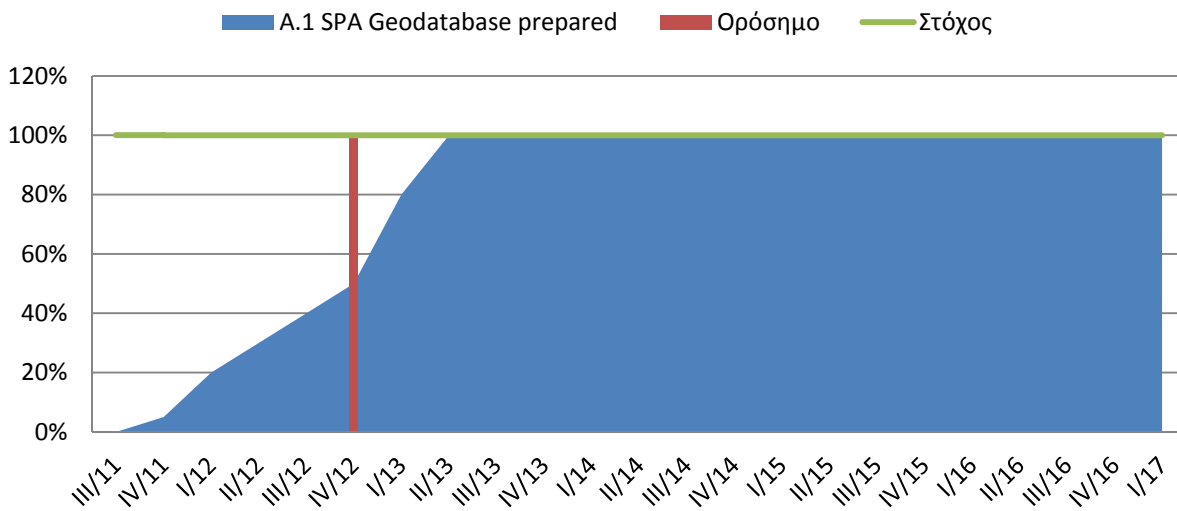


Πρόοδος Δείκτη Παρακολούθησης

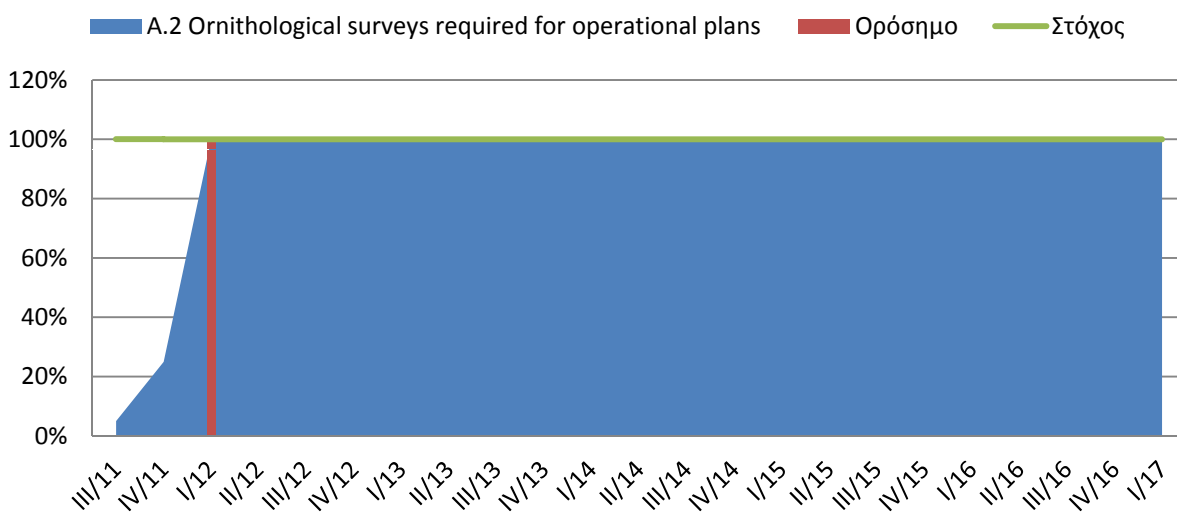


Πρόοδος Δείκτη Παρακολούθησης

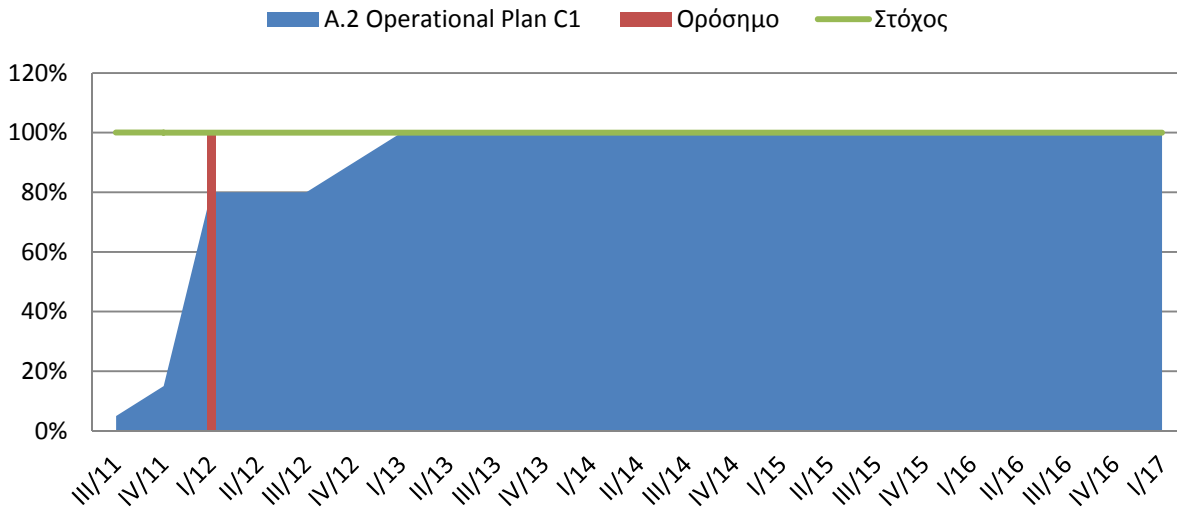


Πρόοδος Δείκτη Παρακολούθησης

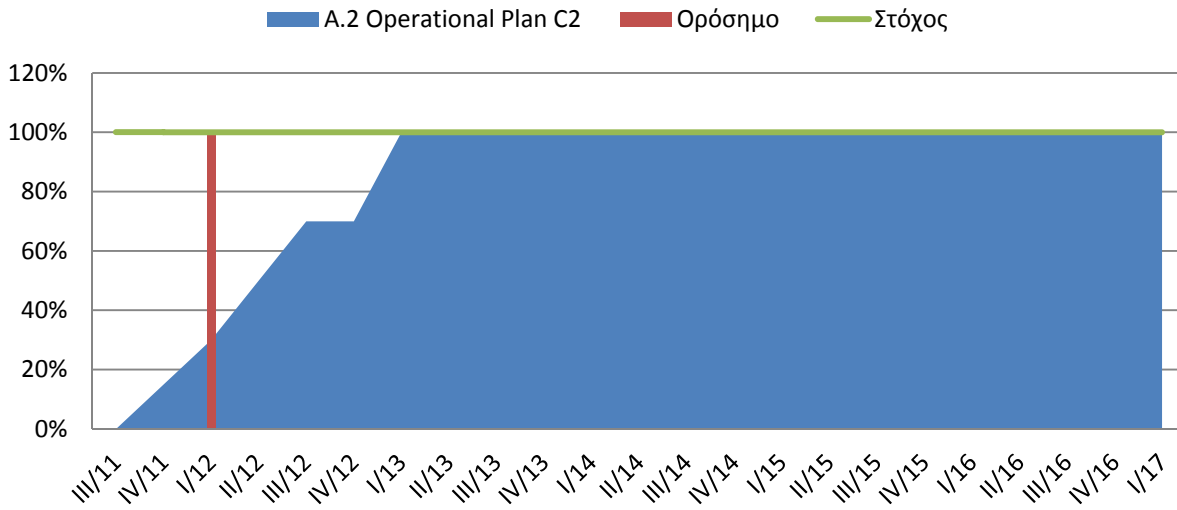


Πρόοδος Δείκτη Παρακολούθησης

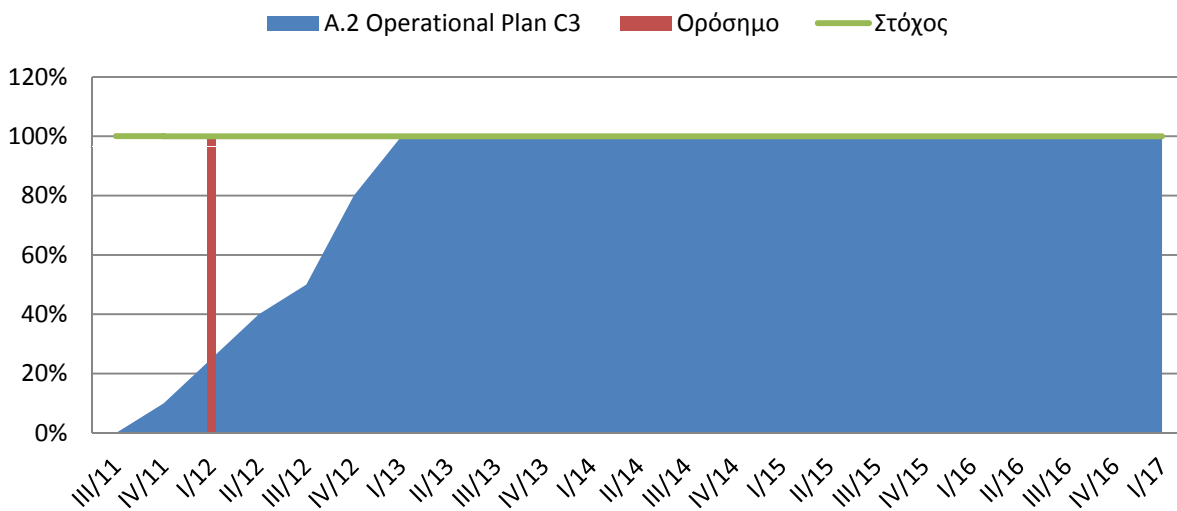


Πρόοδος Δείκτη Παρακολούθησης

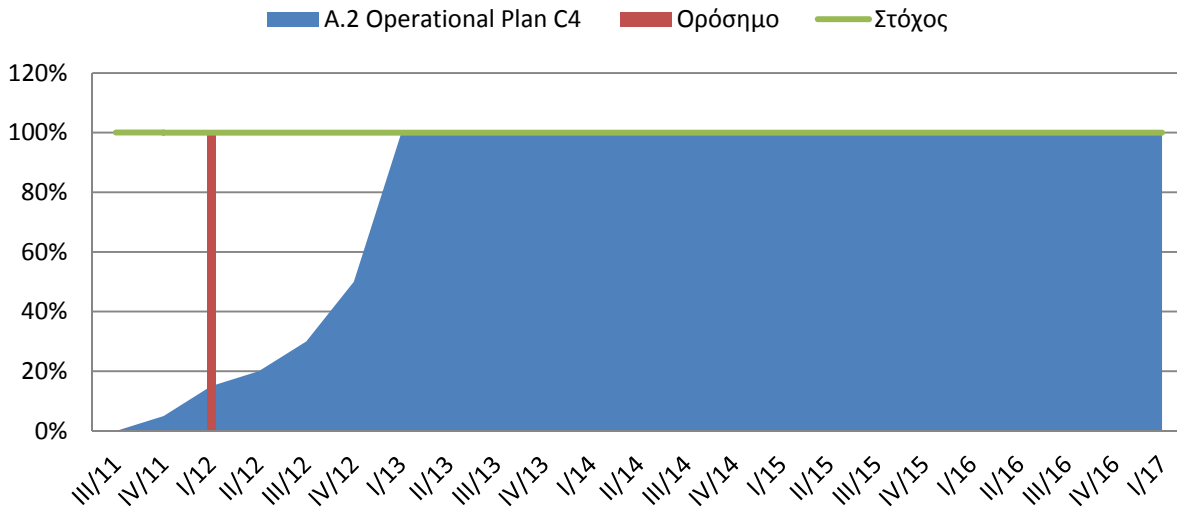


Πρόοδος Δείκτη Παρακολούθησης

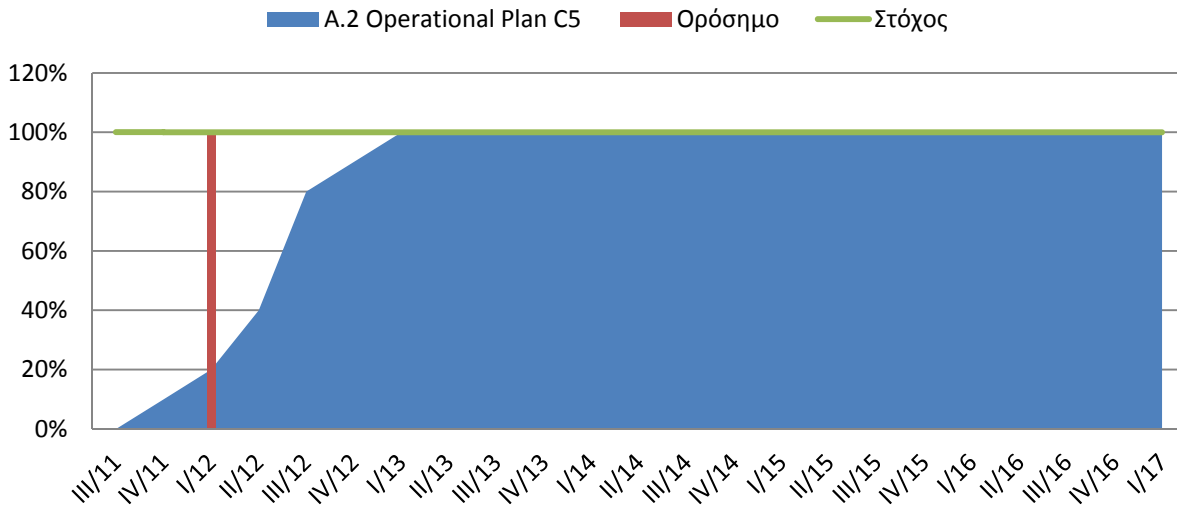


Πρόοδος Δείκτη Παρακολούθησης

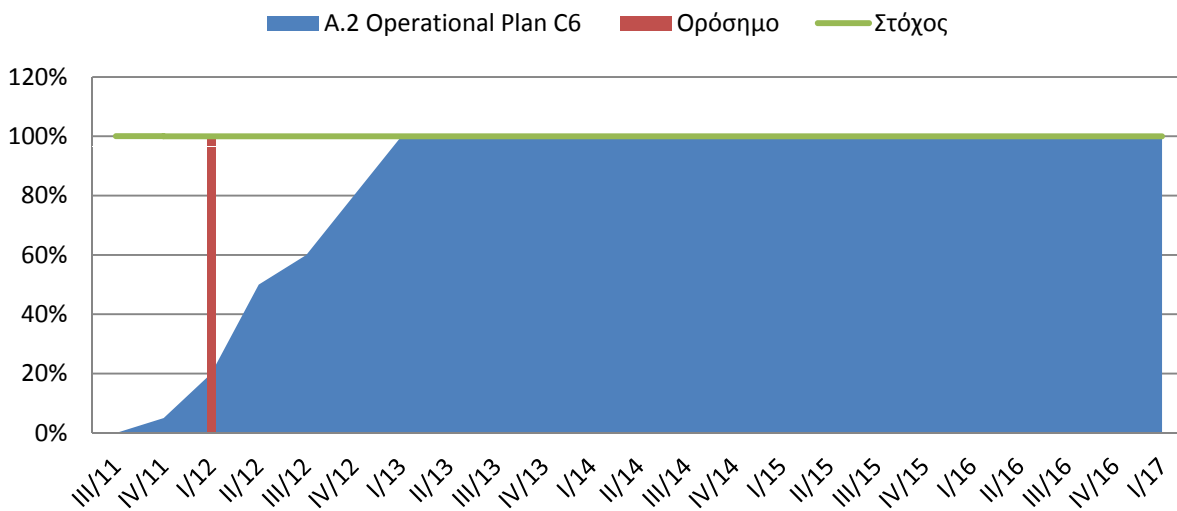


Πρόοδος Δείκτη Παρακολούθησης

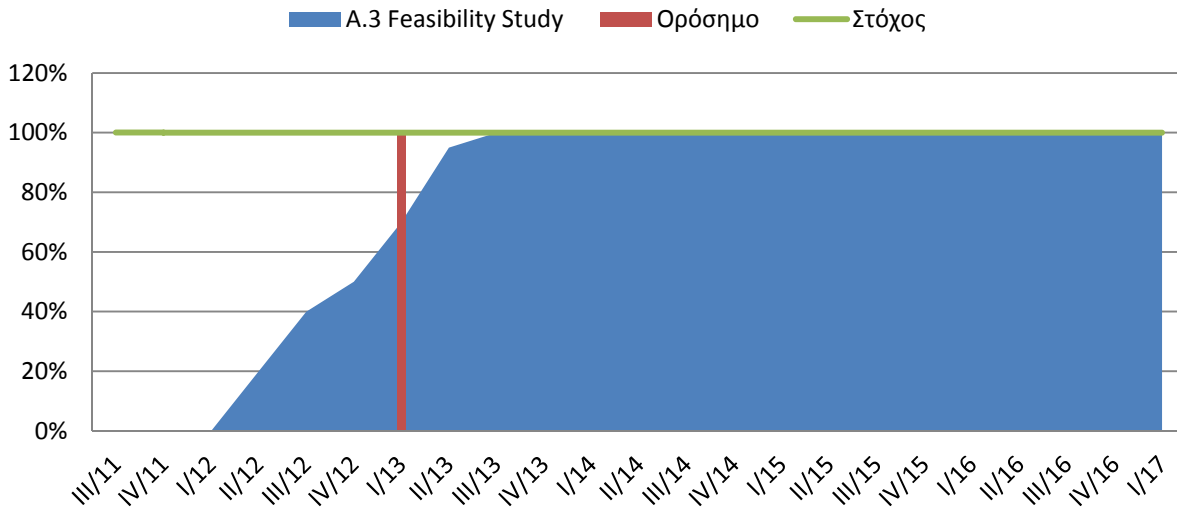


Πρόοδος Δείκτη Παρακολούθησης

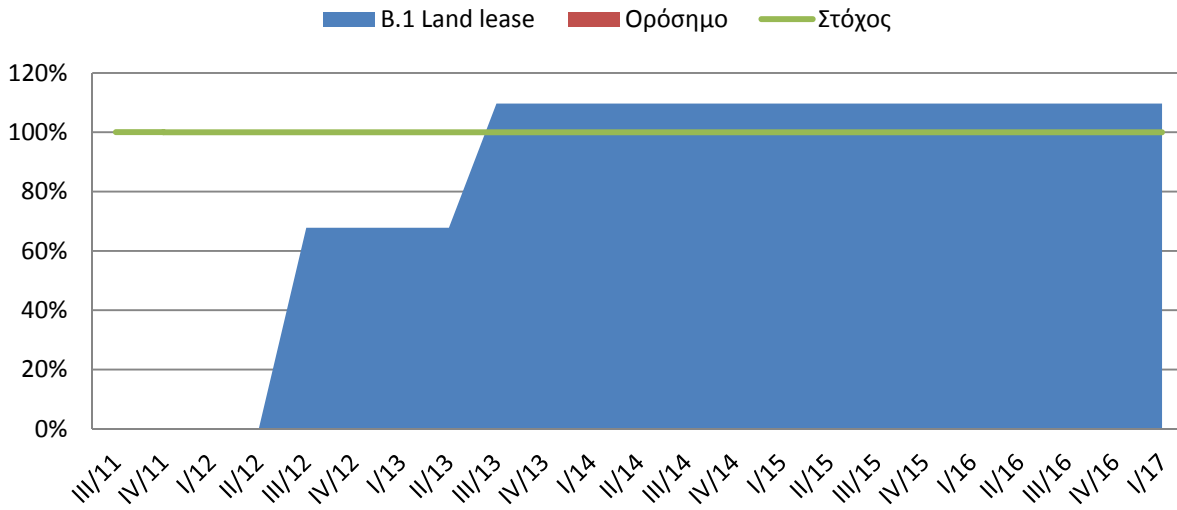


Πρόοδος Δείκτη Παρακολούθησης

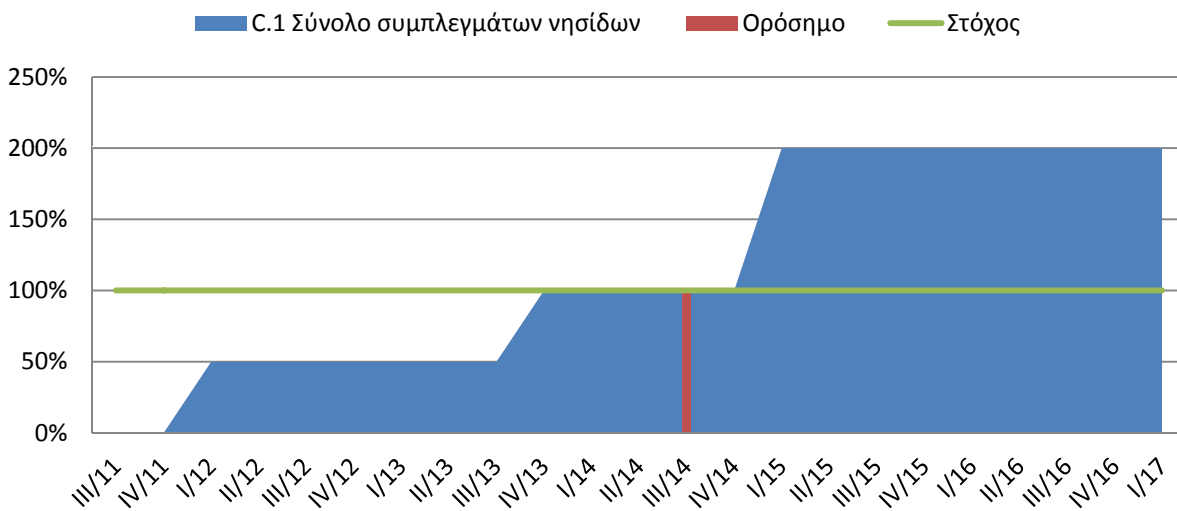


Πρόοδος Δείκτη Παρακολούθησης

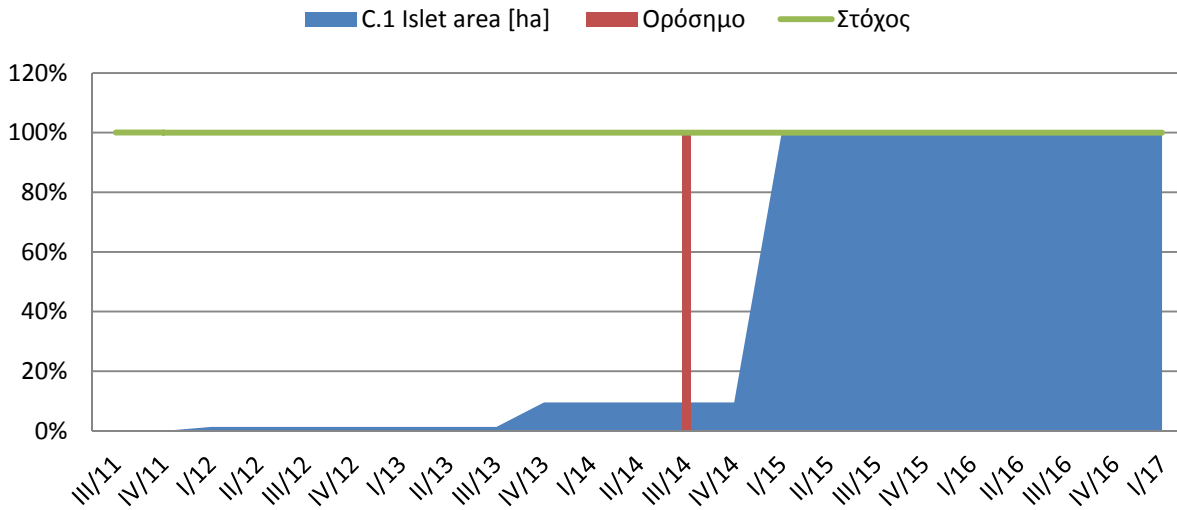


Πρόοδος Δείκτη Παρακολούθησης

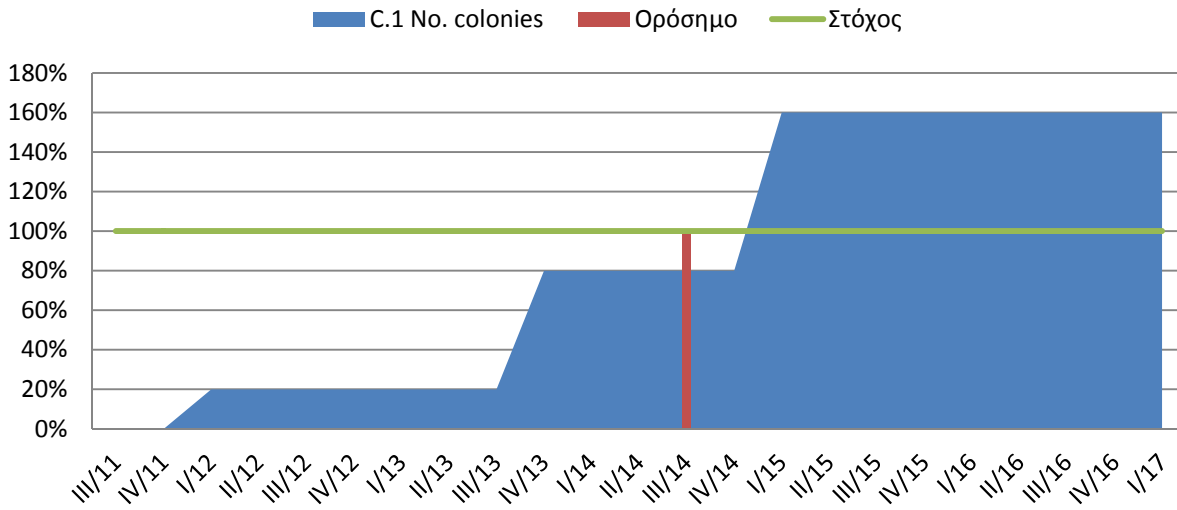


Πρόοδος Δείκτη Παρακολούθησης

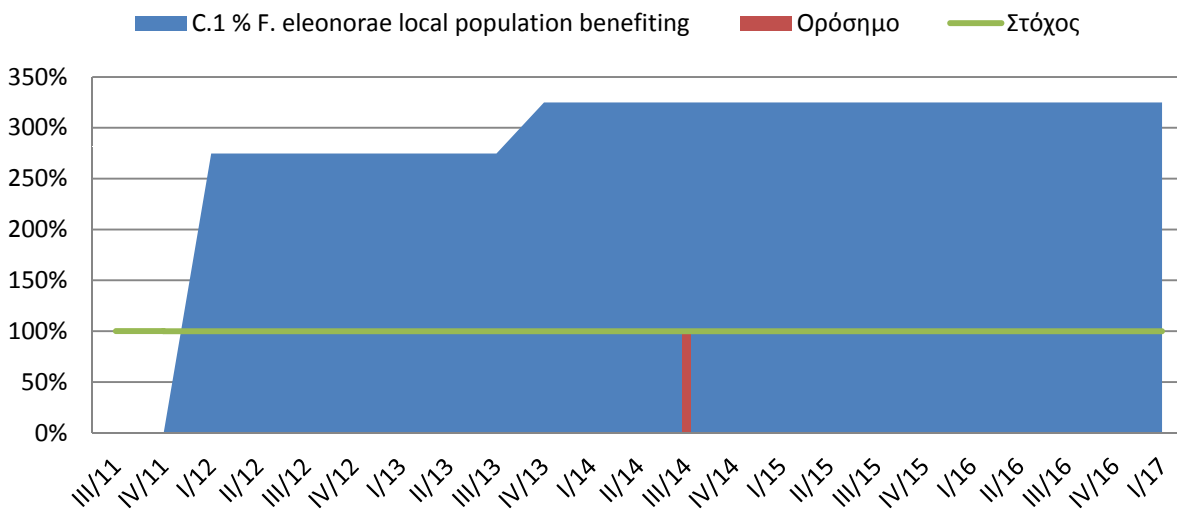


Πρόοδος Δείκτη Παρακολούθησης

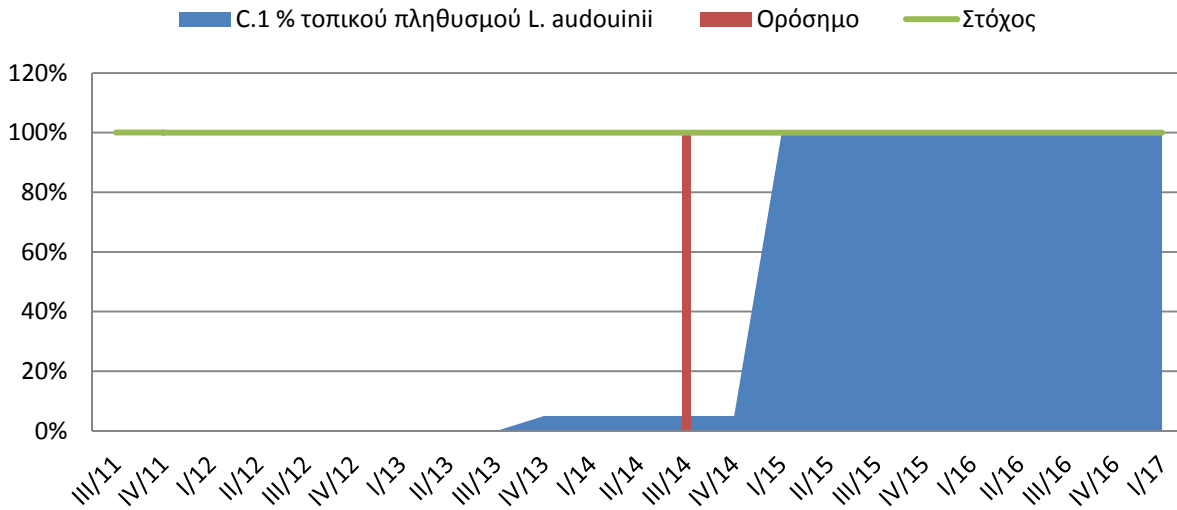


Πρόοδος Δείκτη Παρακολούθησης

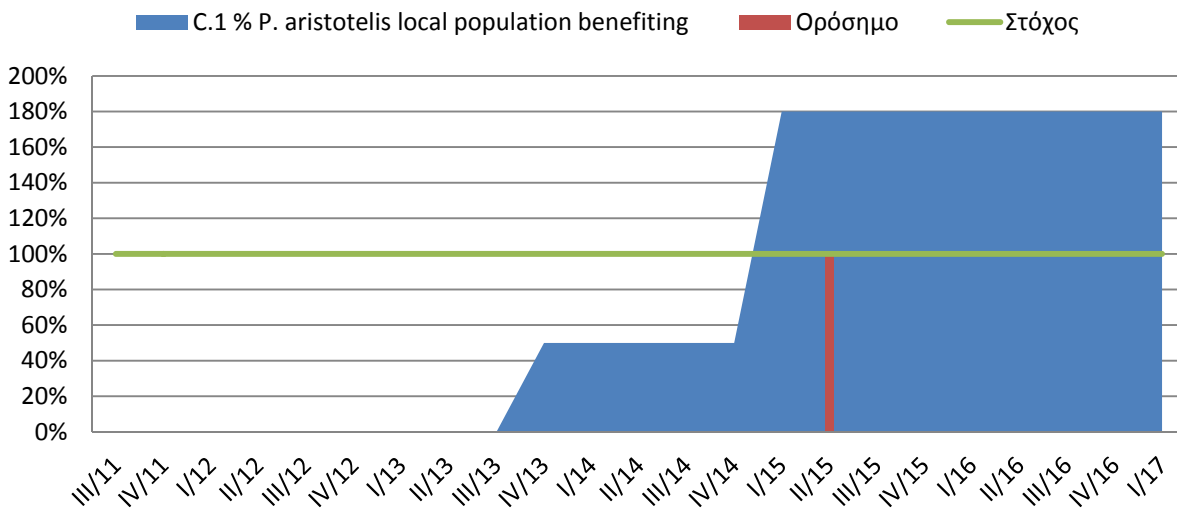


Πρόοδος Δείκτη Παρακολούθησης

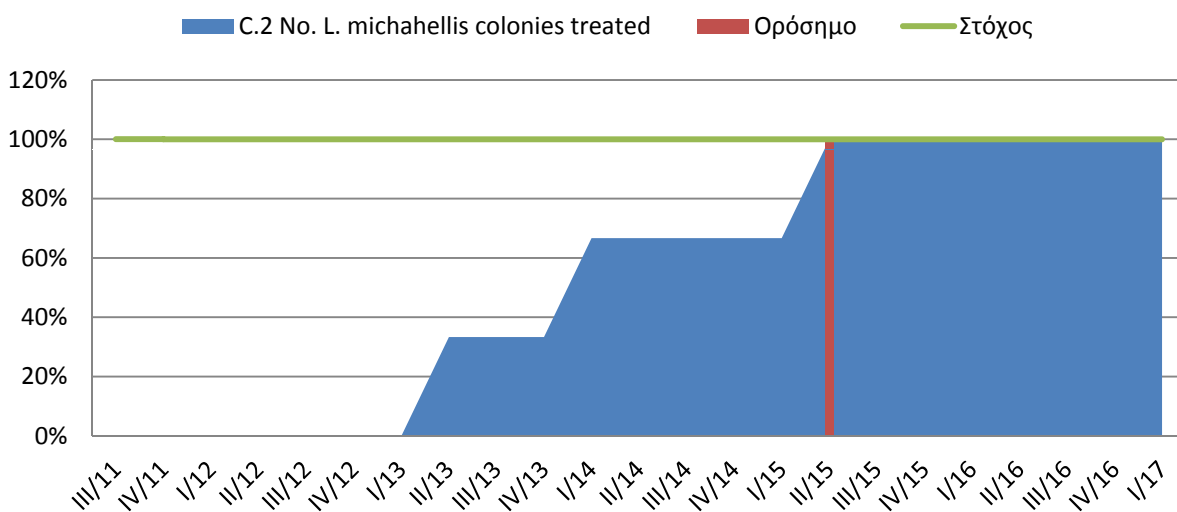


Πρόοδος Δείκτη Παρακολούθησης

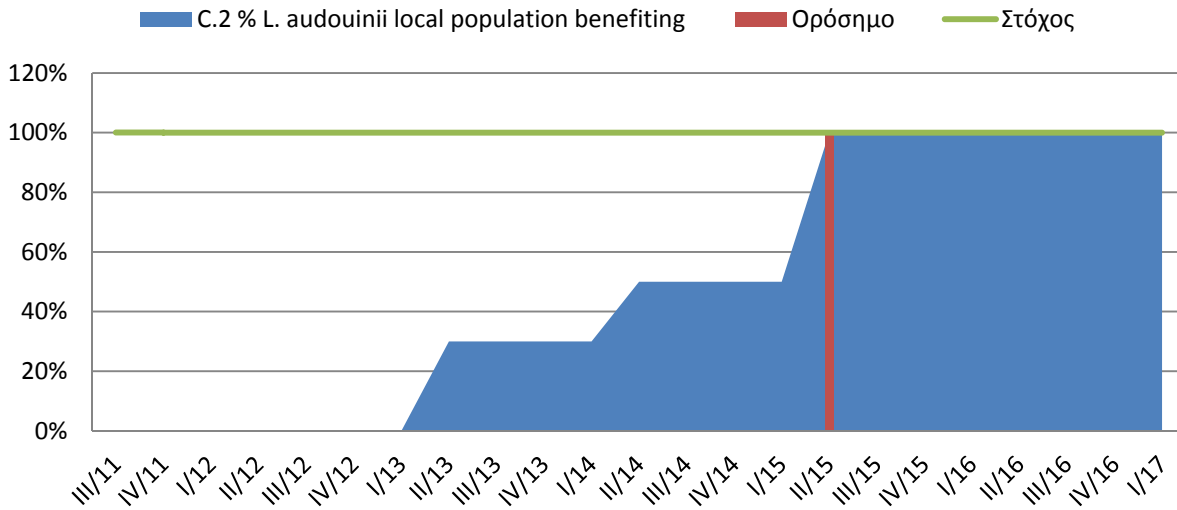


Πρόοδος Δείκτη Παρακολούθησης

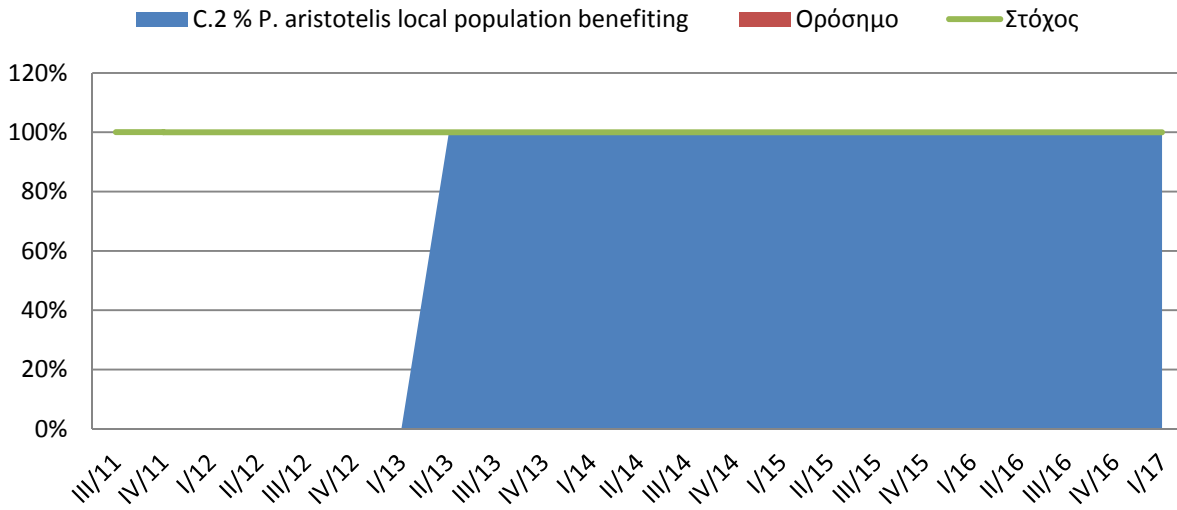


Πρόοδος Δείκτη Παρακολούθησης

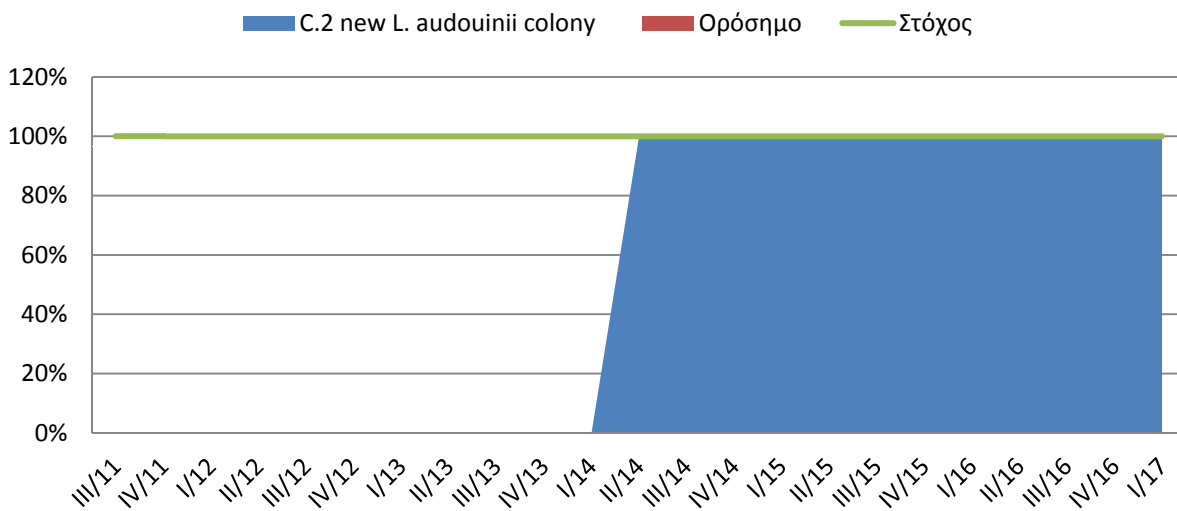


Πρόοδος Δείκτη Παρακολούθησης

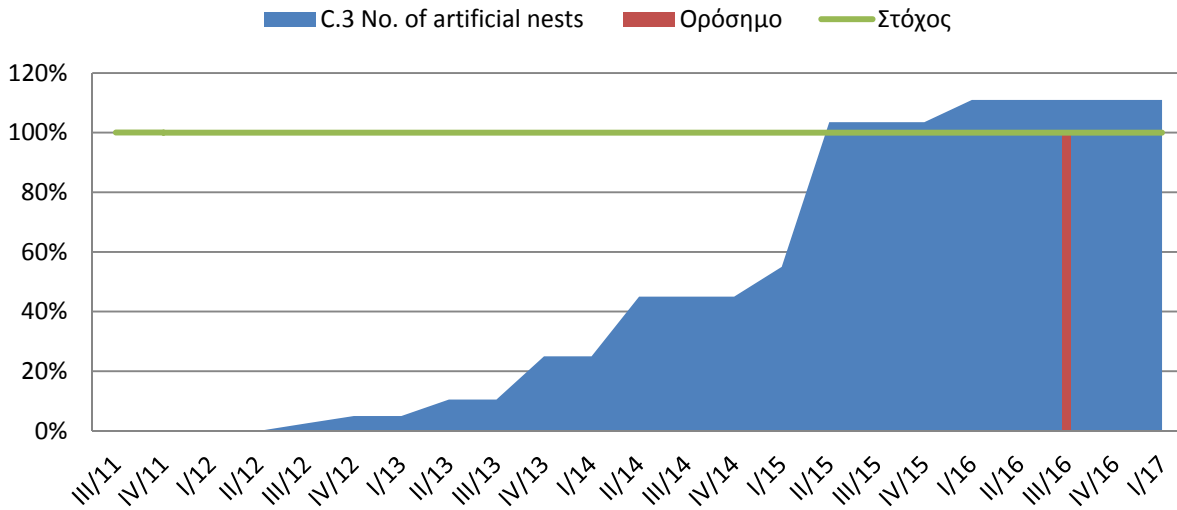


Πρόοδος Δείκτη Παρακολούθησης

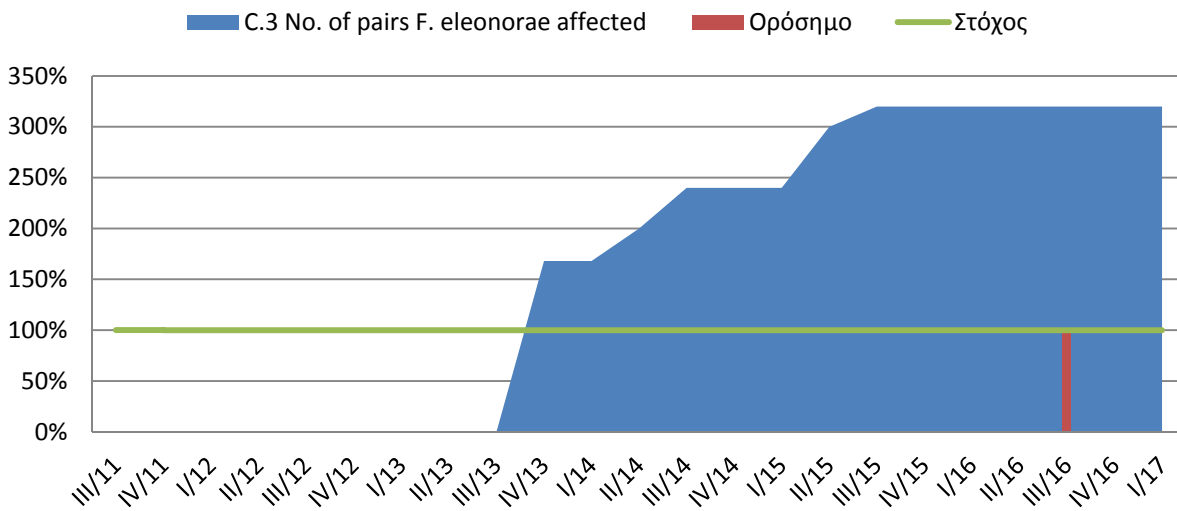


Πρόοδος Δείκτη Παρακολούθησης

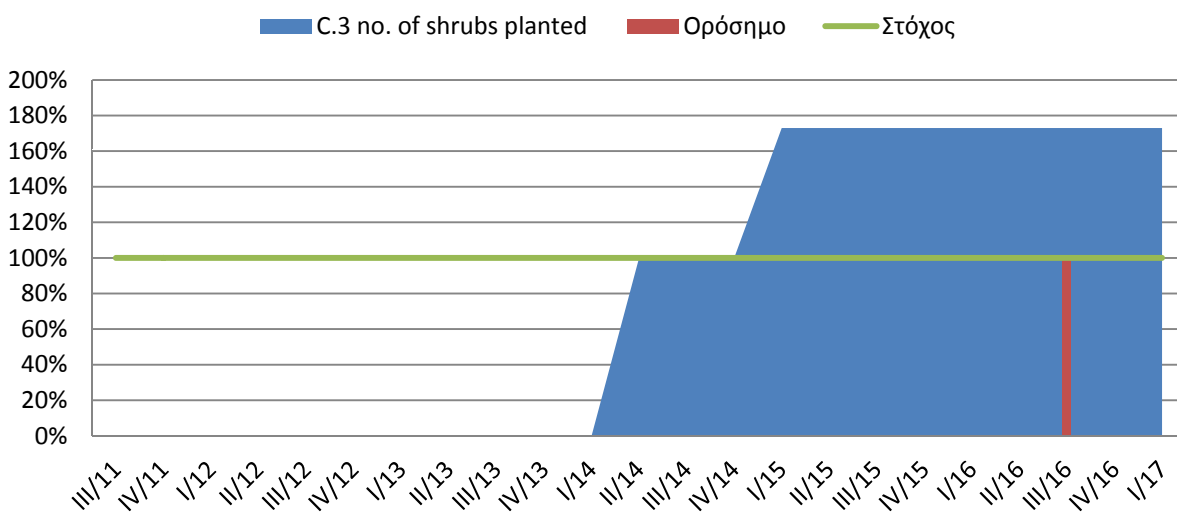


Πρόοδος Δείκτη Παρακολούθησης

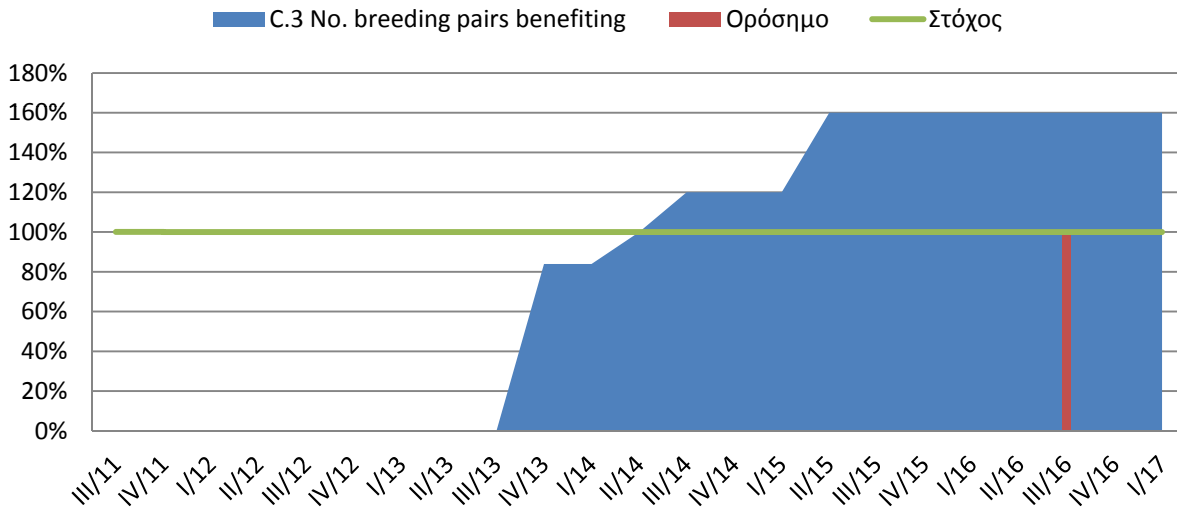


Πρόοδος Δείκτη Παρακολούθησης

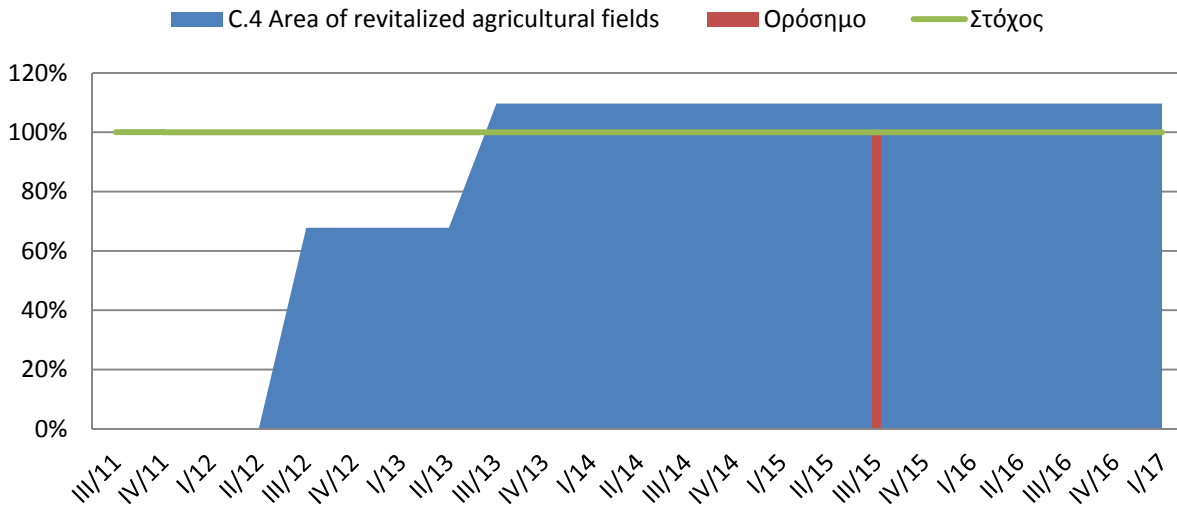


Πρόοδος Δείκτη Παρακολούθησης

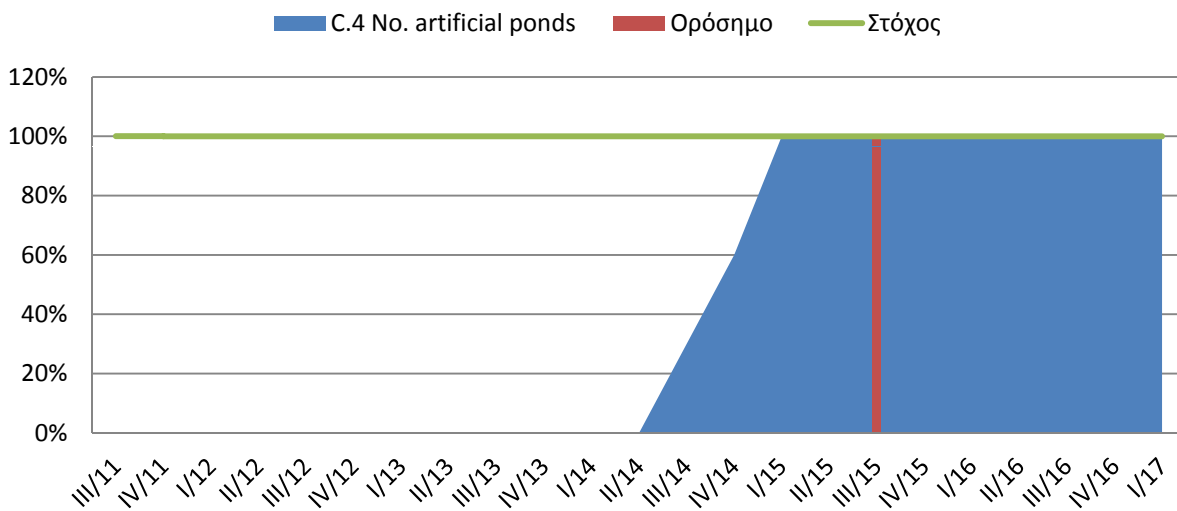


Πρόοδος Δείκτη Παρακολούθησης

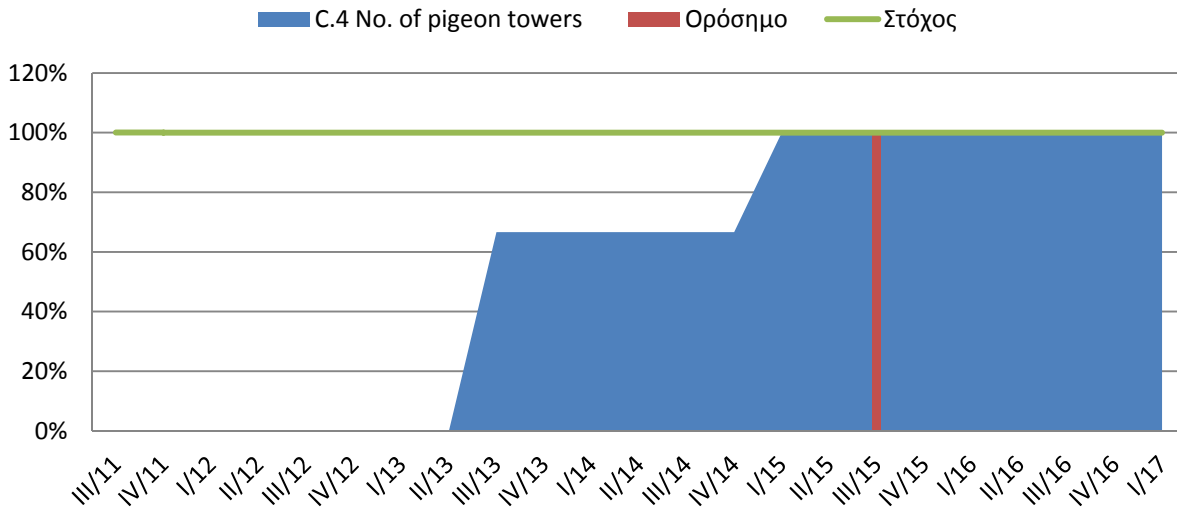


Πρόοδος Δείκτη Παρακολούθησης

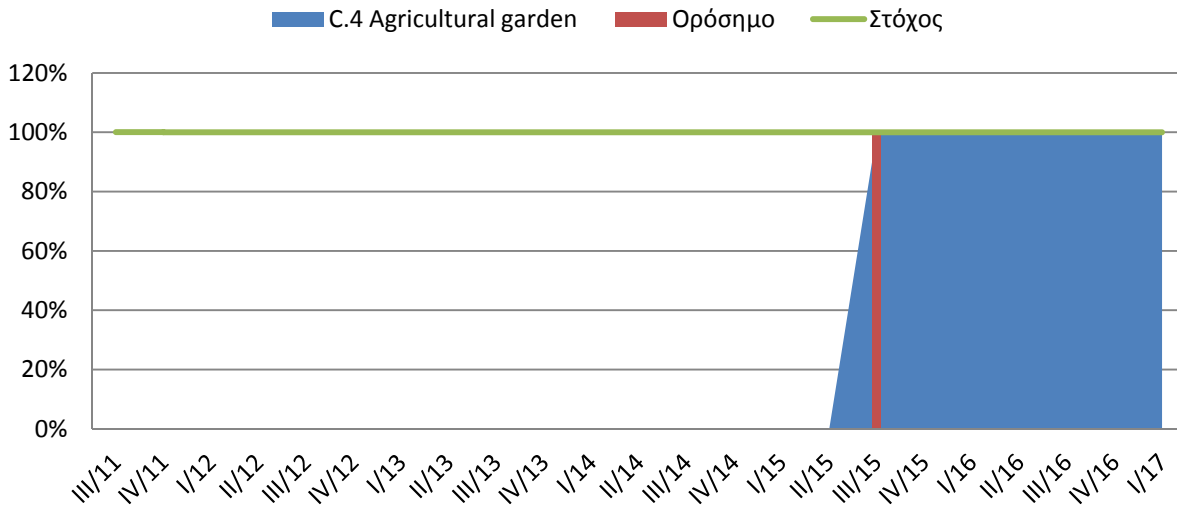


Πρόοδος Δείκτη Παρακολούθησης

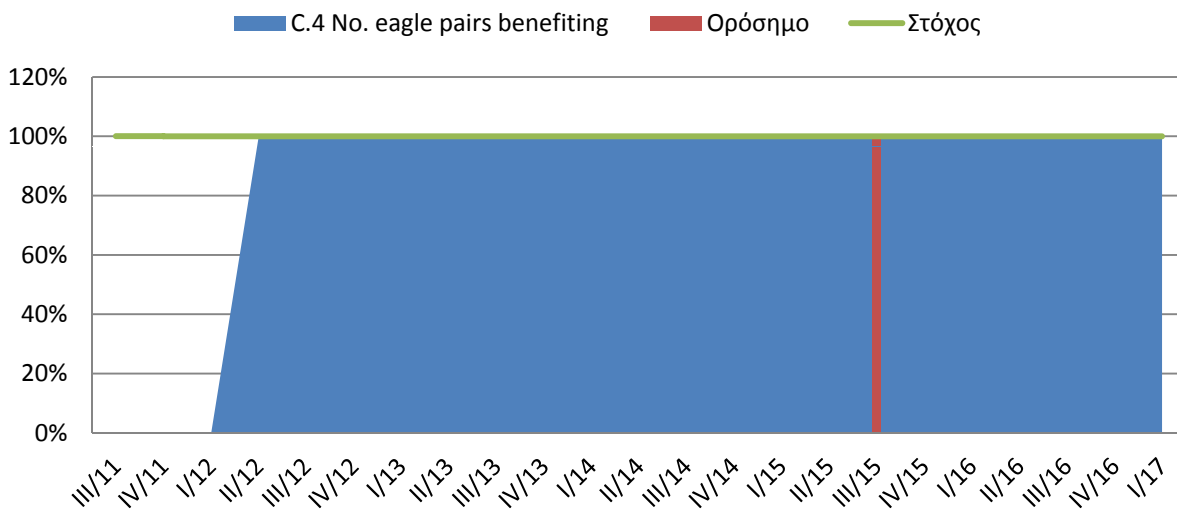


Πρόοδος Δείκτη Παρακολούθησης

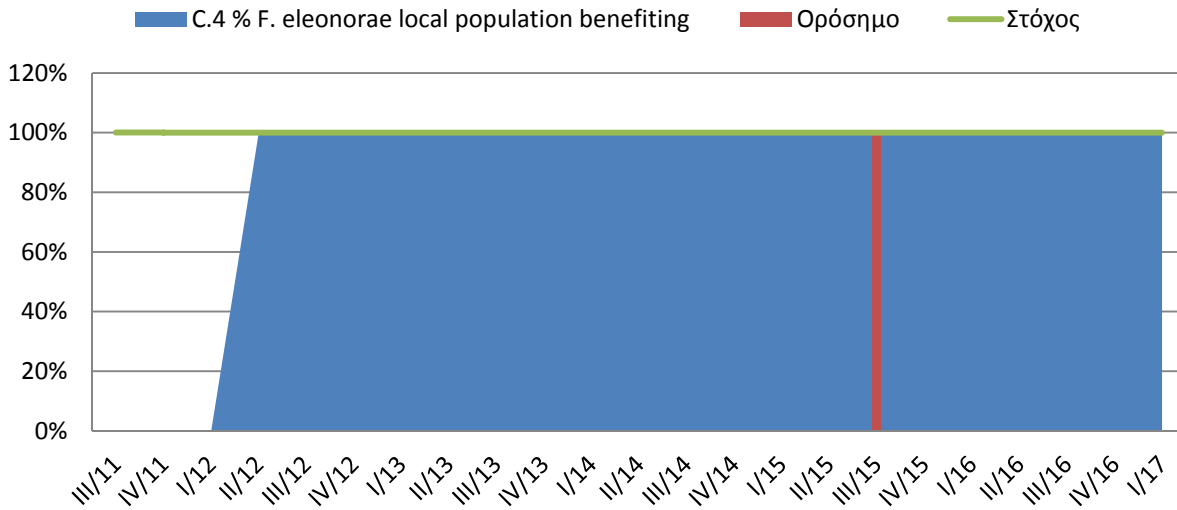


Πρόοδος Δείκτη Παρακολούθησης

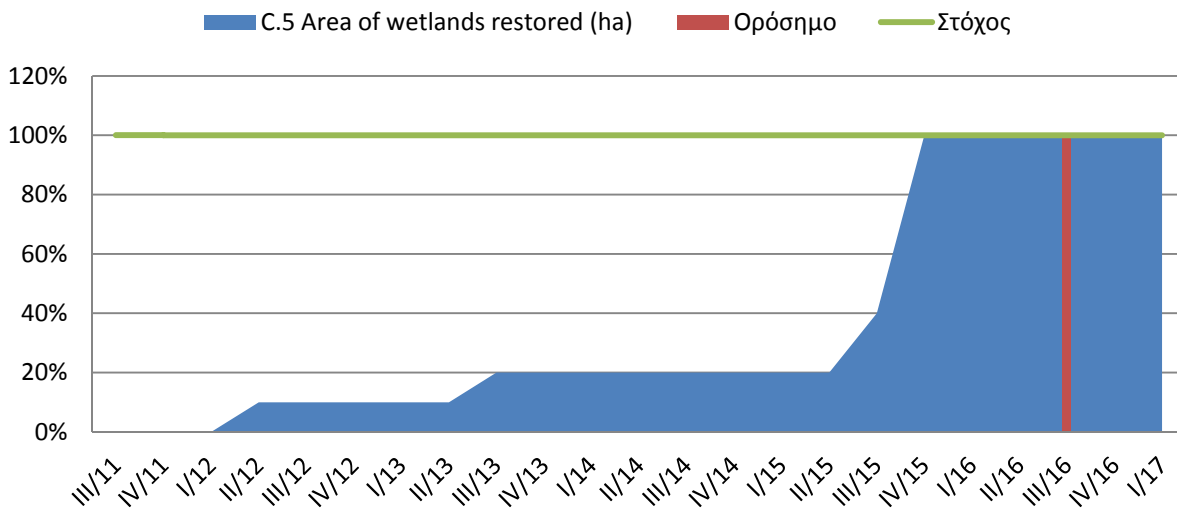


Πρόοδος Δείκτη Παρακολούθησης

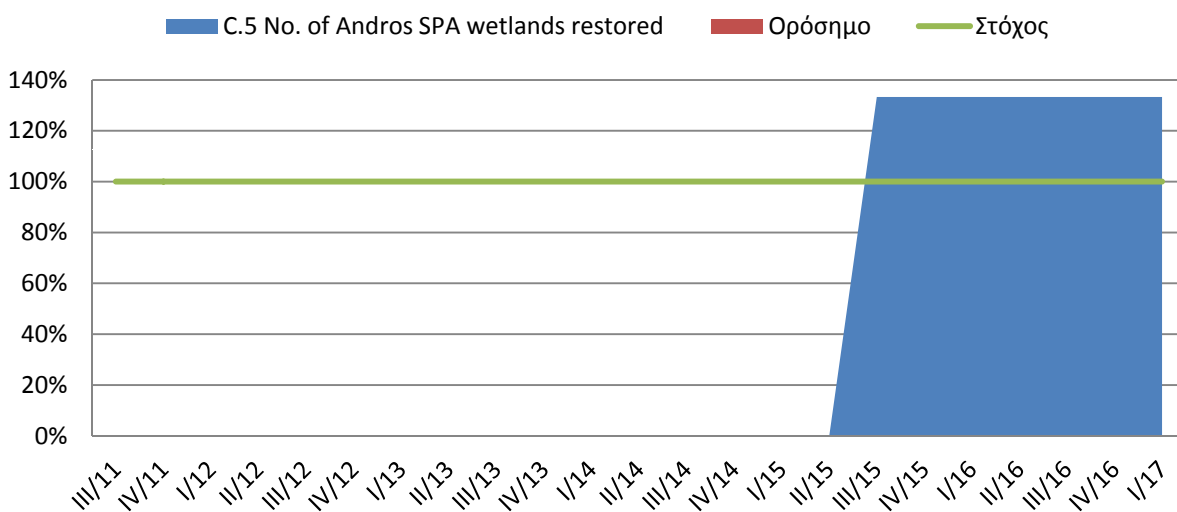


Πρόοδος Δείκτη Παρακολούθησης

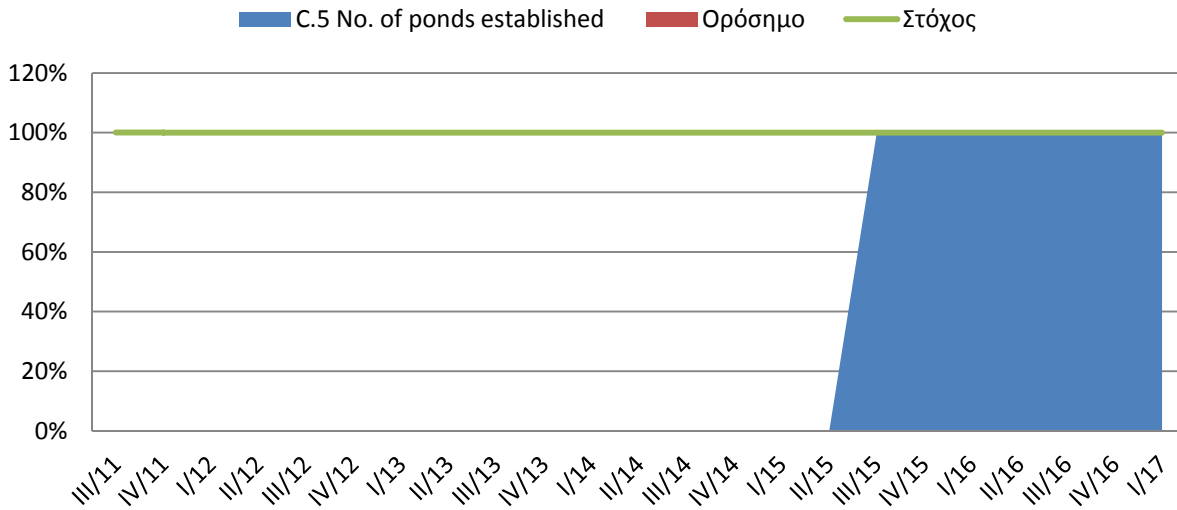


Πρόοδος Δείκτη Παρακολούθησης

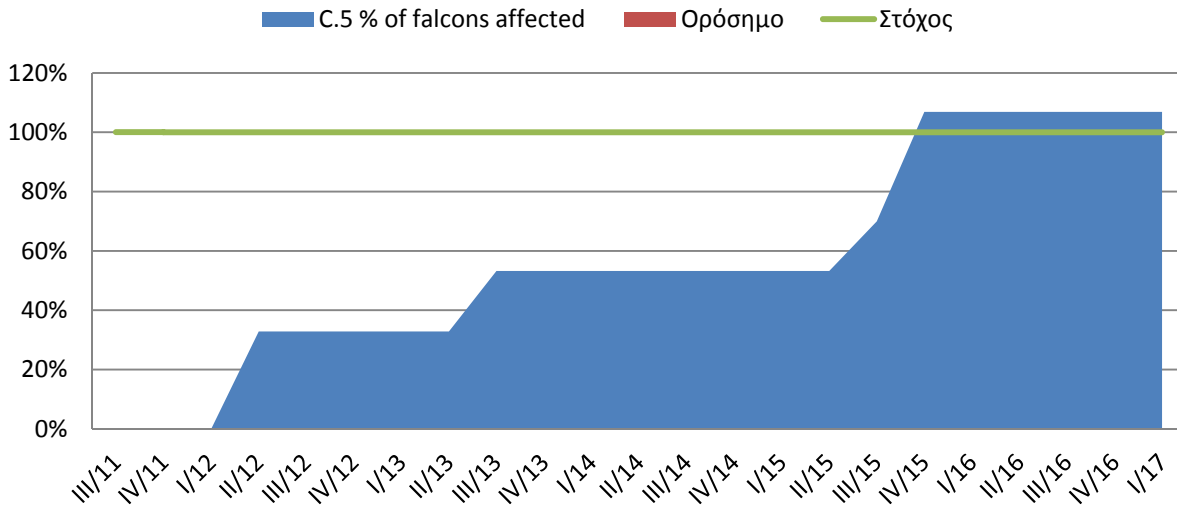


Πρόοδος Δείκτη Παρακολούθησης

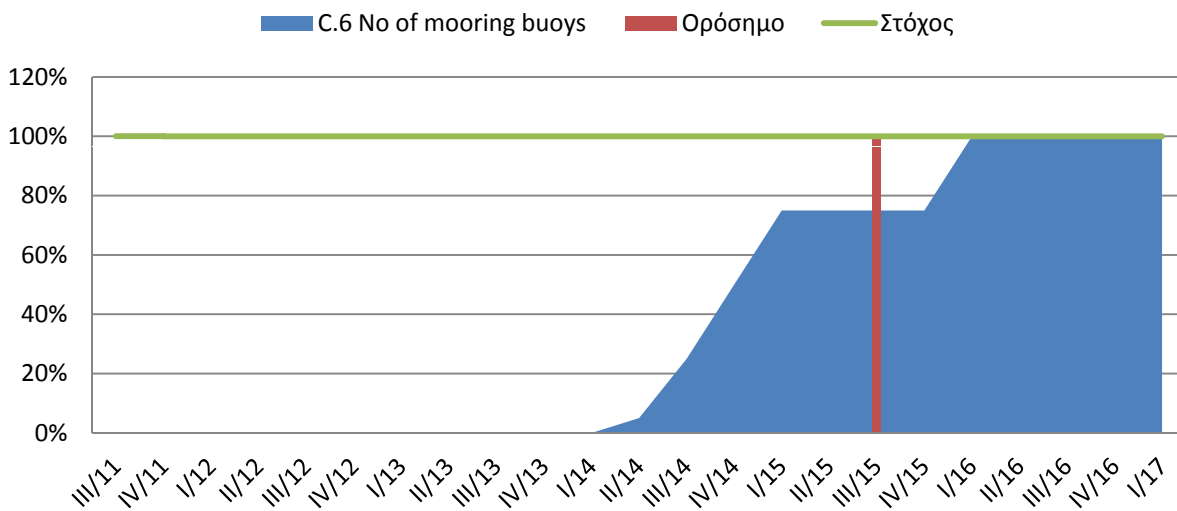


Πρόοδος Δείκτη Παρακολούθησης

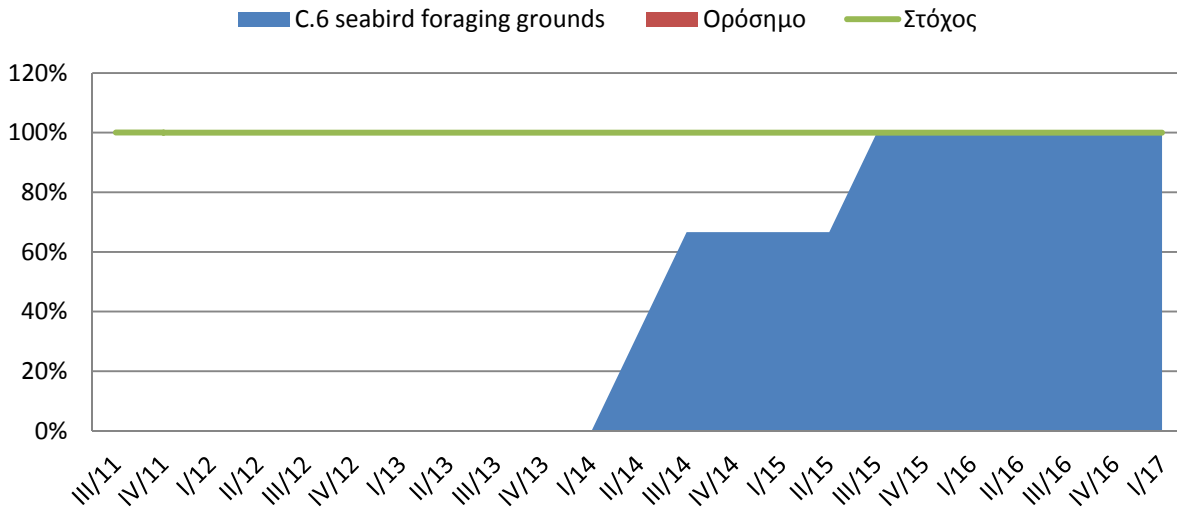


Πρόοδος Δείκτη Παρακολούθησης

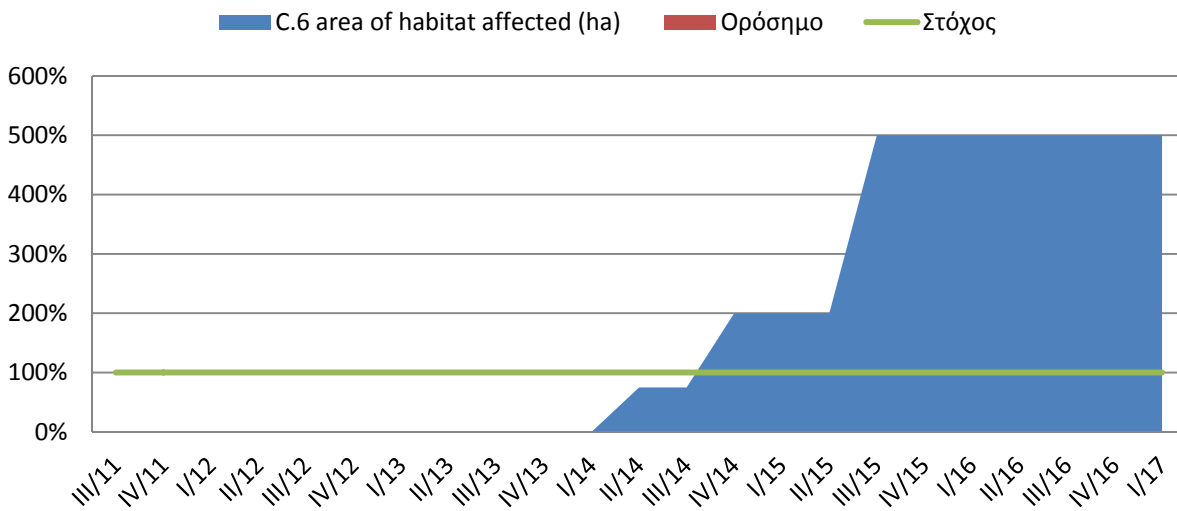


Πρόοδος Δείκτη Παρακολούθησης

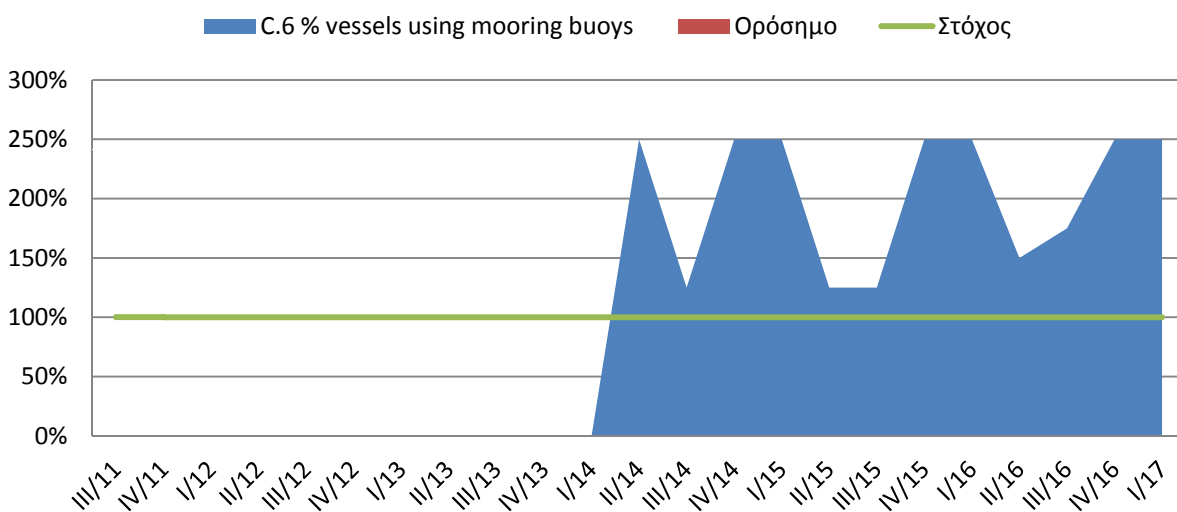


Πρόοδος Δείκτη Παρακολούθησης

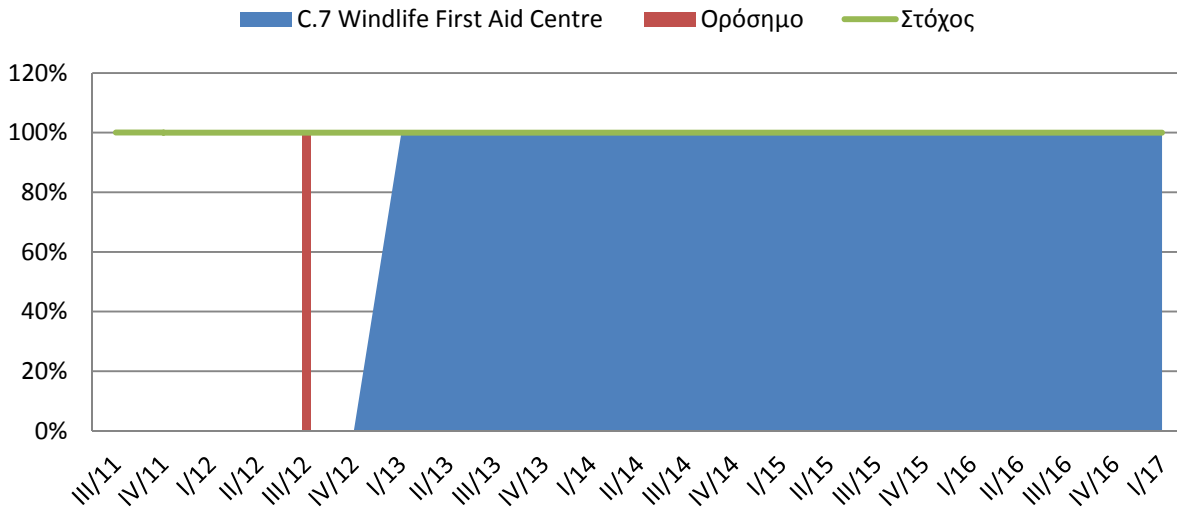


Πρόοδος Δείκτη Παρακολούθησης

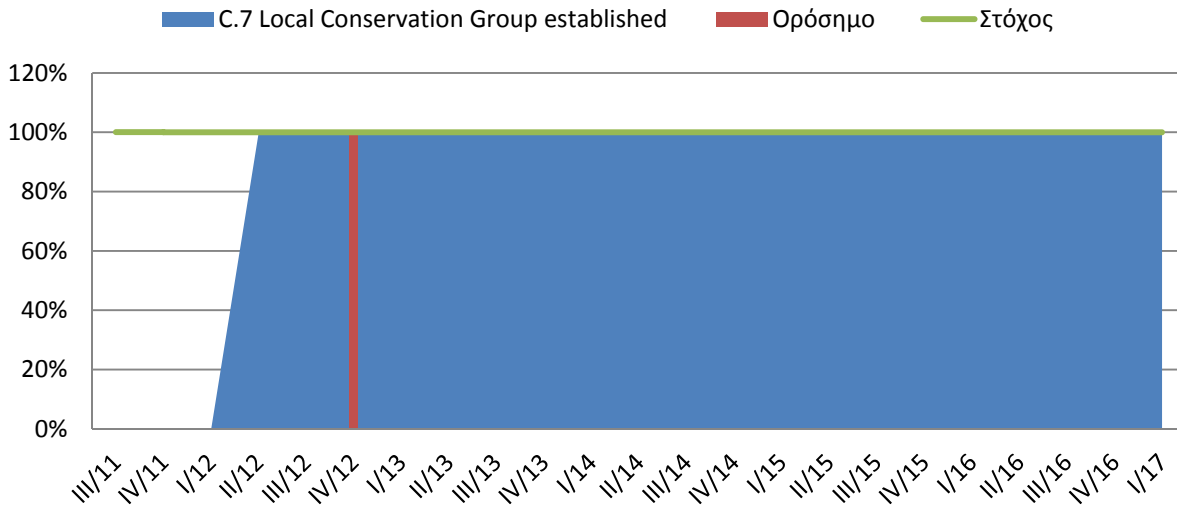


Πρόοδος Δείκτη Παρακολούθησης

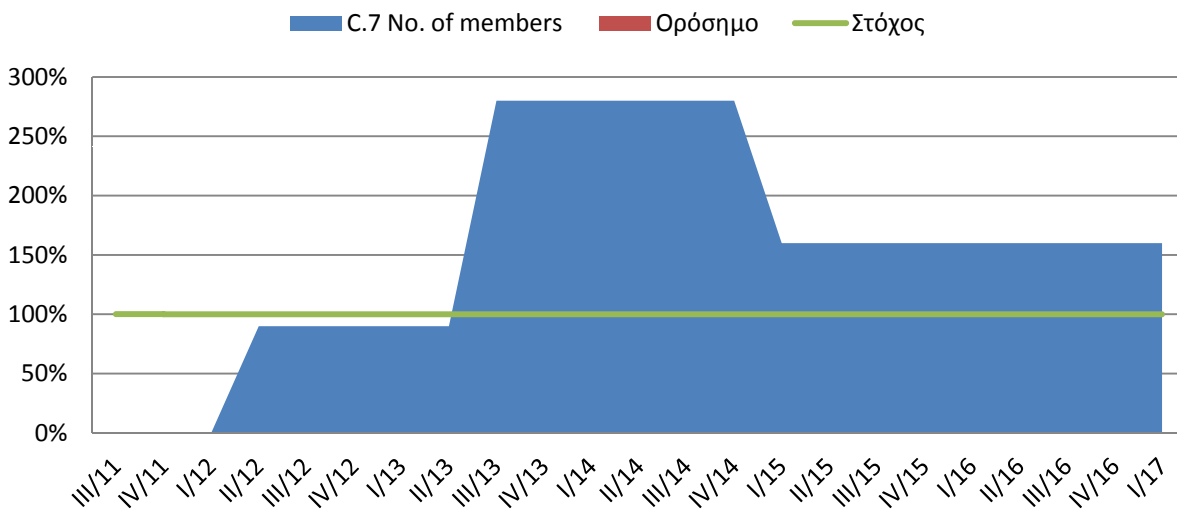


Πρόοδος Δείκτη Παρακολούθησης

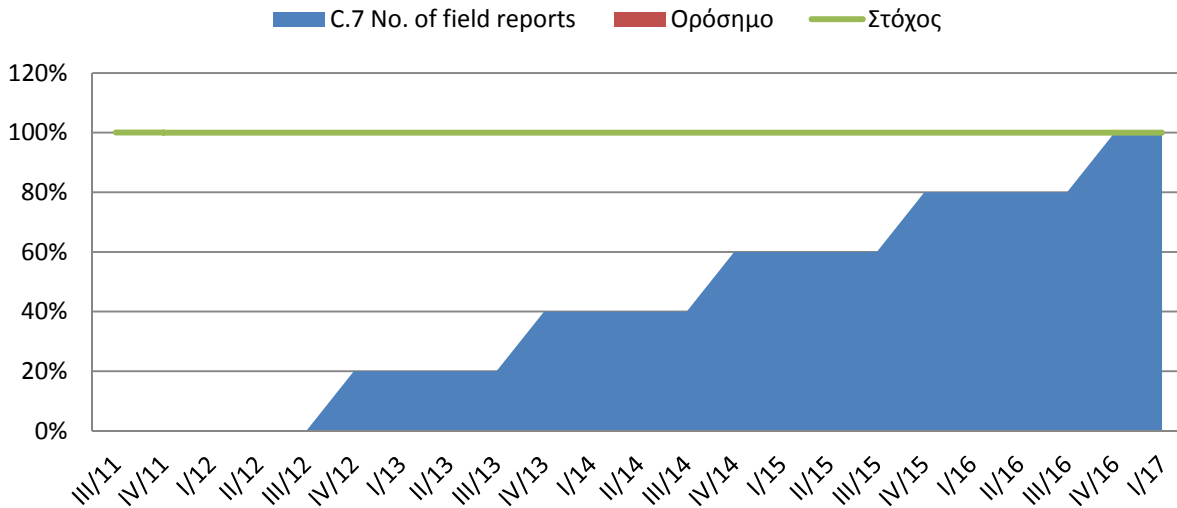


Πρόοδος Δείκτη Παρακολούθησης

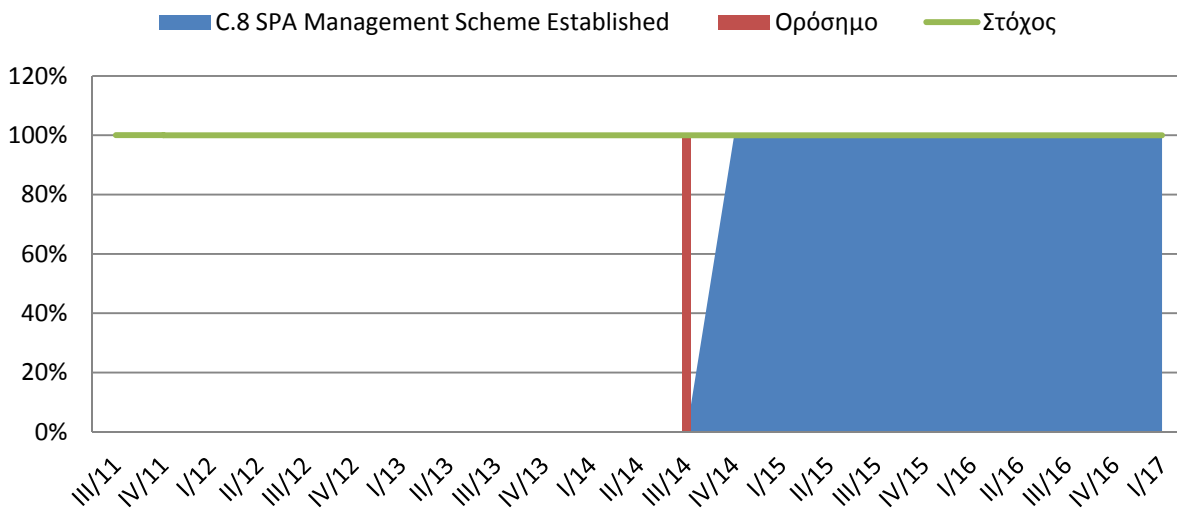


Πρόοδος Δείκτη Παρακολούθησης

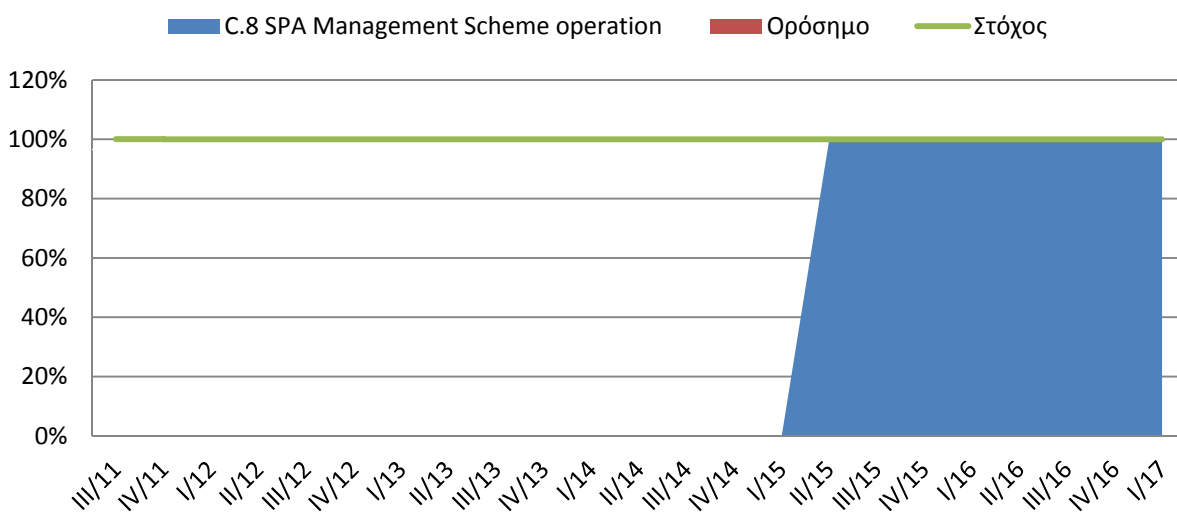


Πρόοδος Δείκτη Παρακολούθησης

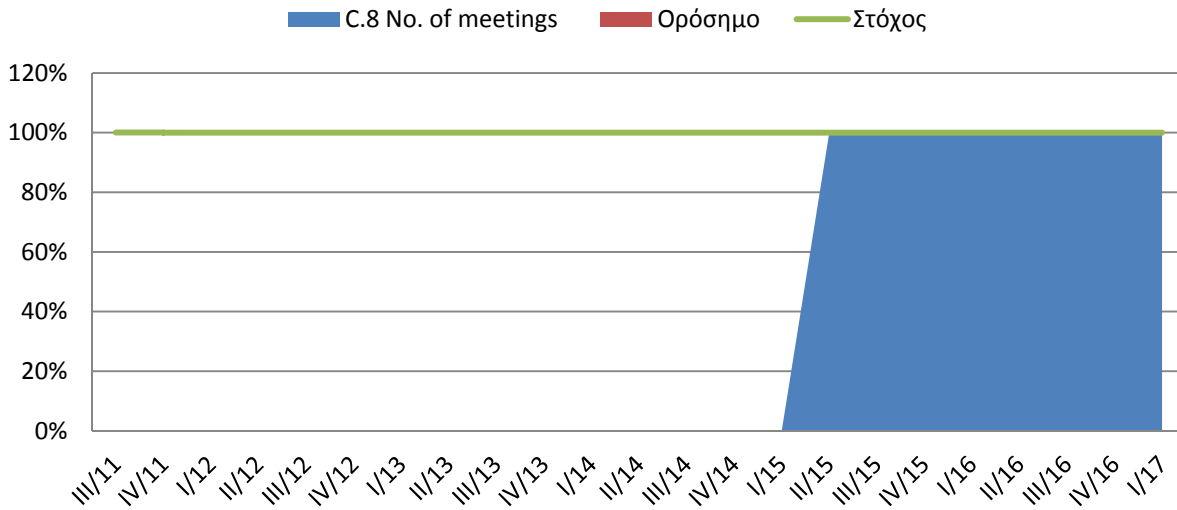


Πρόοδος Δείκτη Παρακολούθησης

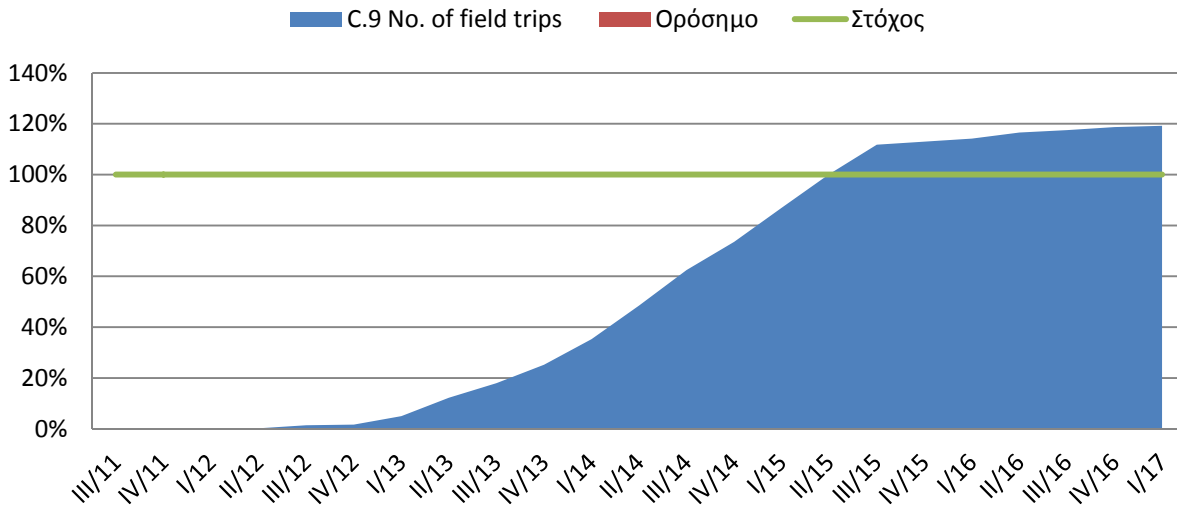


Πρόοδος Δείκτη Παρακολούθησης

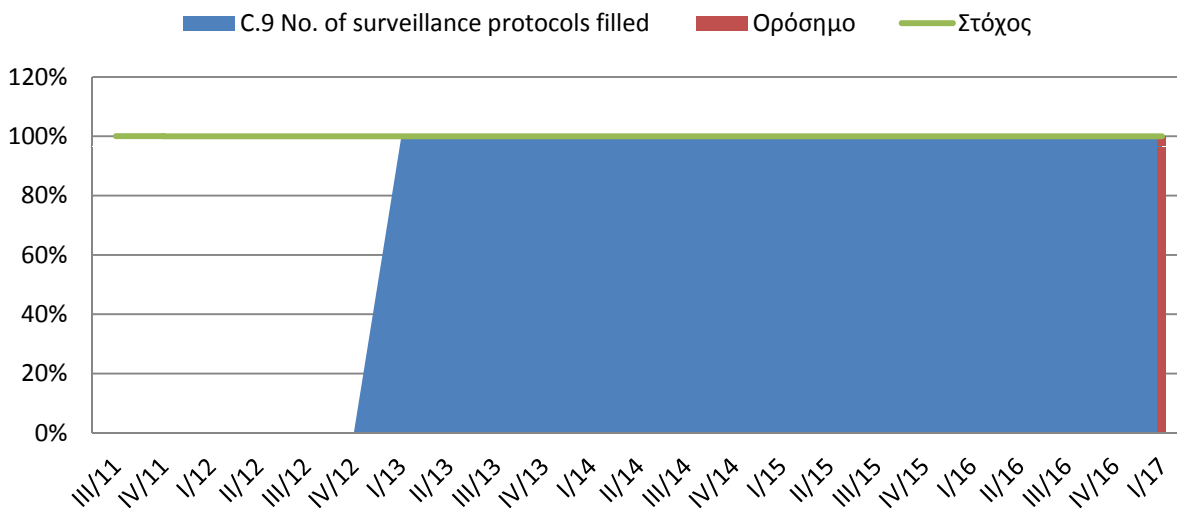


Πρόοδος Δείκτη Παρακολούθησης

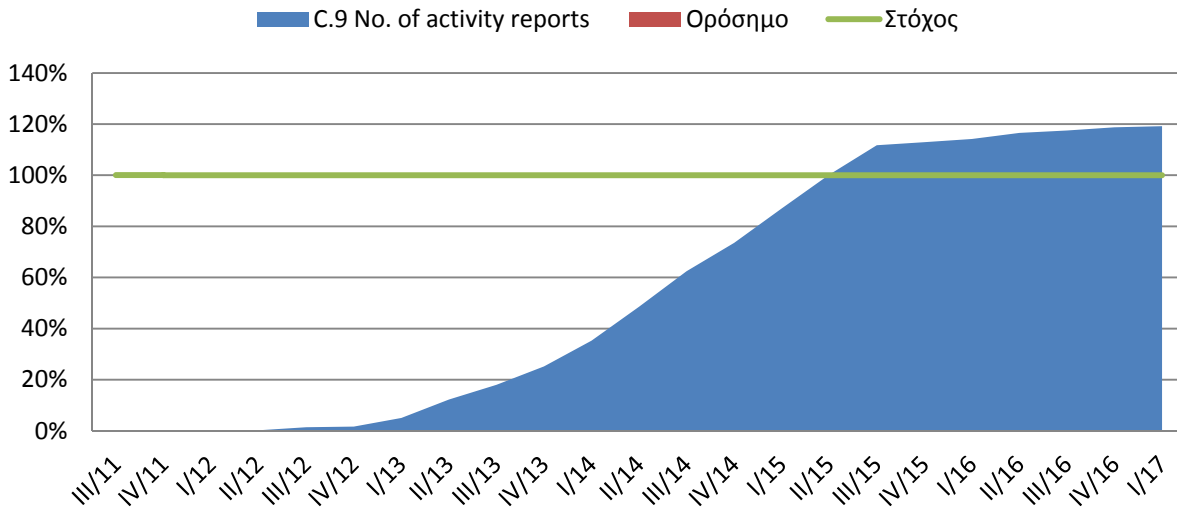


Πρόοδος Δείκτη Παρακολούθησης

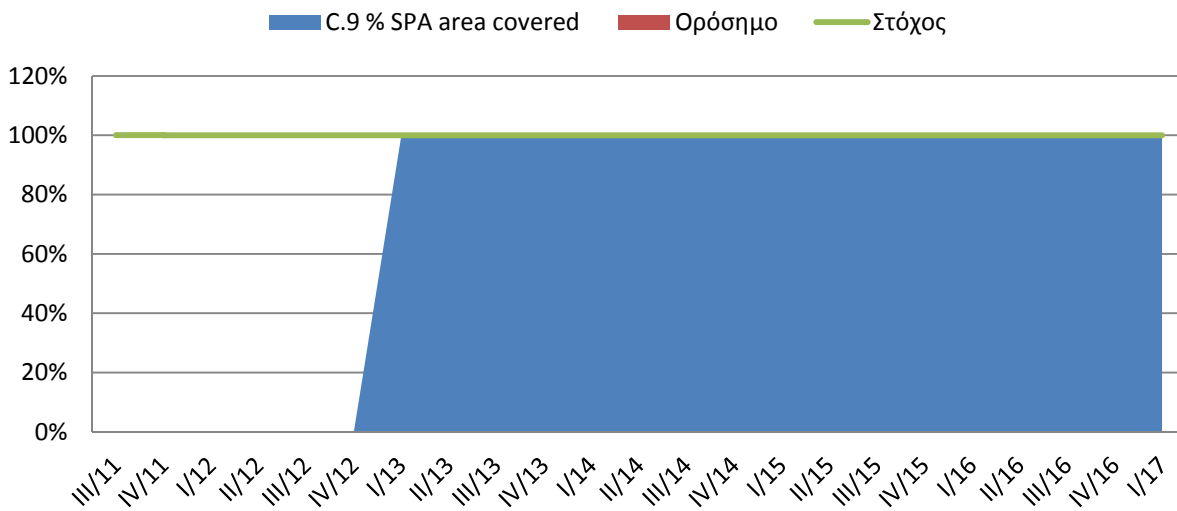


Πρόοδος Δείκτη Παρακολούθησης

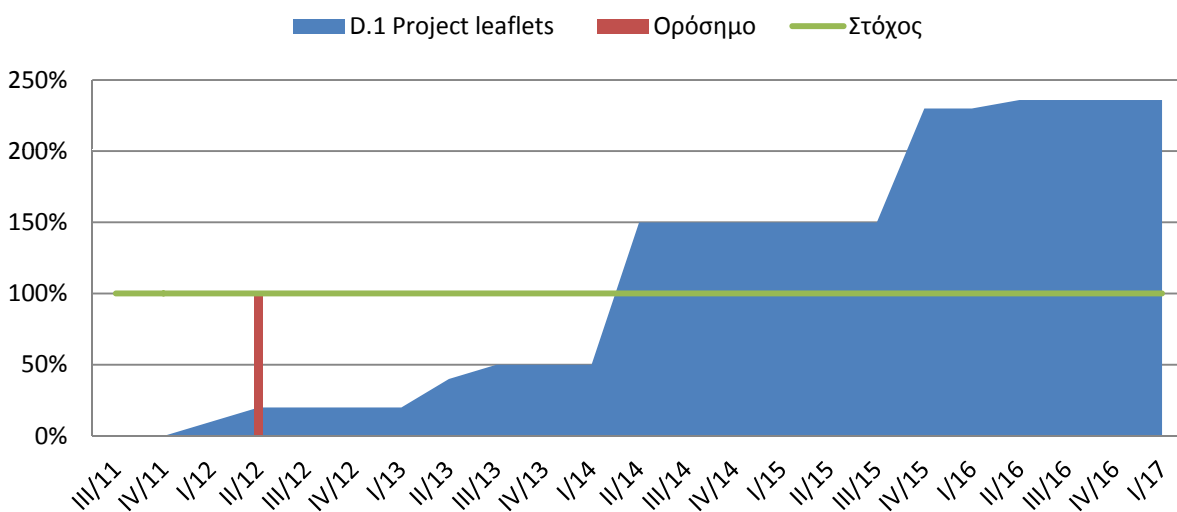


Πρόοδος Δείκτη Παρακολούθησης

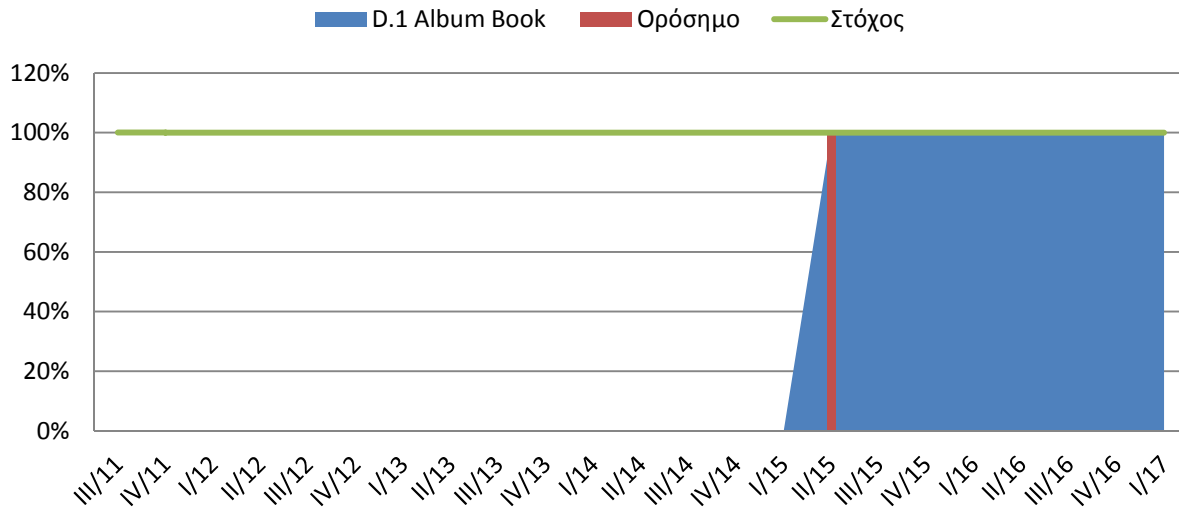


Πρόοδος Δείκτη Παρακολούθησης

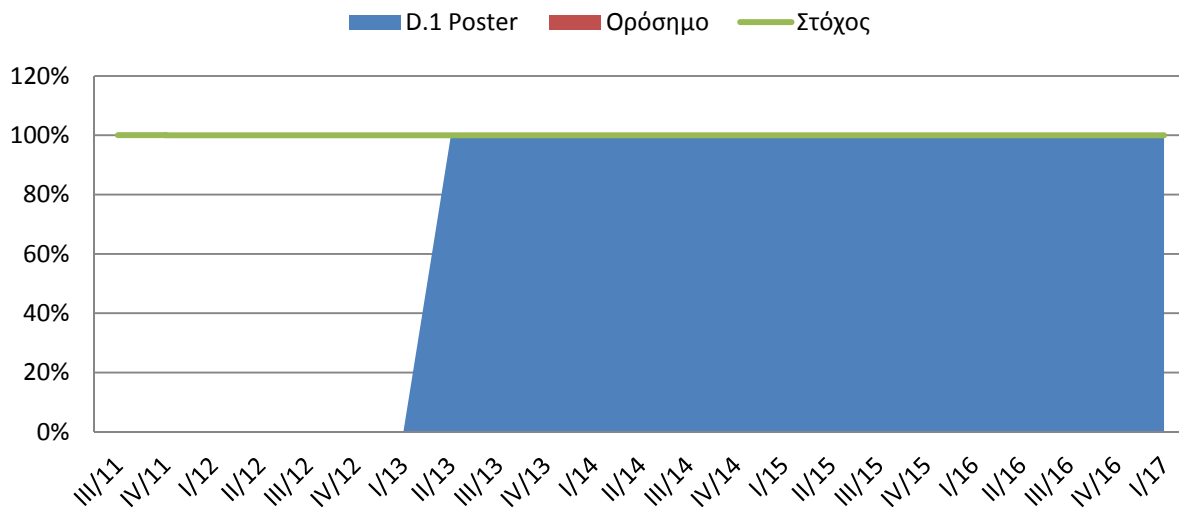


Πρόοδος Δείκτη Παρακολούθησης

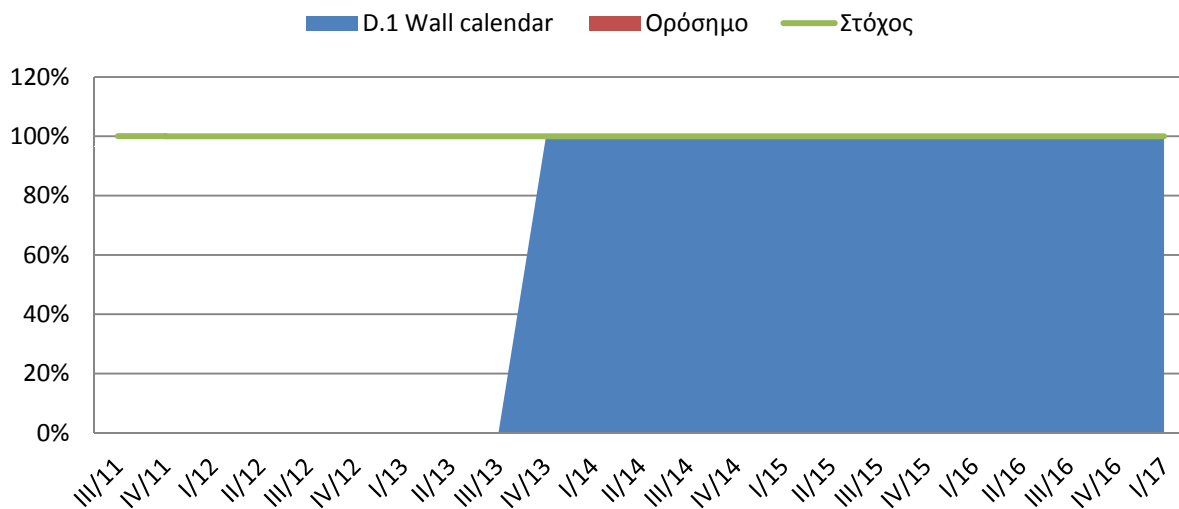


Πρόοδος Δείκτη Παρακολούθησης

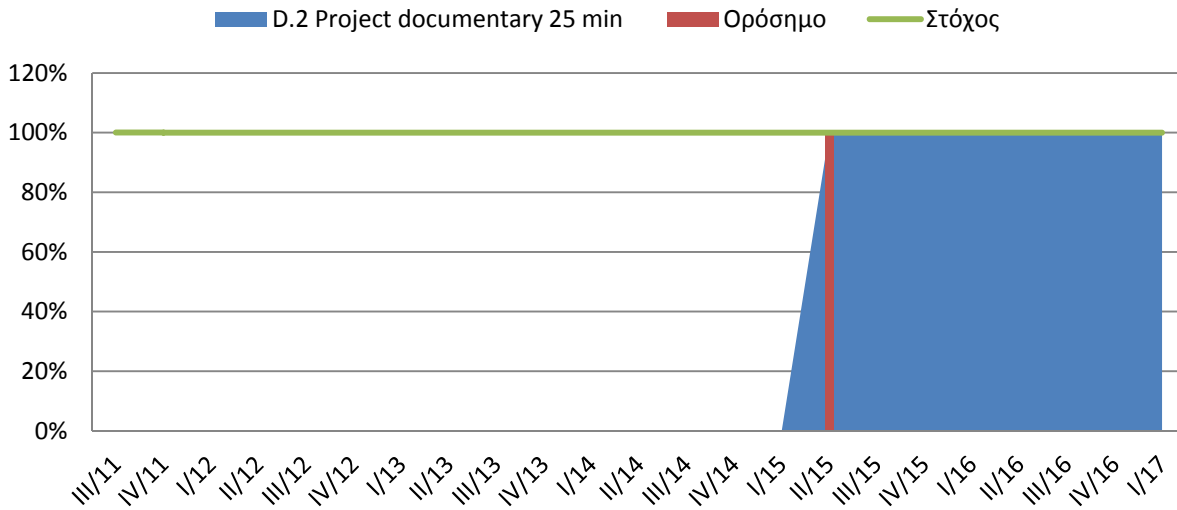


Πρόοδος Δείκτη Παρακολούθησης

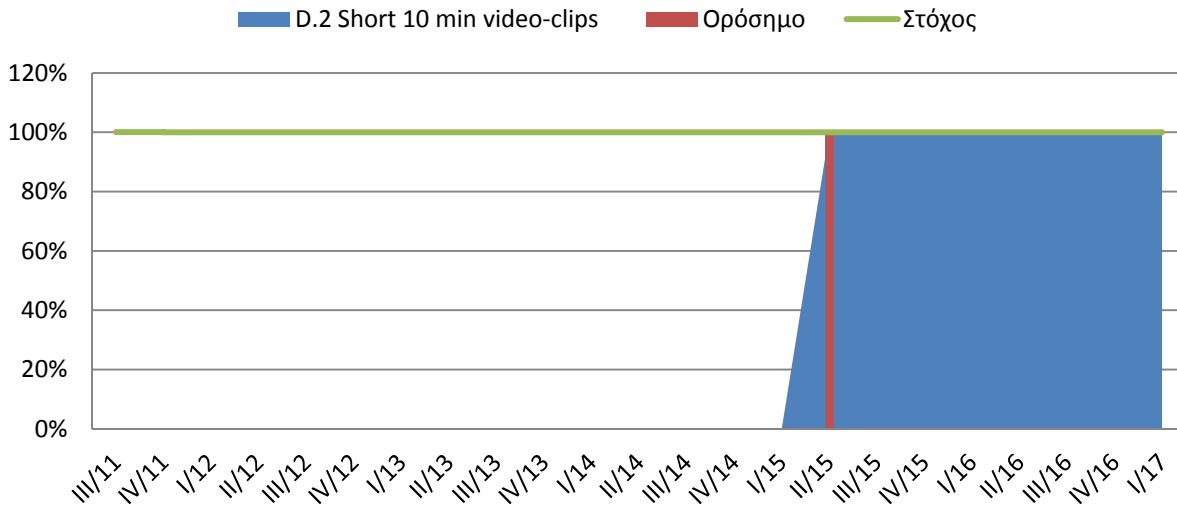


Πρόοδος Δείκτη Παρακολούθησης

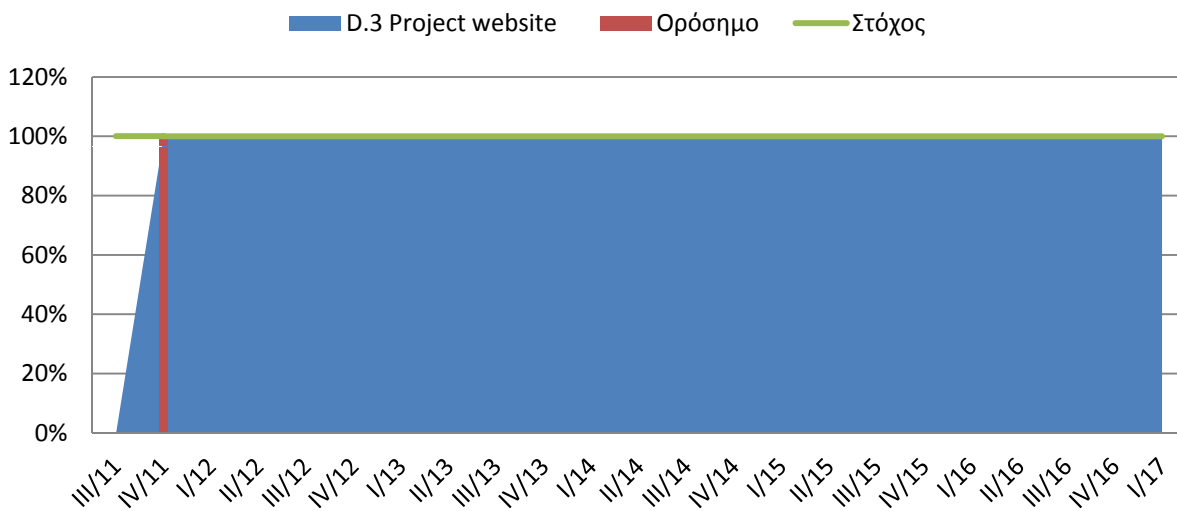


Πρόοδος Δείκτη Παρακολούθησης

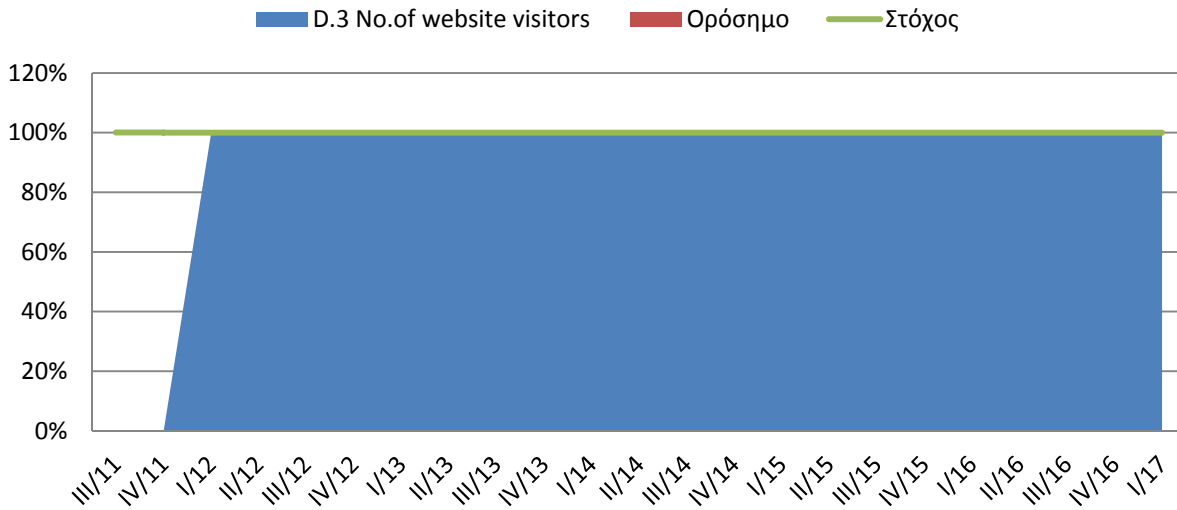


Πρόοδος Δείκτη Παρακολούθησης

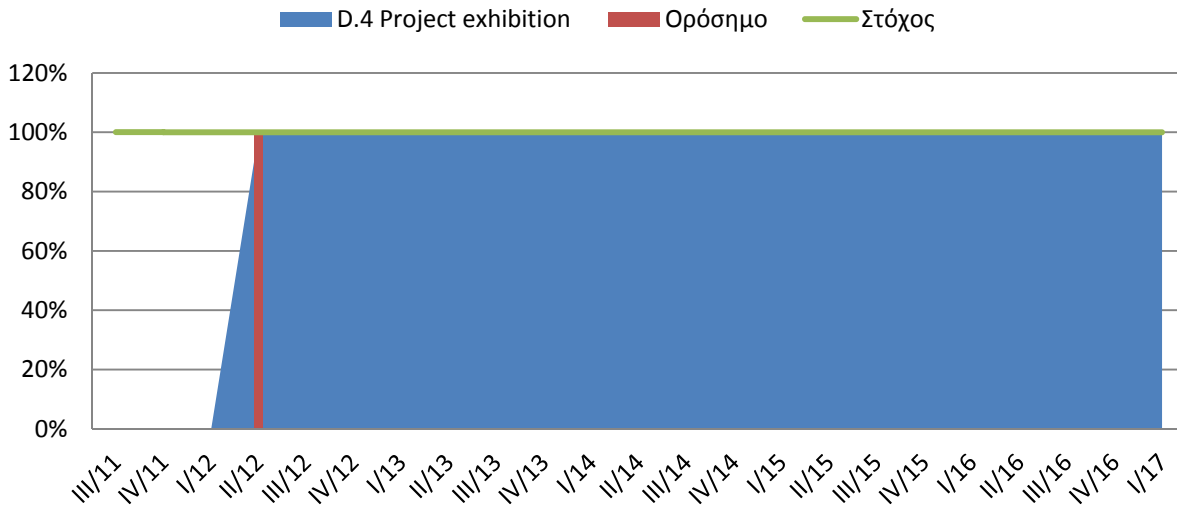


Πρόοδος Δείκτη Παρακολούθησης

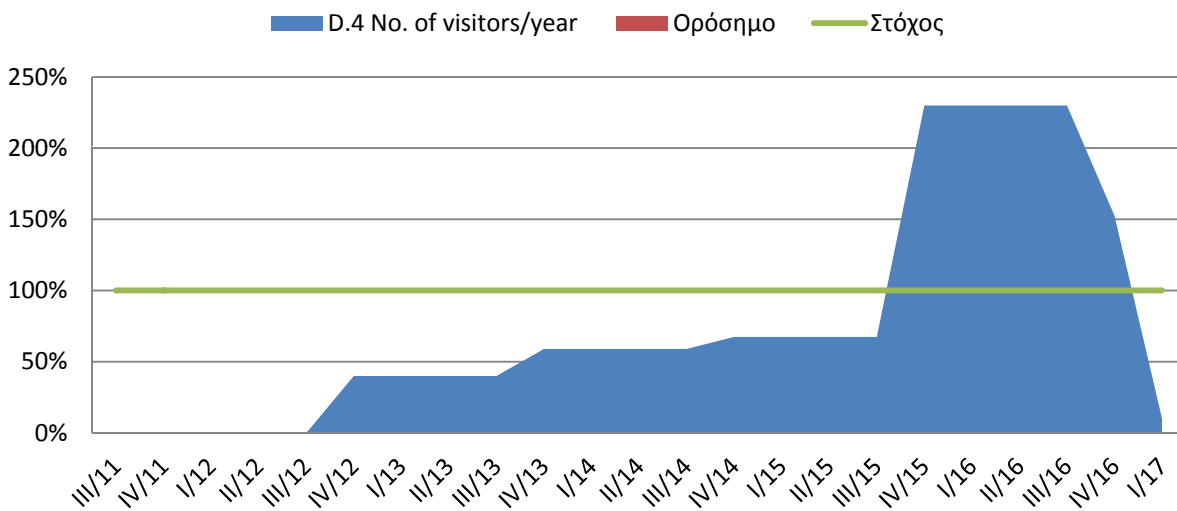


Πρόοδος Δείκτη Παρακολούθησης

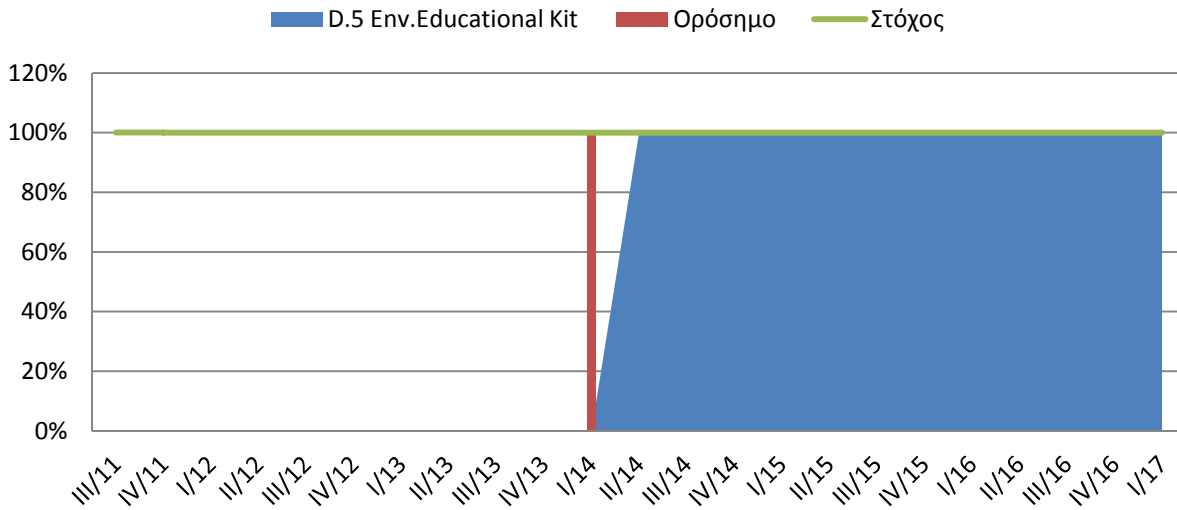


Πρόοδος Δείκτη Παρακολούθησης

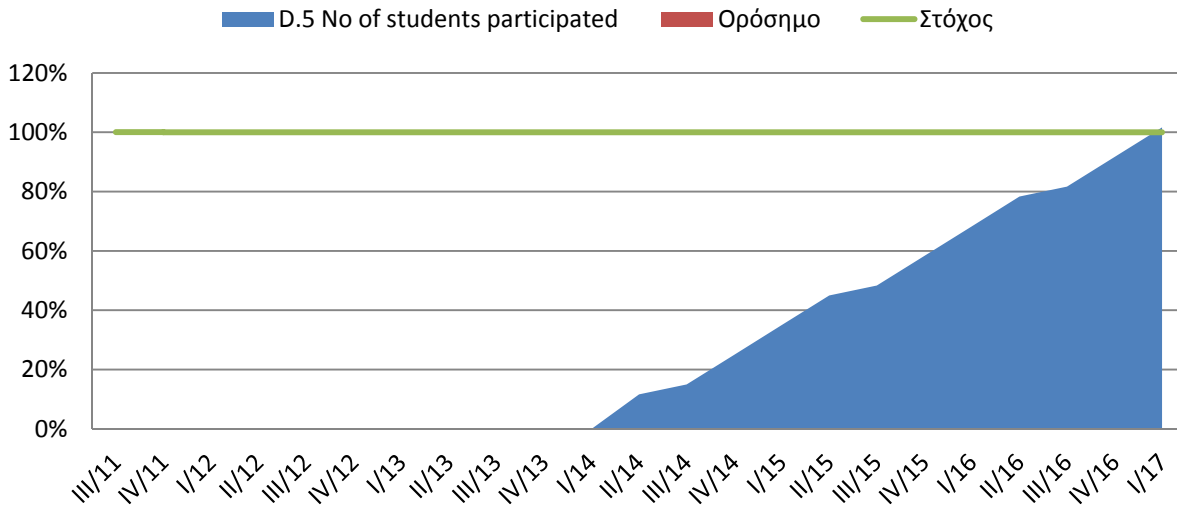


Πρόοδος Δείκτη Παρακολούθησης

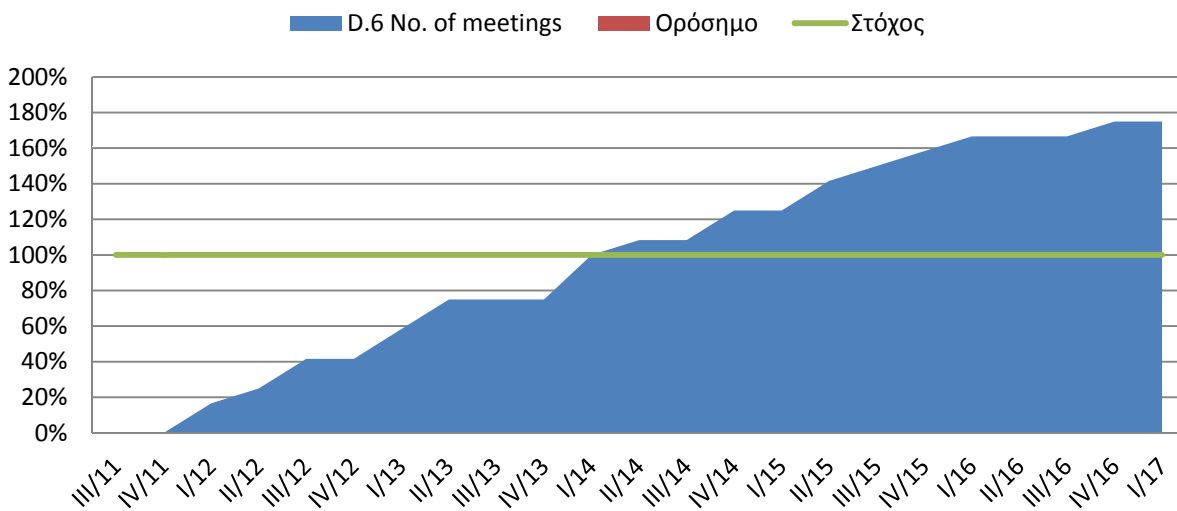


Πρόοδος Δείκτη Παρακολούθησης

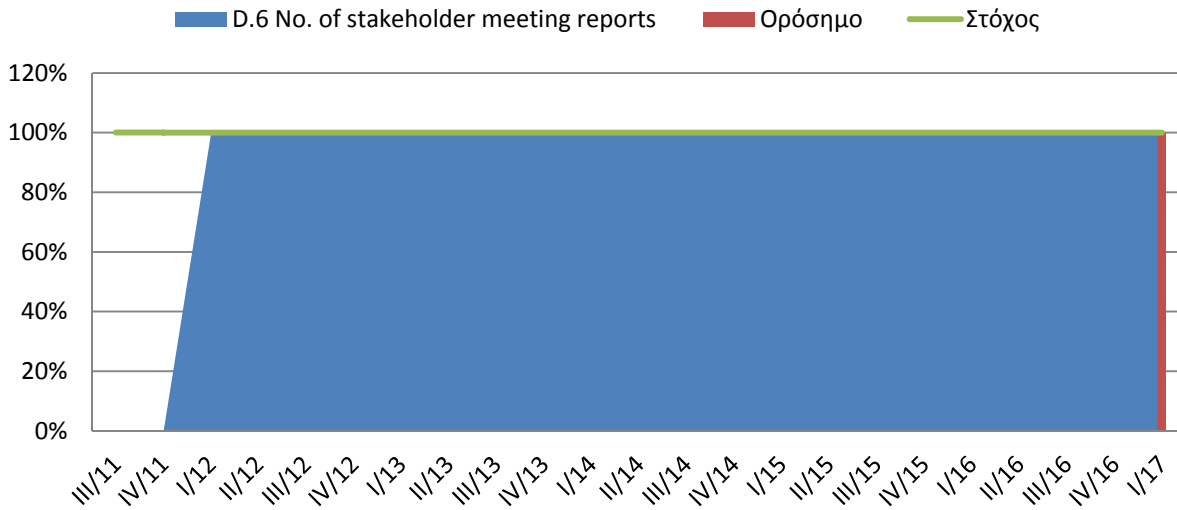


Πρόοδος Δείκτη Παρακολούθησης

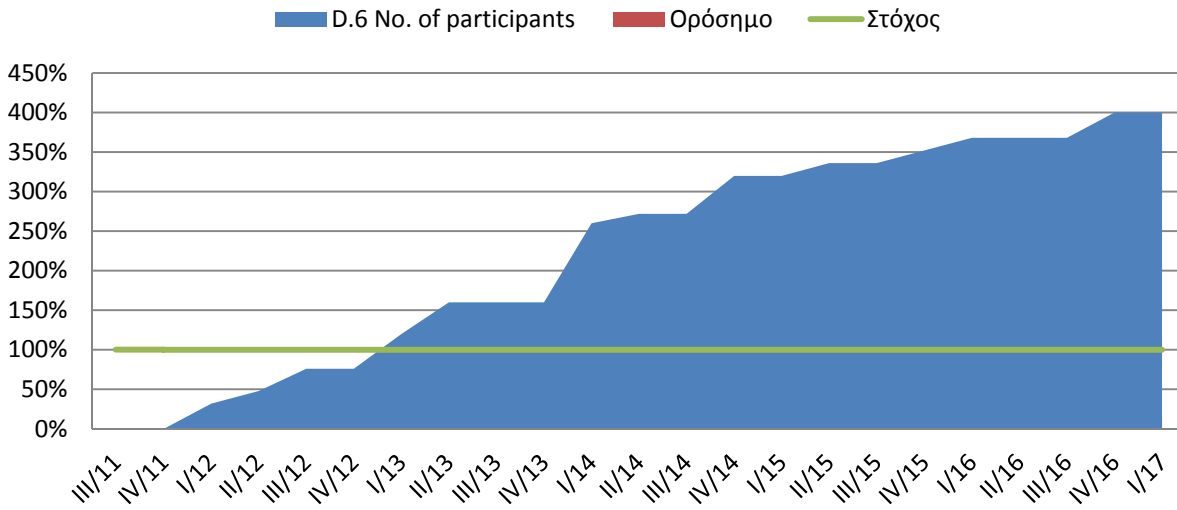


Πρόοδος Δείκτη Παρακολούθησης

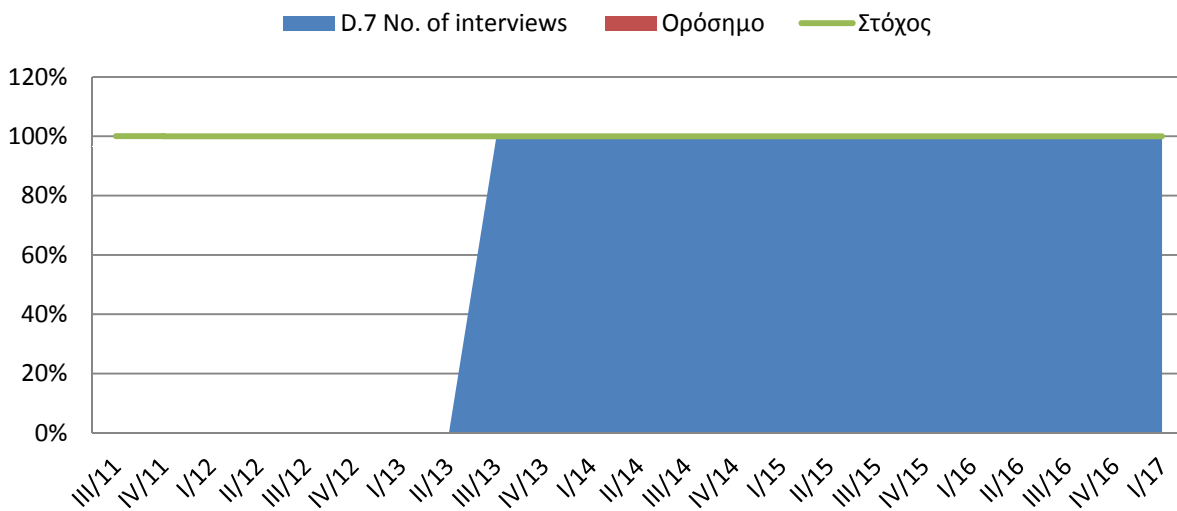


Πρόοδος Δείκτη Παρακολούθησης

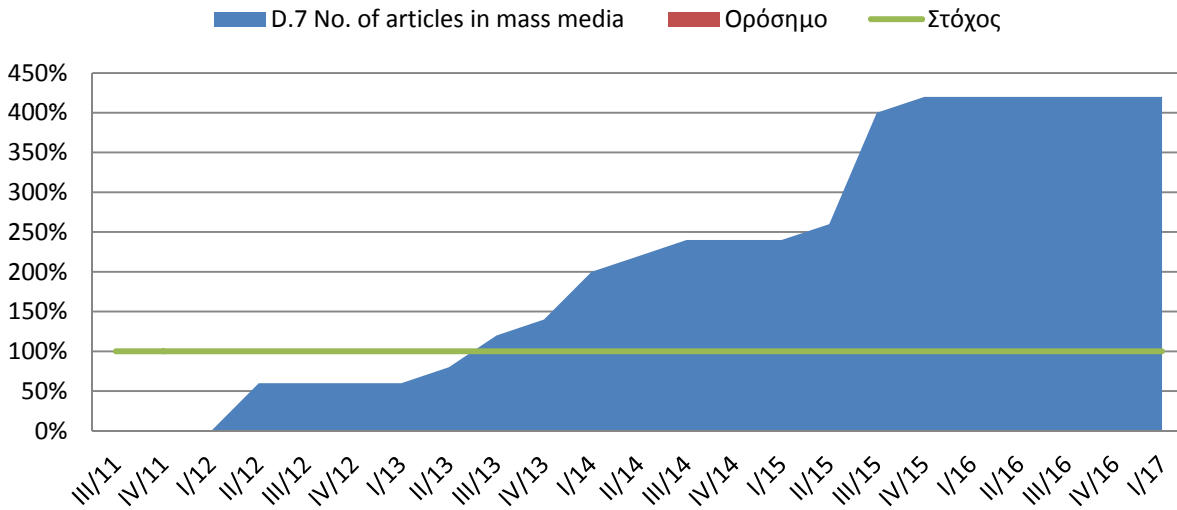


Πρόοδος Δείκτη Παρακολούθησης

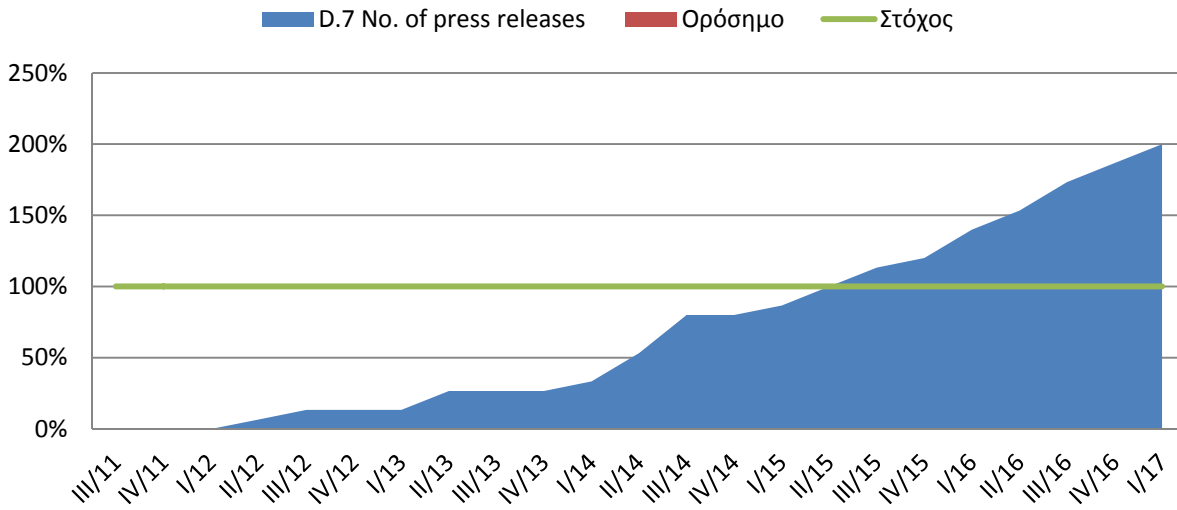


Πρόοδος Δείκτη Παρακολούθησης

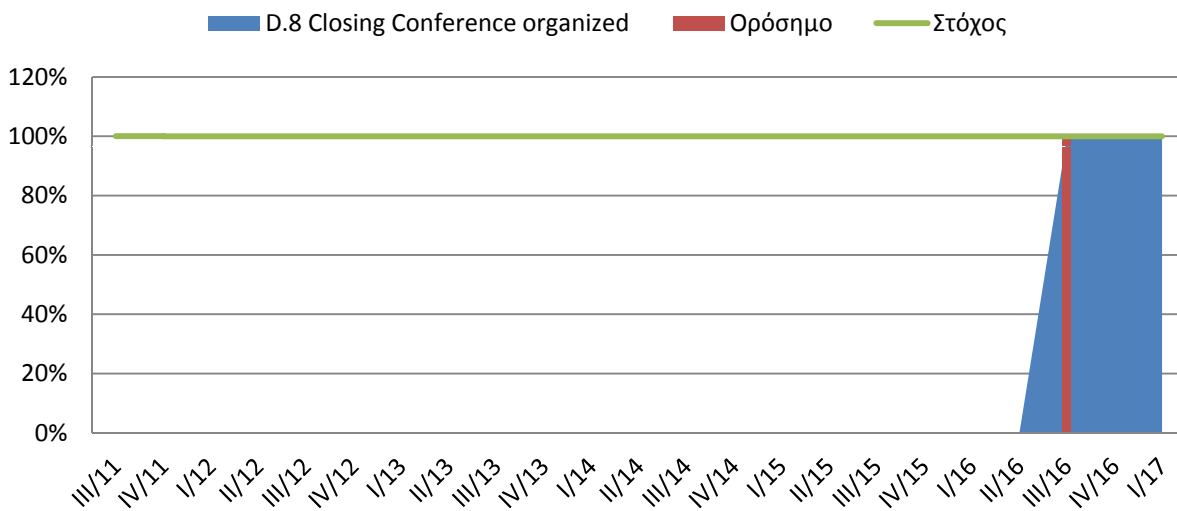


Πρόοδος Δείκτη Παρακολούθησης

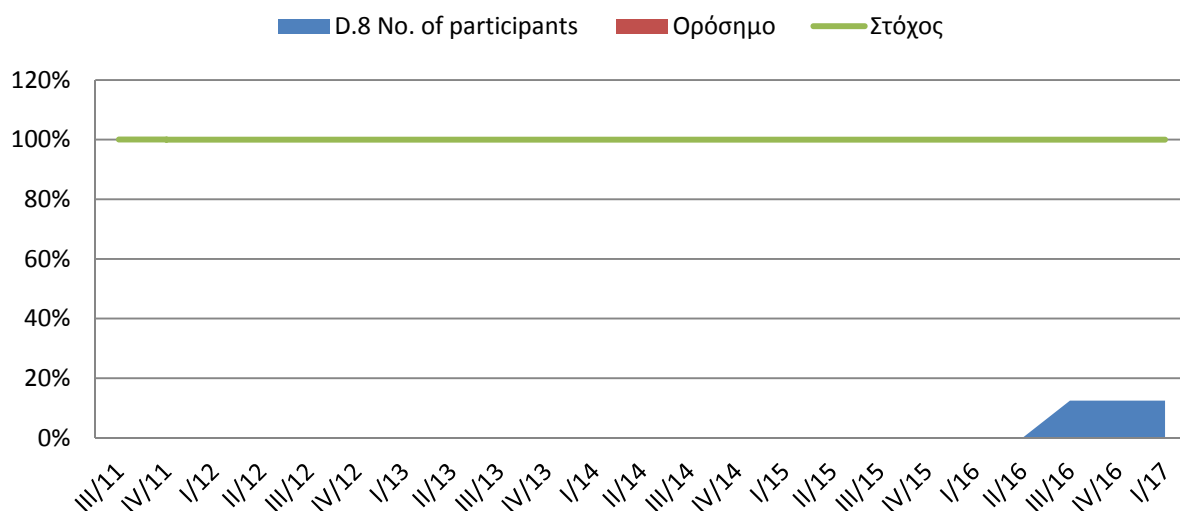


Πρόοδος Δείκτη Παρακολούθησης

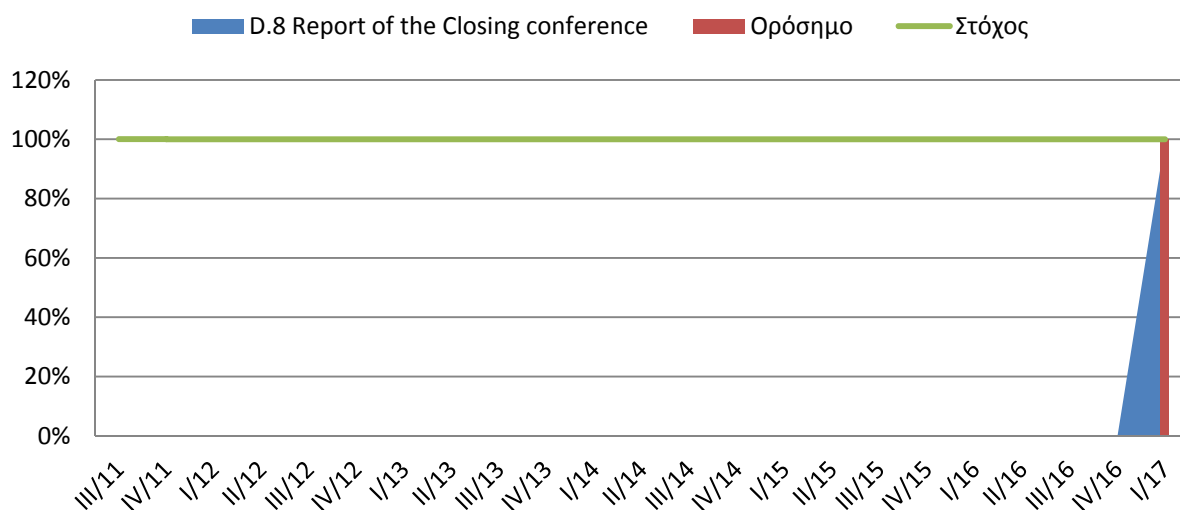


Πρόοδος Δείκτη Παρακολούθησης

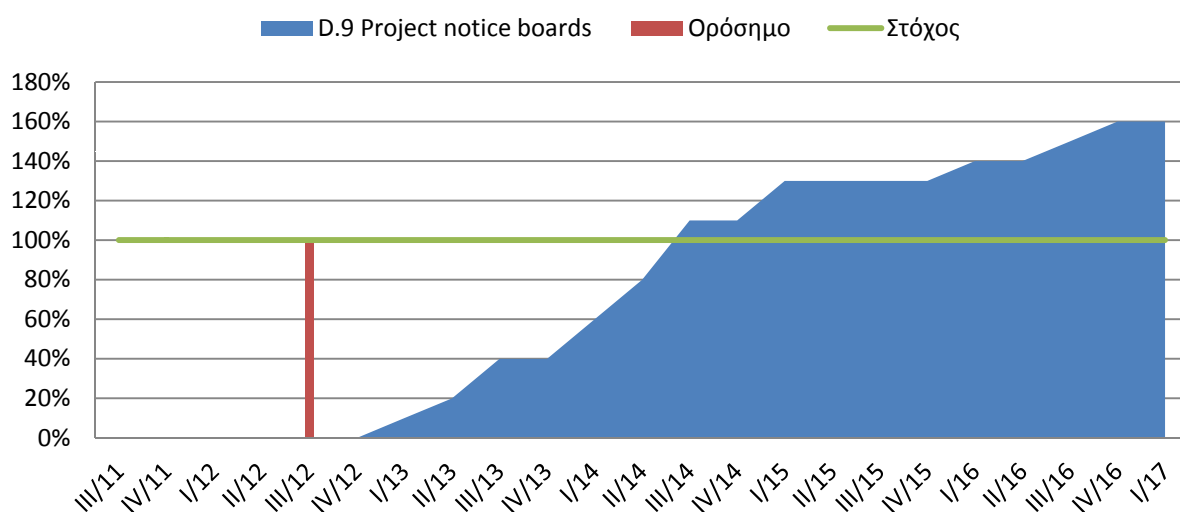


Πρόοδος Δείκτη Παρακολούθησης

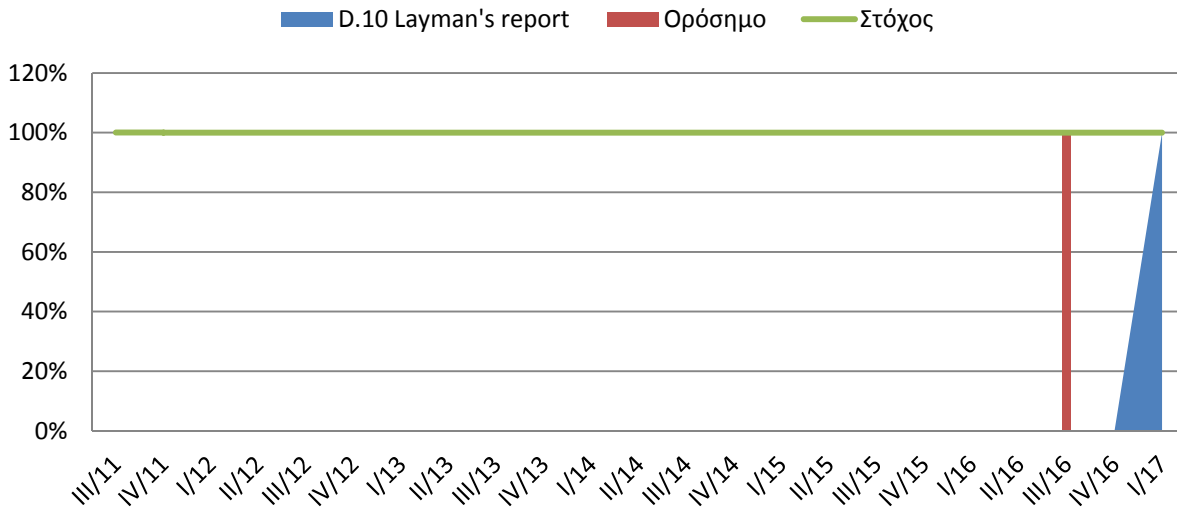


Πρόοδος Δείκτη Παρακολούθησης

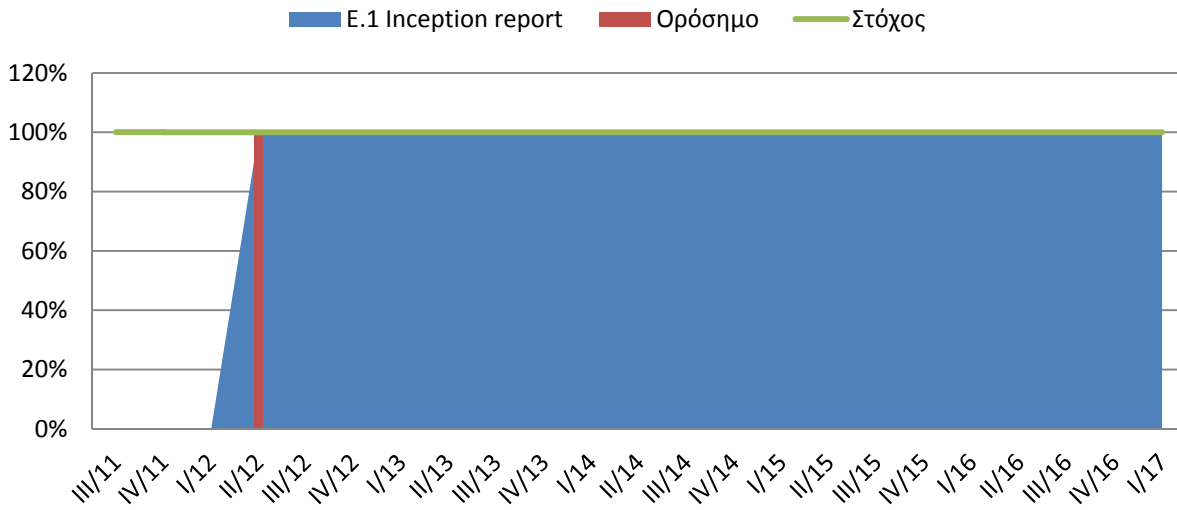


Πρόοδος Δείκτη Παρακολούθησης

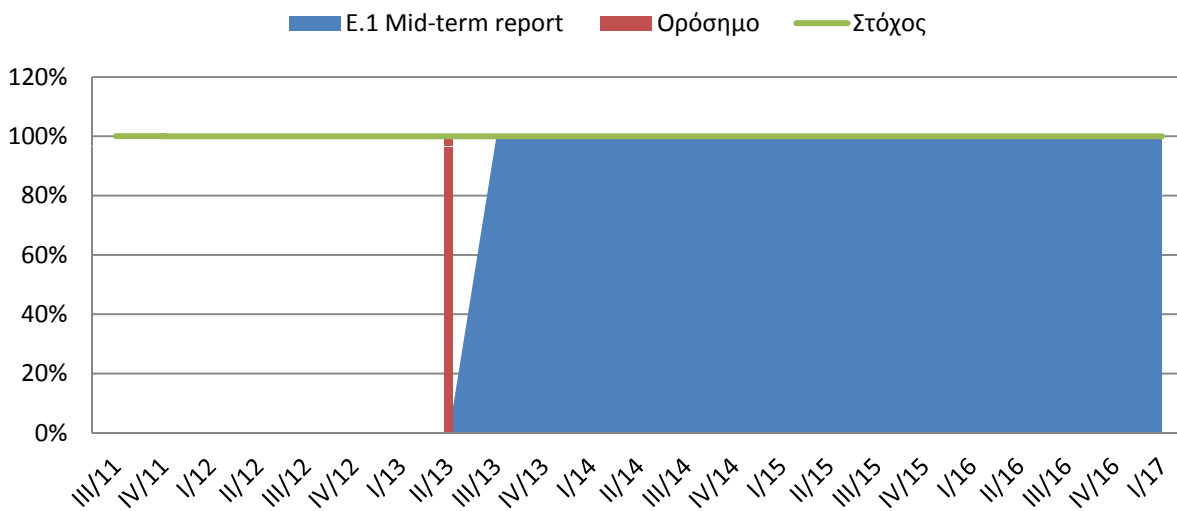


Πρόοδος Δείκτη Παρακολούθησης

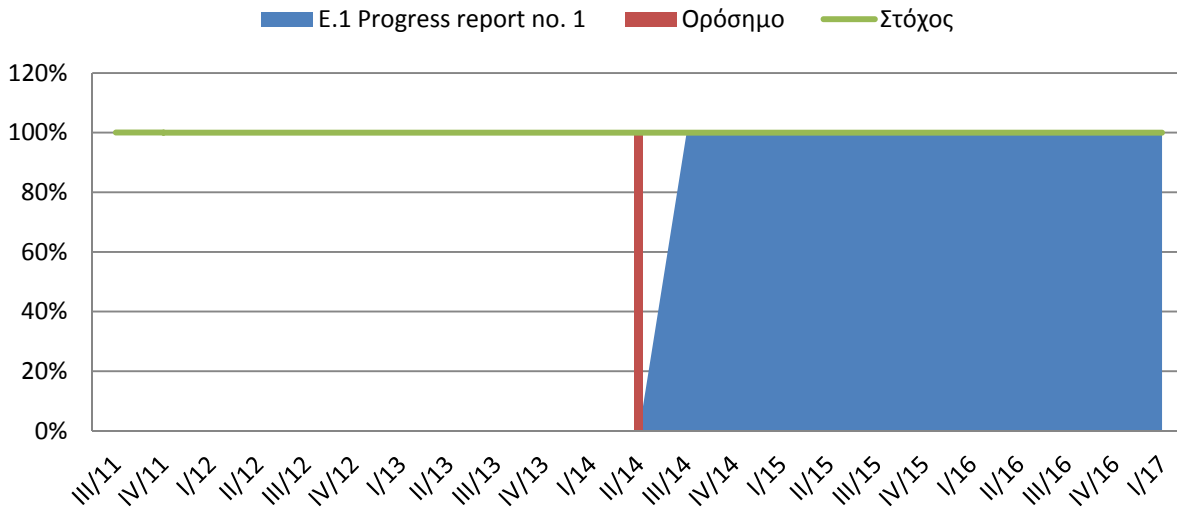


Πρόοδος Δείκτη Παρακολούθησης

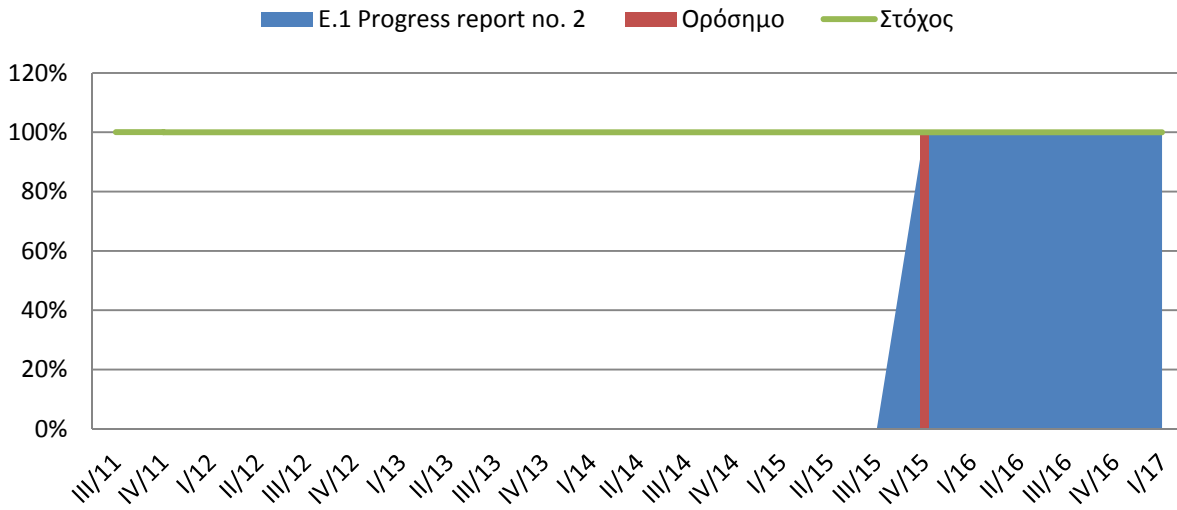


Πρόοδος Δείκτη Παρακολούθησης

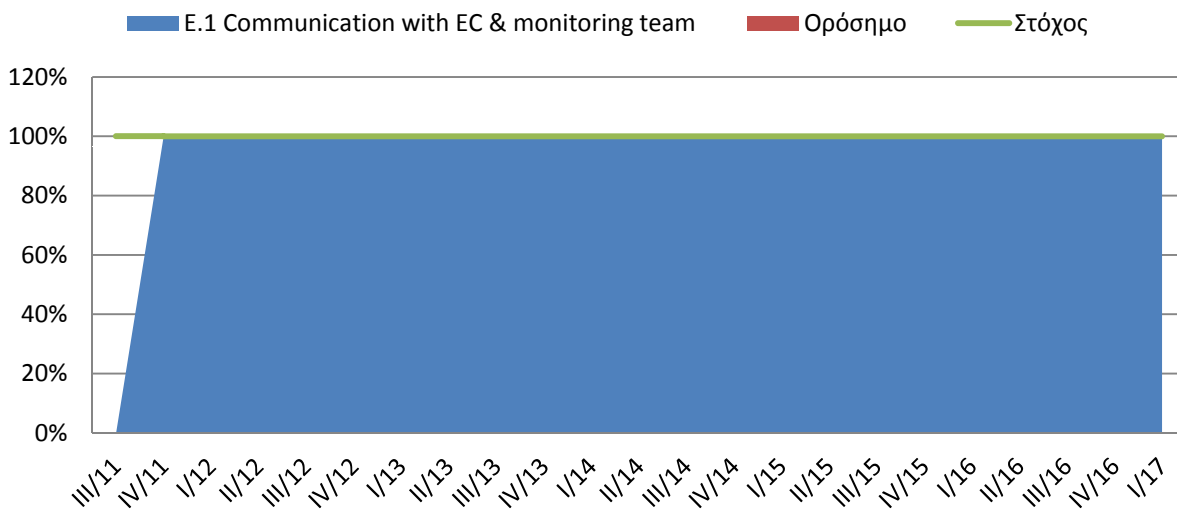


Πρόοδος Δείκτη Παρακολούθησης

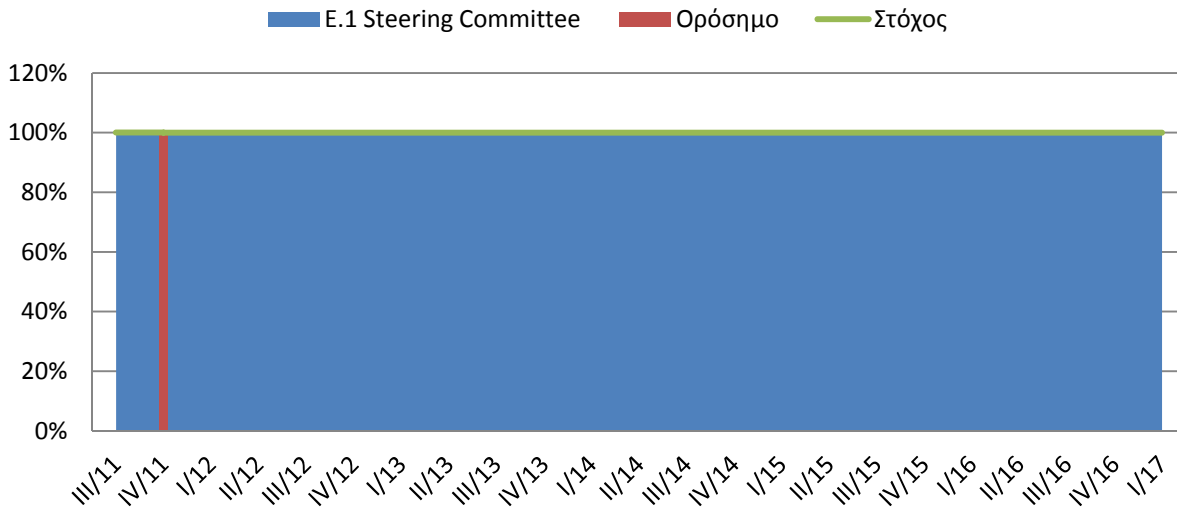


Πρόοδος Δείκτη Παρακολούθησης

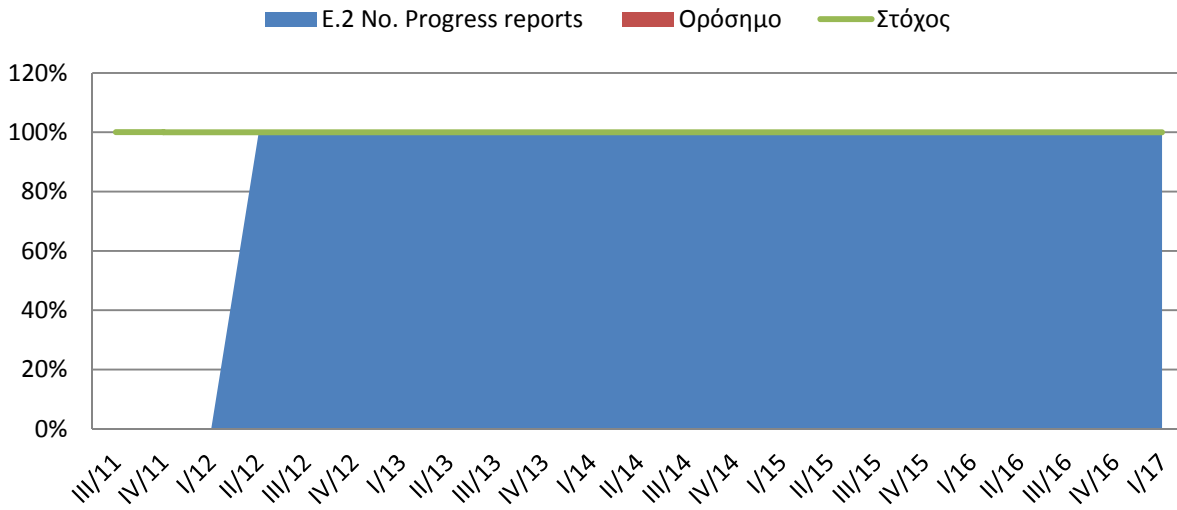

Πρόοδος Δείκτη Παρακολούθησης

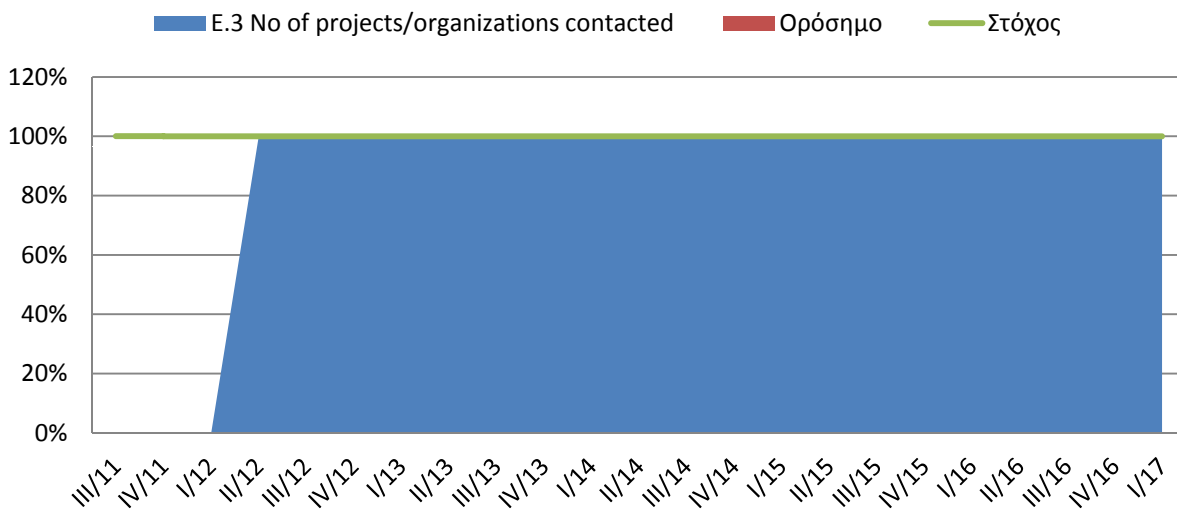


Πρόοδος Δείκτη Παρακολούθησης

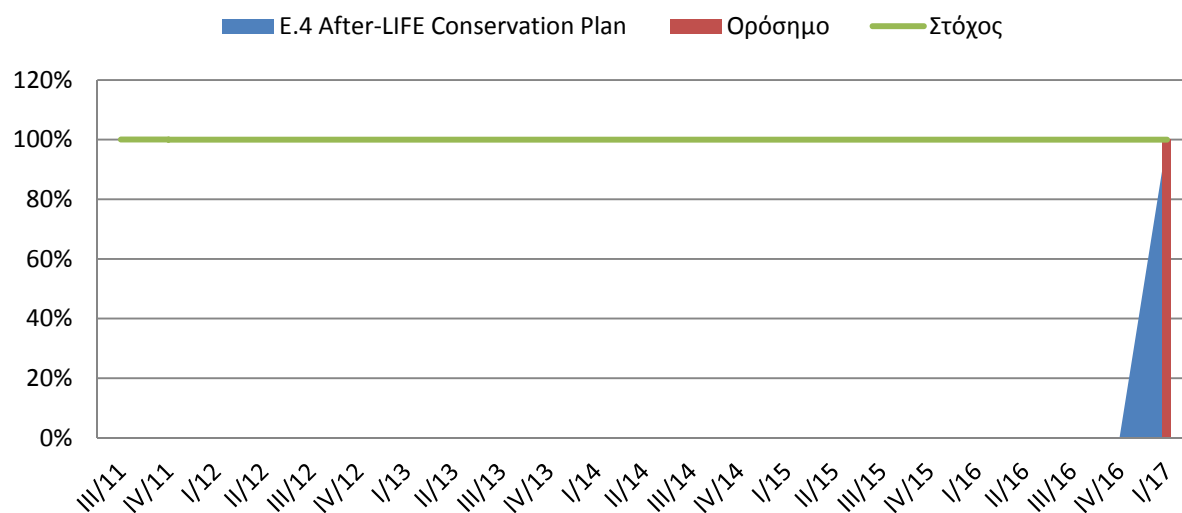


5.4 Παράρτημα IV: Εξέλιξη δράσεων του προγράμματος

Πρόοδος των δράσεων του προγράμματος


Πρόοδος της δράσης

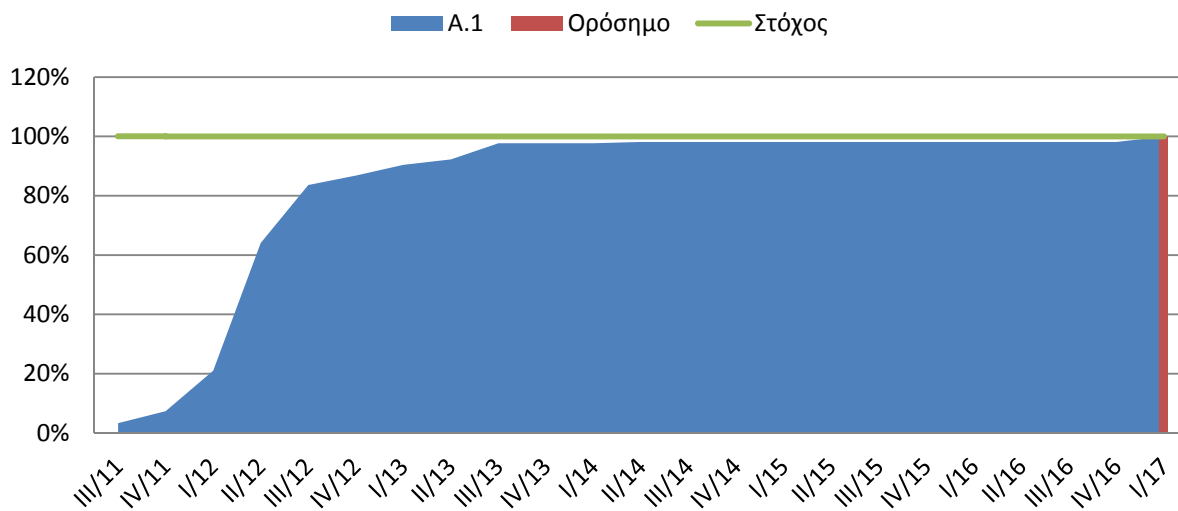


Πρόοδος της δράσης

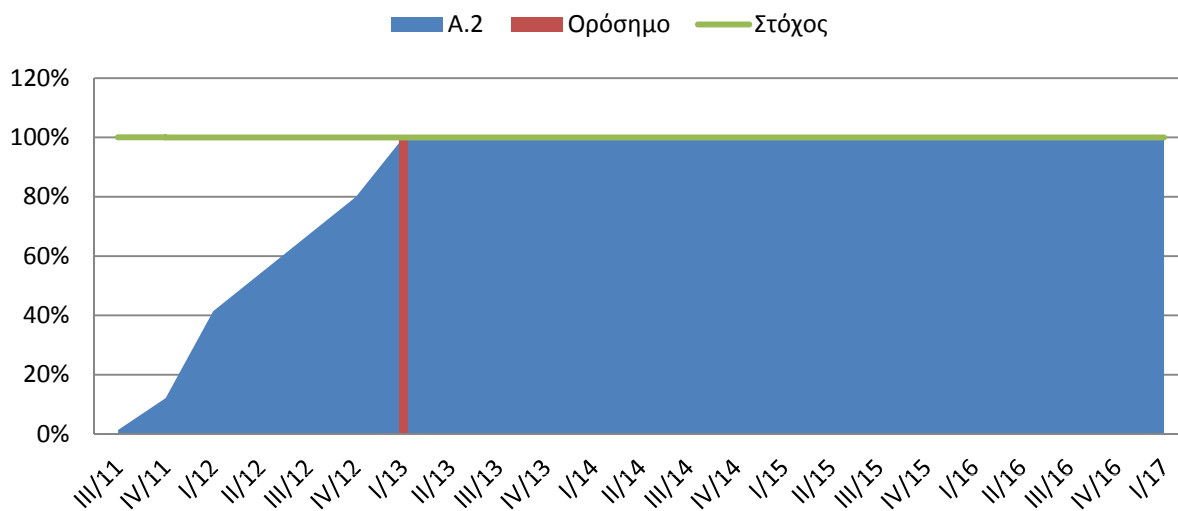


Πρόοδος της δράσης

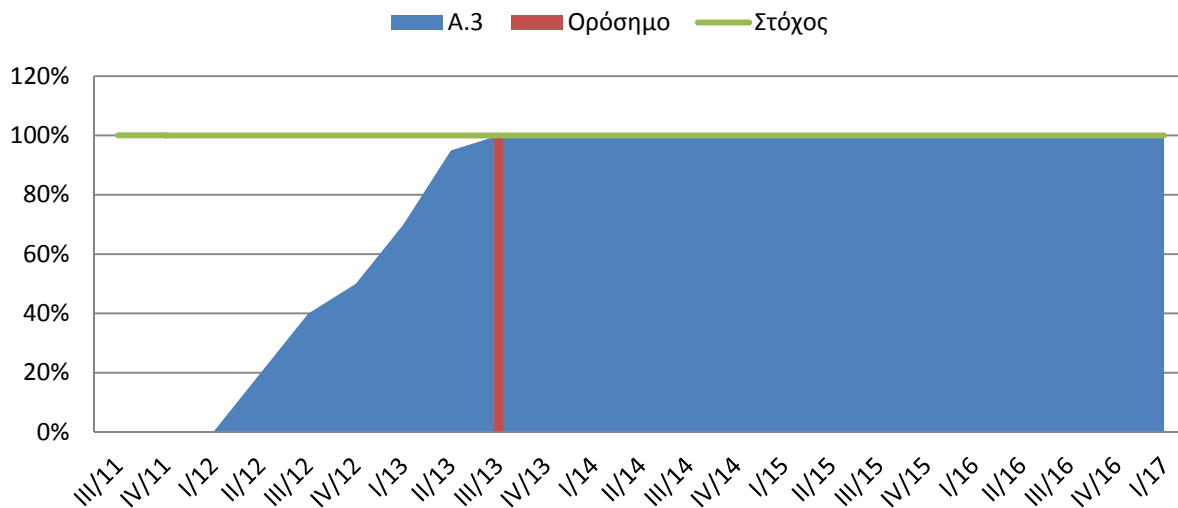


Πρόοδος της δράσης

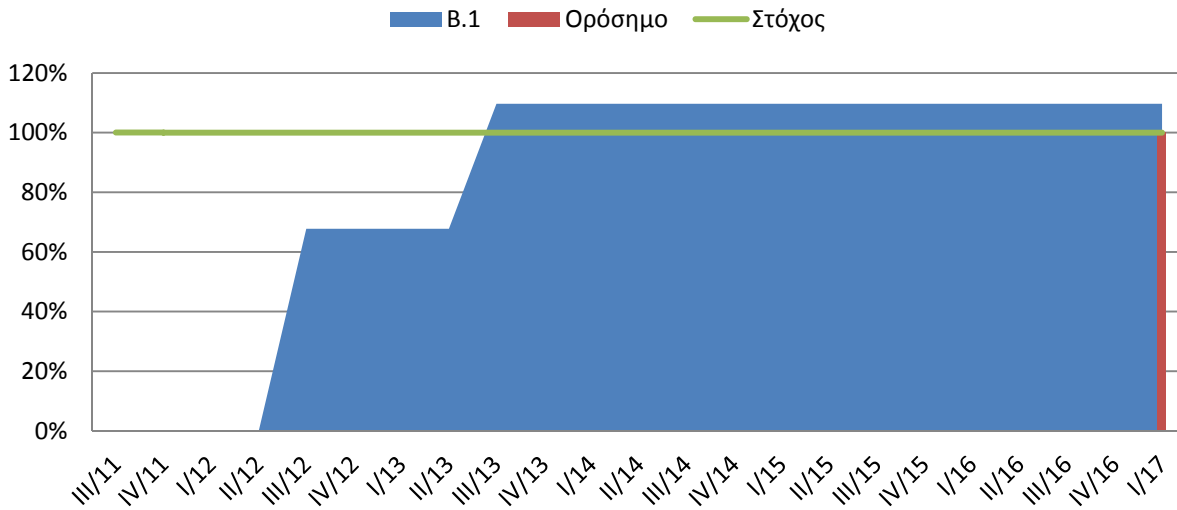


Πρόοδος της δράσης

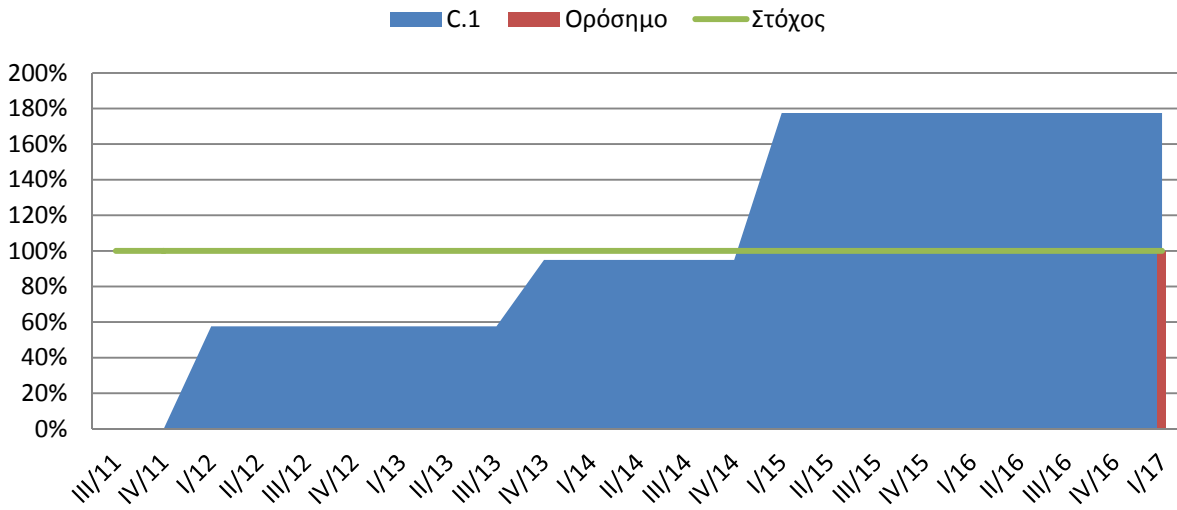


Πρόοδος της δράσης

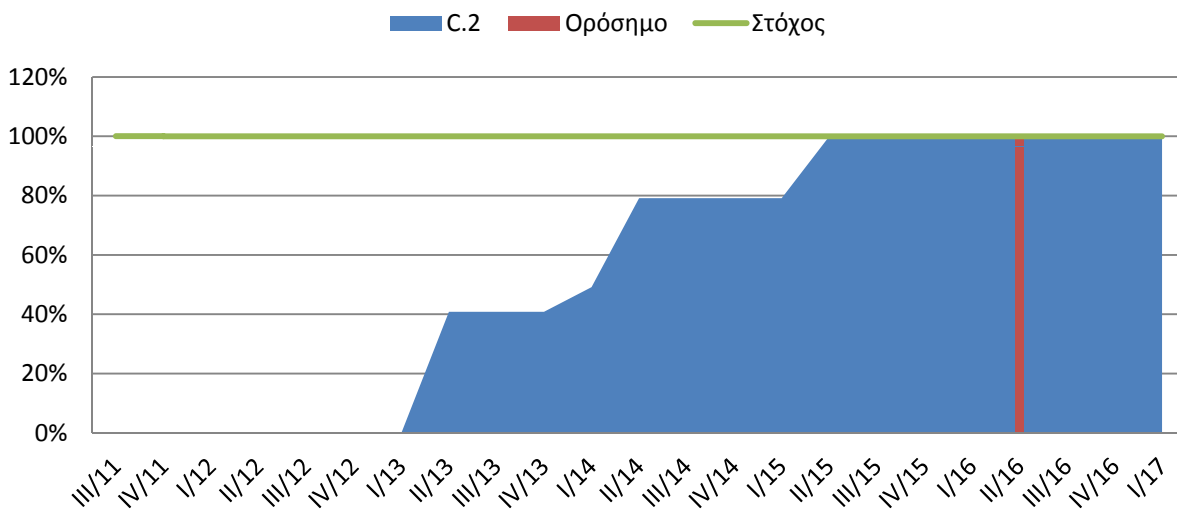


Πρόοδος της δράσης

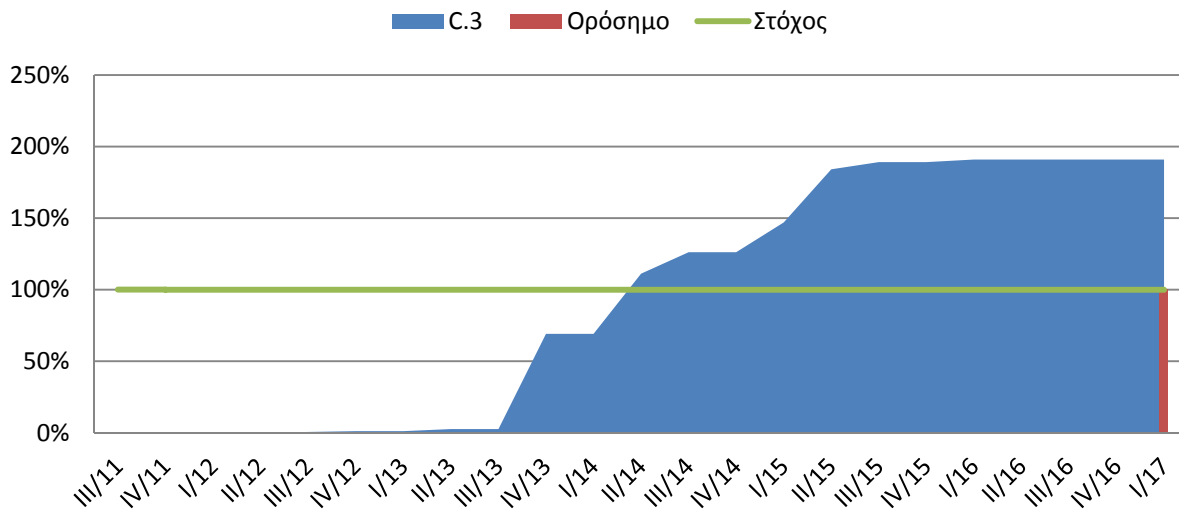


Πρόοδος της δράσης

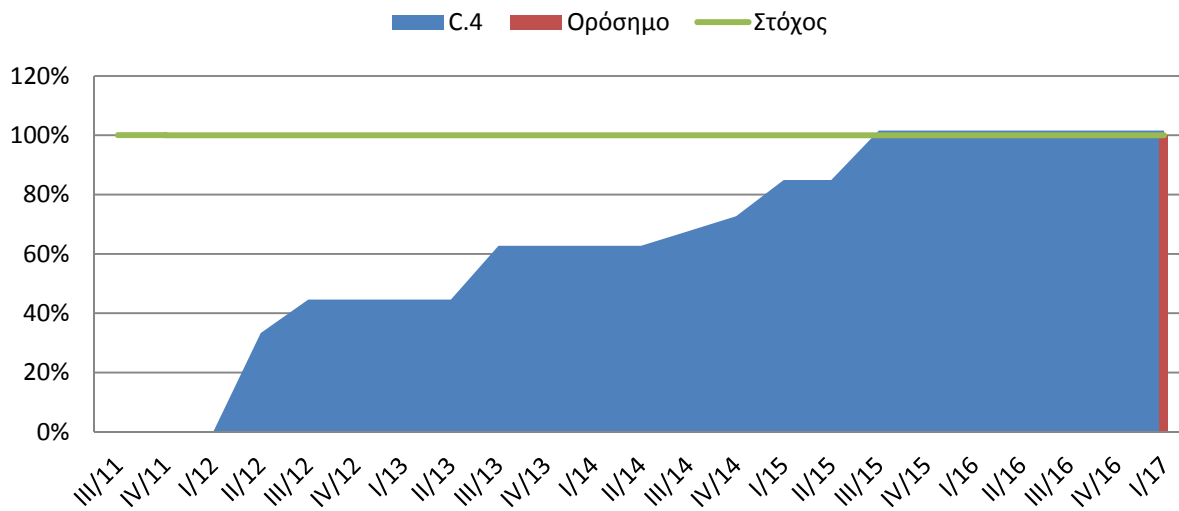


Πρόοδος της δράσης

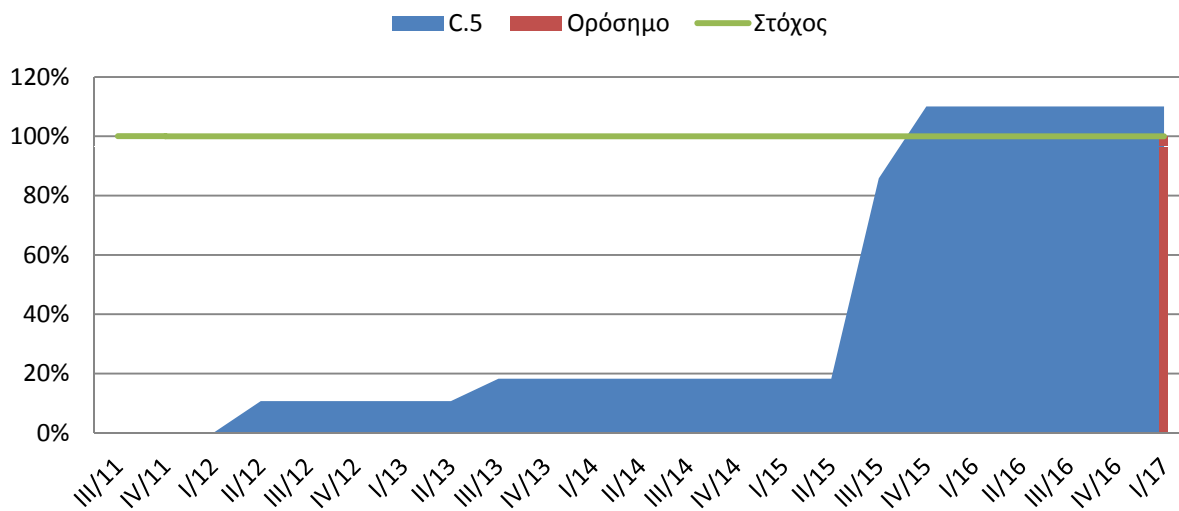


Πρόοδος της δράσης

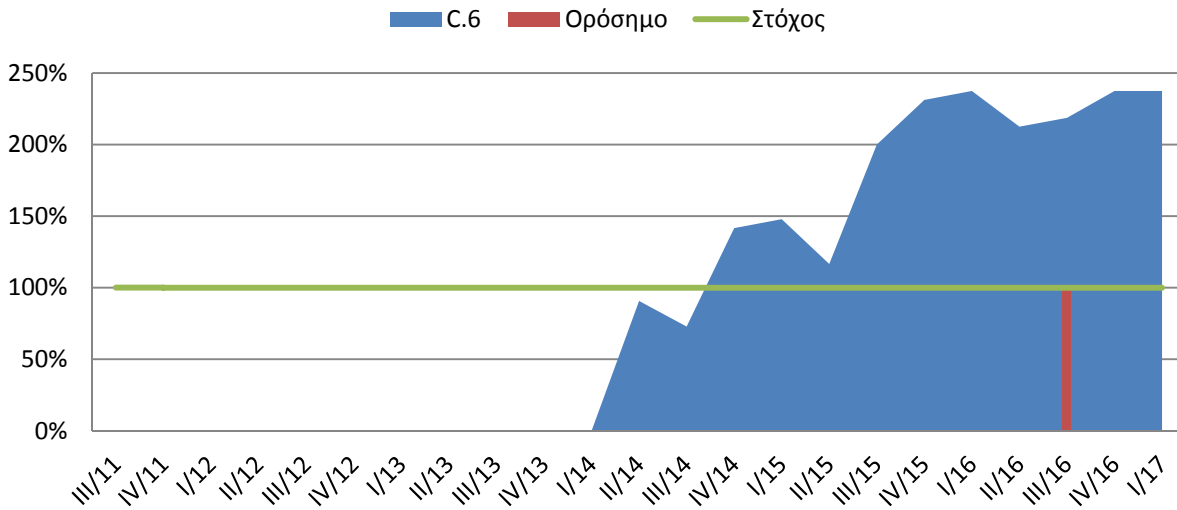


Πρόοδος της δράσης

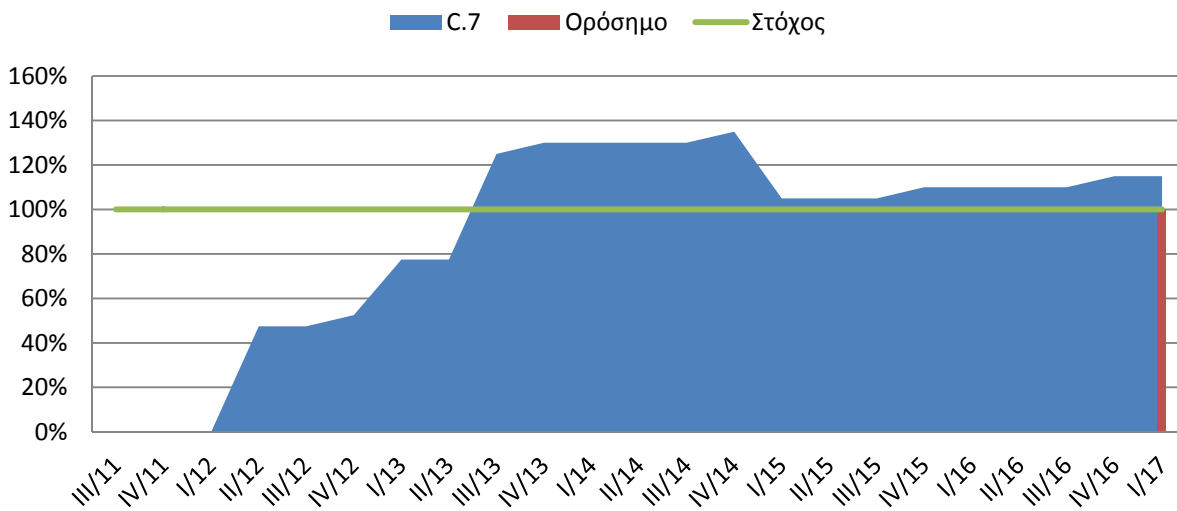


Πρόοδος της δράσης

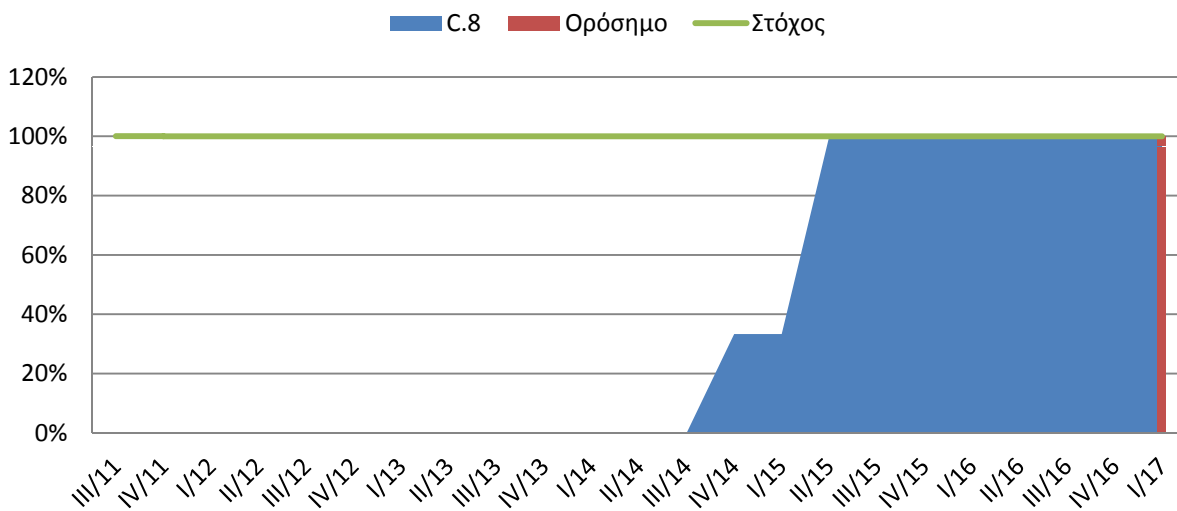


Πρόοδος της δράσης

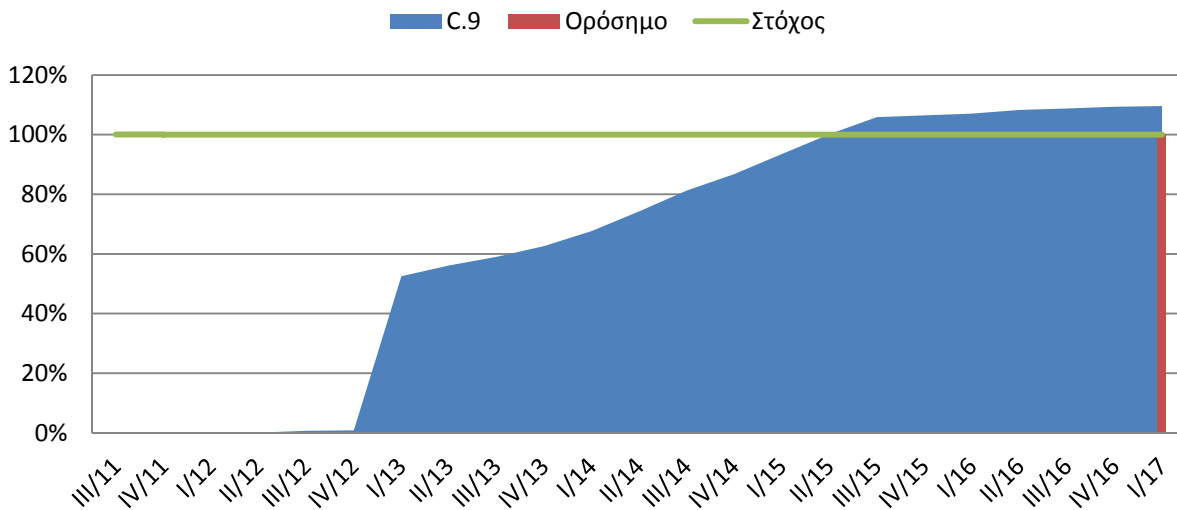


Πρόοδος της δράσης

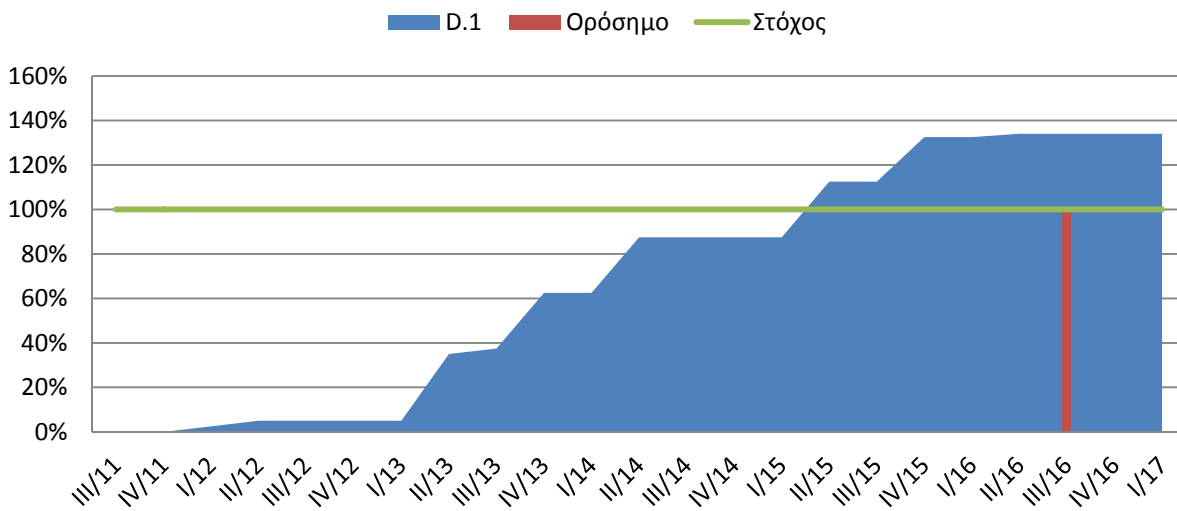


Πρόοδος της δράσης

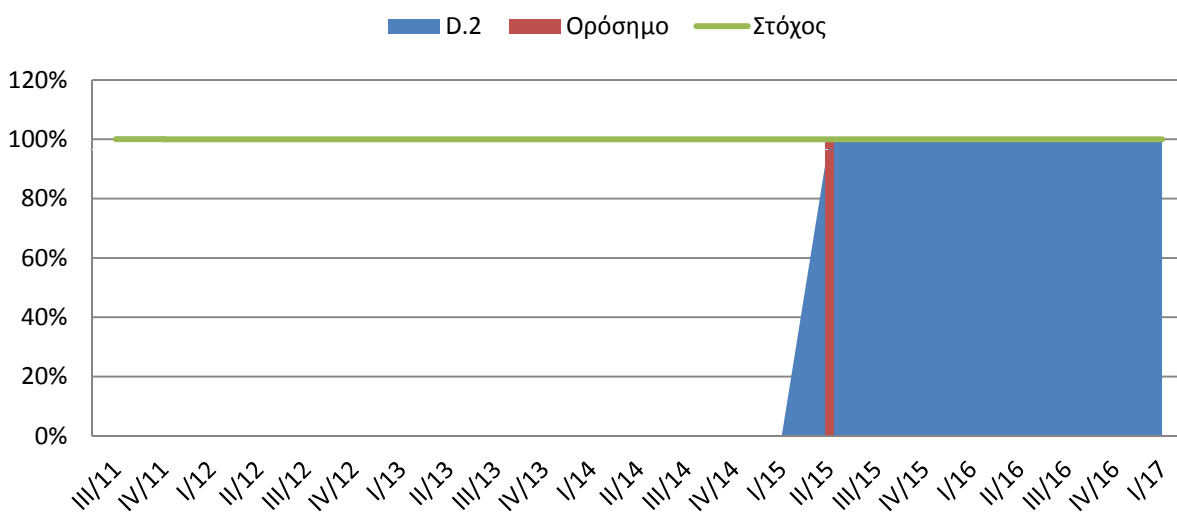


Πρόοδος της δράσης

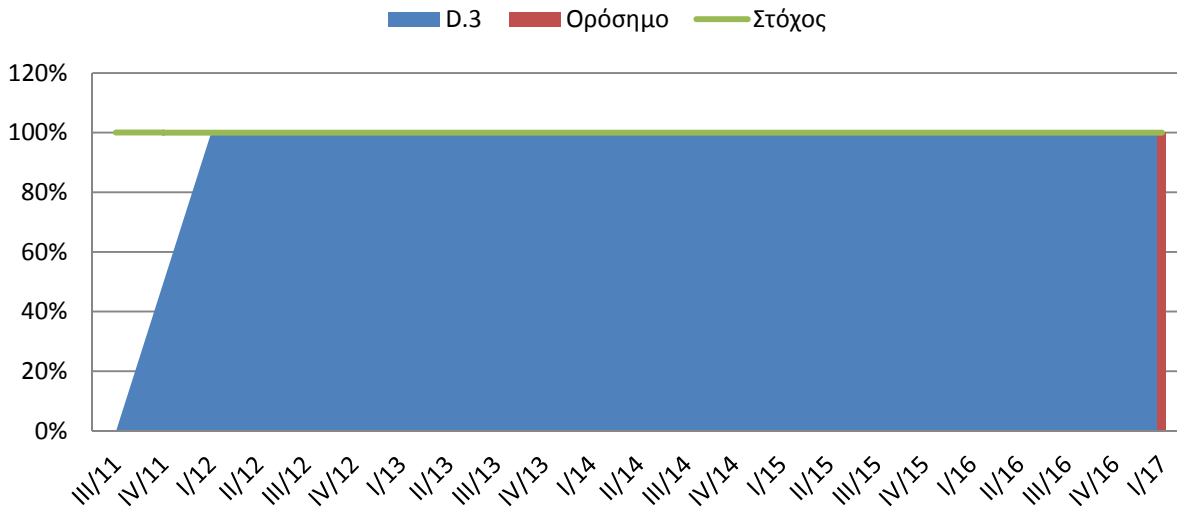


Πρόοδος της δράσης

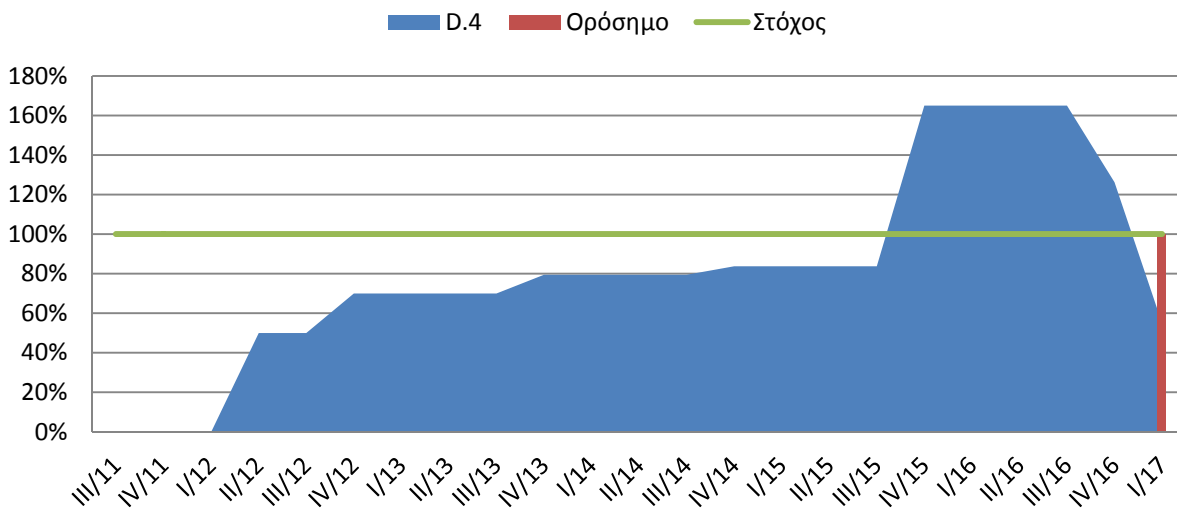


Πρόοδος της δράσης

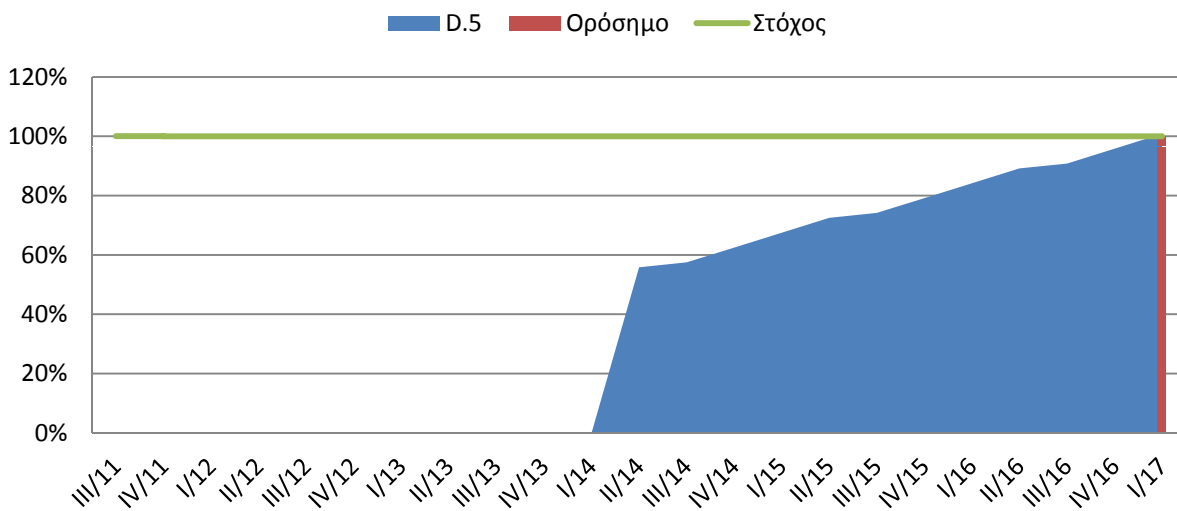


Πρόοδος της δράσης

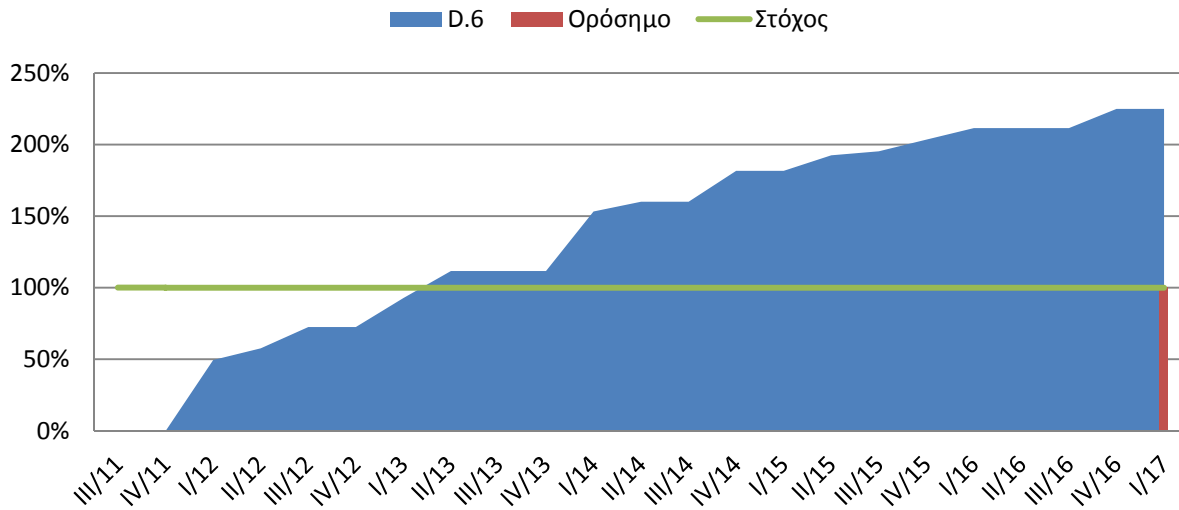


Πρόοδος της δράσης

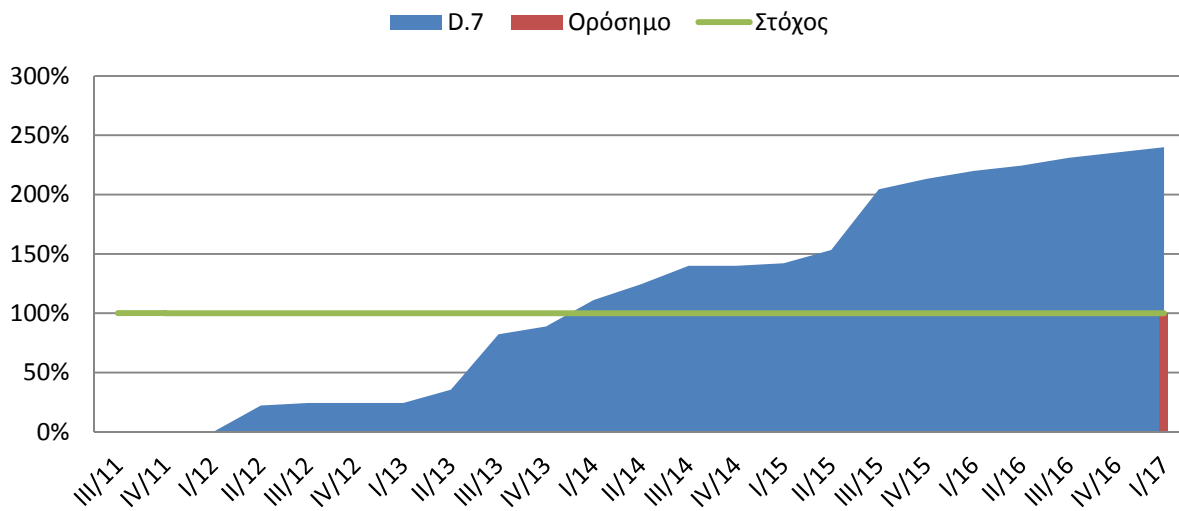


Πρόοδος της δράσης

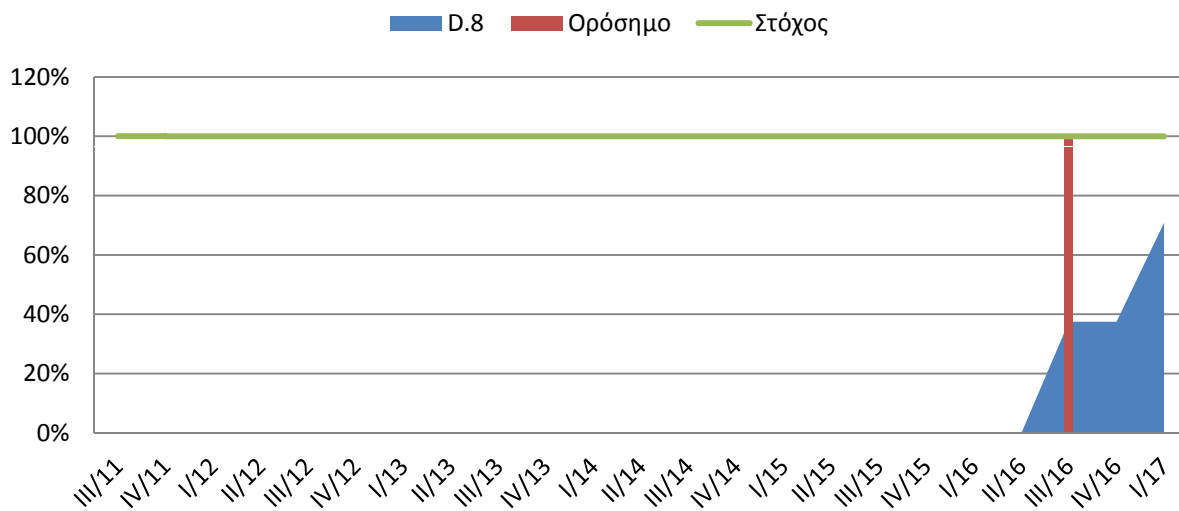


Πρόοδος της δράσης

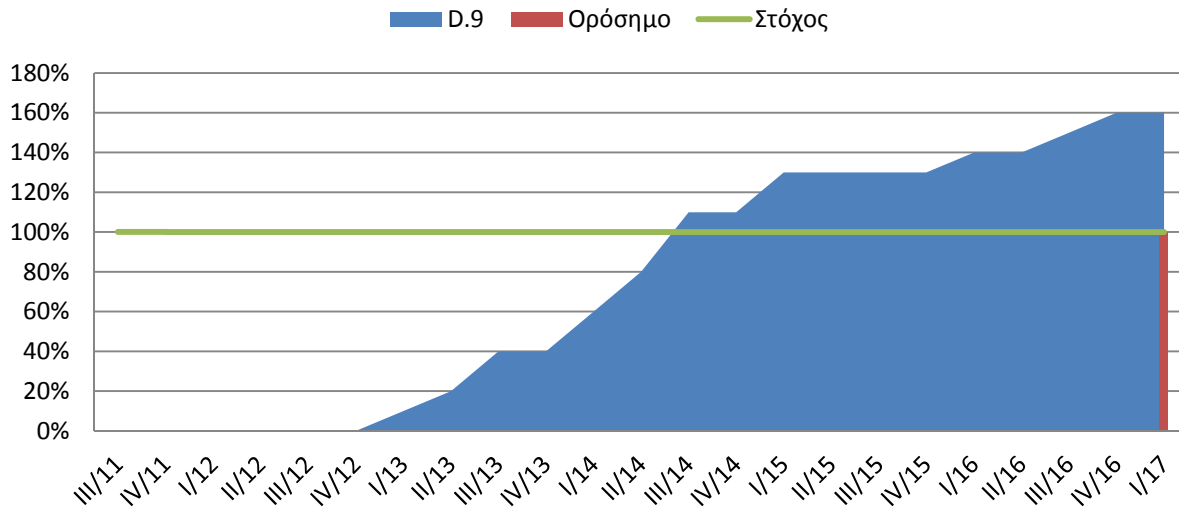


Πρόοδος της δράσης

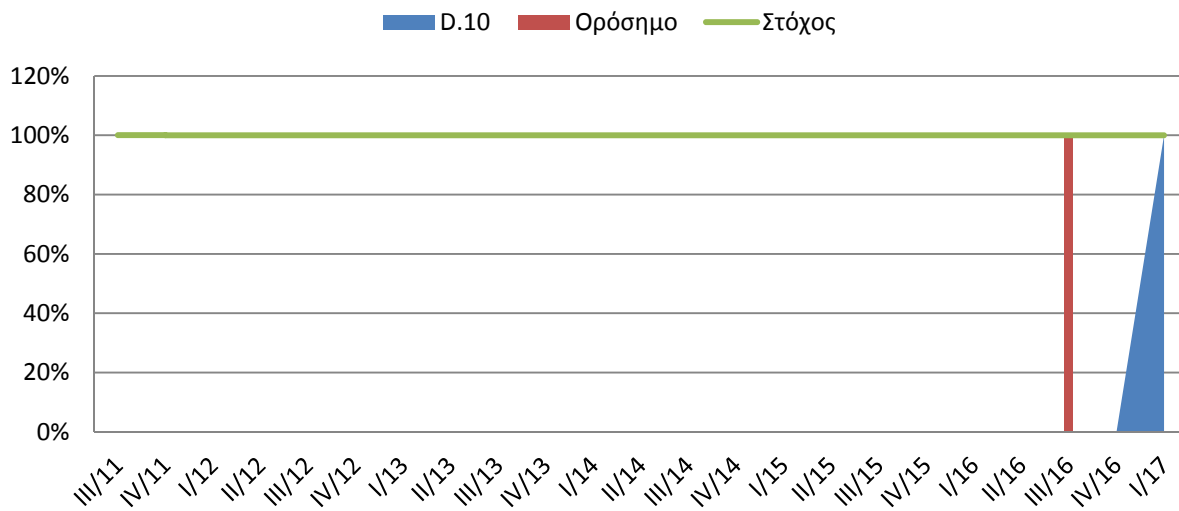


Πρόοδος της δράσης

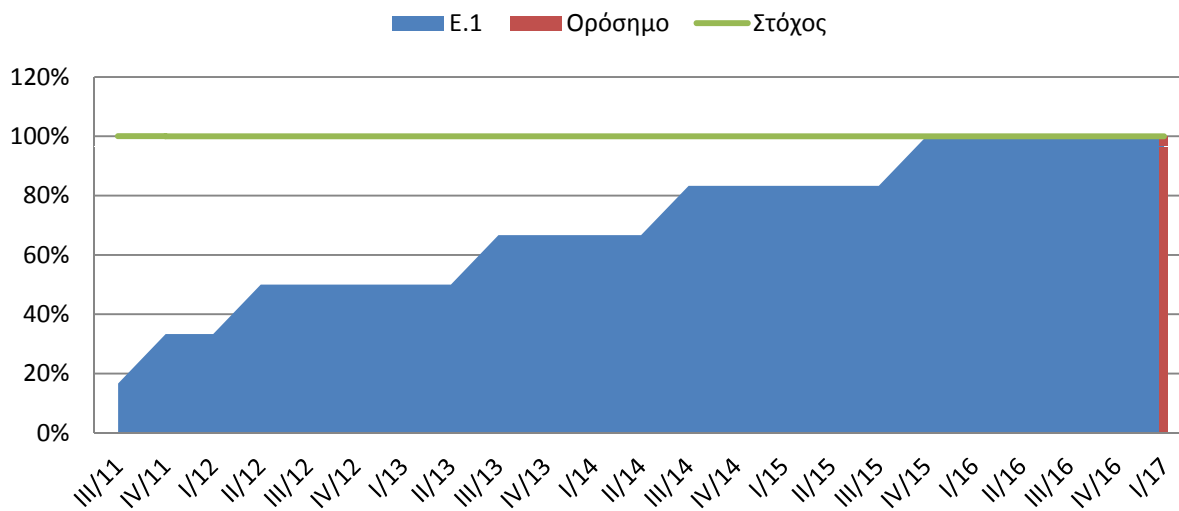


Πρόοδος της δράσης

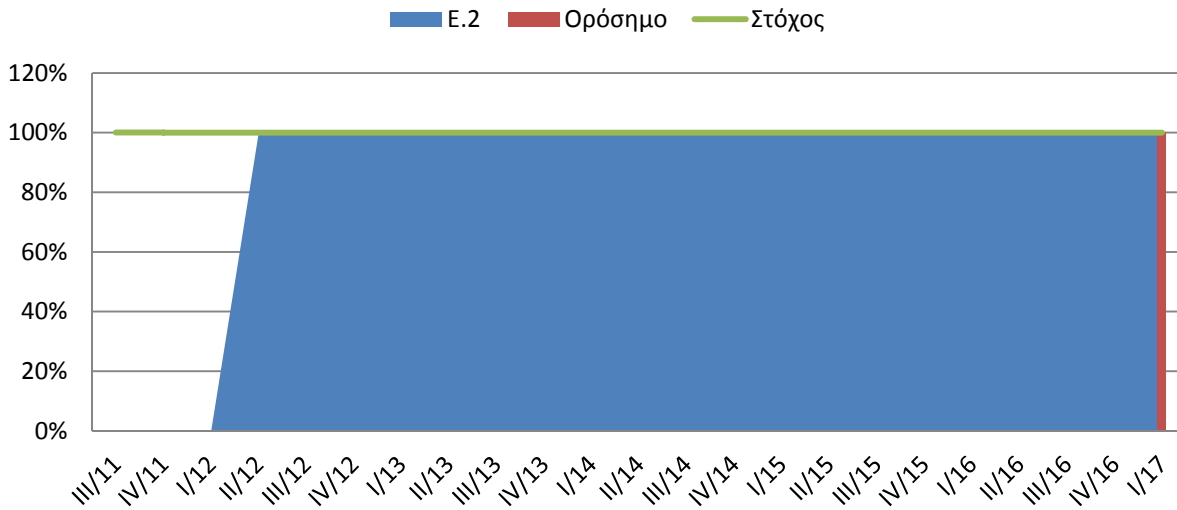


Πρόοδος της δράσης

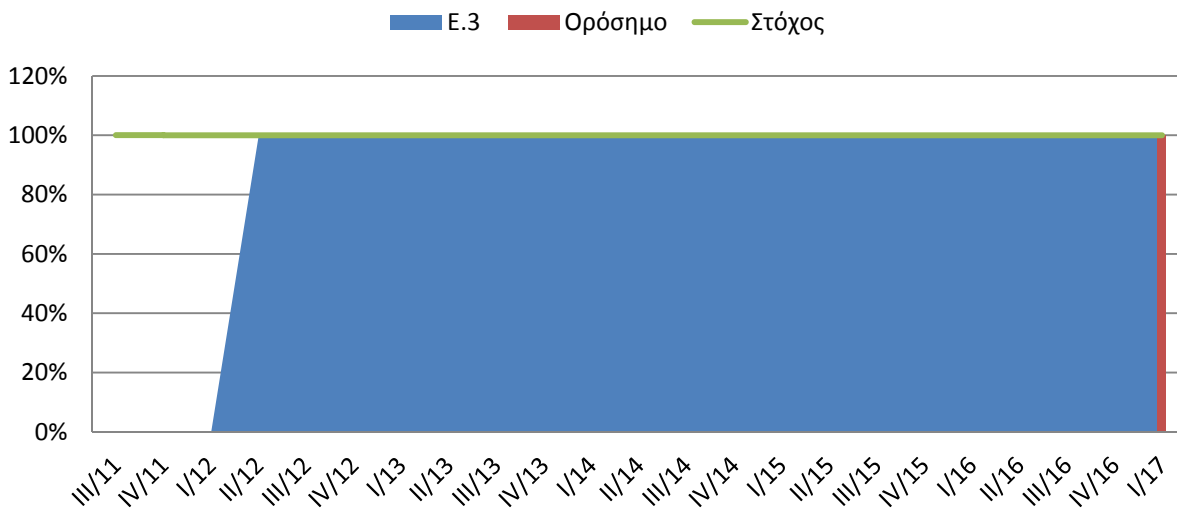

Πρόοδος της δράσης

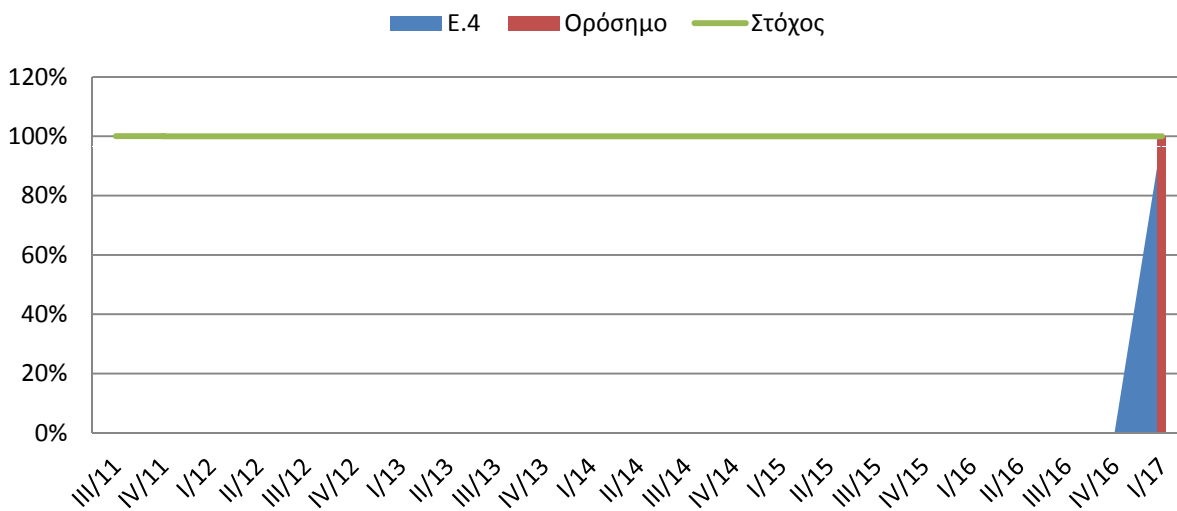



NCC – Περιβαλλοντικές Μελέτες ΕΠΕ
Γυθείου 4, 152 31 Χαλάνδρι
Τηλ: +030 210 67 43 044,
Φαξ: +030 210 67 43 041
email: info@n2c.gr
<http://www.n2c.gr>
